



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
COORDENADORIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA OESTE

OFÍCIO SIE/CROES/ENG/CCO 019/2023

Chapecó/SC, 26 de maio de 2023.

Assunto: Resposta ao Ofício 1019/SCC-DIAL-GEAPI.

Prezado,

Ao tempo que o cumprimento, servimo-nos do presente para responder ao Ofício **1019/SCC-DIAL-GEAPI**, onde encaminho informações sobre os serviços em execução da obra de implantação e pavimentação da rodovia SC 156 (antiga SC 466), no trecho entre a divisa SC/PR até o município de São Domingos/SC.

No referido Ofício, nos foi requisitado esclarecimentos acerca das obras de implantação e pavimentação da rodovia SC 156, no trecho entre a divisa SC/PR até o município de São Domingos/SC e do valor total investido na referida obra, solicitando através de respostas aos seguintes questionamentos:

1) Houve paralisação das obras de pavimentação e implantação da rodovia SC-156, entre o Município de São Domingos e a divisa com o Paraná?

Resposta – Não, não houve paralisação dos serviços Contratados para a Implantação e Pavimentação da SC 156. A obra encontra-se em um ritmo lento em função das chuvas que precipitaram nos últimos meses no trecho em execução e os entraves com autorizações dos proprietários para que a Contratada entre nos sítios, o que obrigou a Contratada a mudar o plano de ataque da obra, mobilizando os equipamentos e pessoal para o outro extremo da obra, reprogramando assim todas as atividades já programadas para a obra.

2) Caso a resposta anterior seja positiva, qual o motivo da paralisação e a previsão para a retoma das obras?

Resposta – Não houve paralisação dos serviços de Implantação e Pavimentação da SC 156, mas em função de todas as interferências ocorridas no período a obra irá sofrer uma reprogramação de suas atividades, adequando assim a execução ao prazo contratual.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
COORDENADORIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA OESTE

3) Qual o cronograma de execução das obras e o seu custo total?

Resposta – O cronograma de execução da obra de implantação e pavimentação é de **18 meses**, ou seja, o prazo final estipulado em Janeiro/2024, mas em função dos atrasos já detectados, está sendo realizado um estudo e planejamento para adaptar as atividades a serem executadas com o menor impacto possível no prazo final. O valor investido na obra de implantação e pavimentação da rodovia SC 156 (antiga SC 466), no trecho entre a divisa SC/PR até o município de São Domingos/SC, deve ser dividido em duas etapas: O valor do investimento na Supervisão de **R\$ 2.637.000,00** (CT 119/2022), somado ao investimento de execução da obra, no valor de **R\$ 87.898.800,00** (CT 040/2022), totalizando assim o valor investido de **R\$ 90.535.800,00** (Noventa milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, oitocentos reais). Anexo, encaminhamos o relatório gerencial da obra referente ao mês de abril/2023.

Isto posto, ficamos a inteira disposição para esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

Giuliano de Azevedo Oliveira
Engenheiro Civil - Fiscal do Contrato
Portaria de Fiscalização 484 - 01/04/2022

A Sua Senhoria o Senhor

RODRIGO LIMA MENDONÇA

Gerente de Acompanhamento de Pedidos e Informações

Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 90-D
Passo dos Fortes – Chapecó/SC - FONE (49) 2049-9686





Assinaturas do documento



Código para verificação: **J8T7I4P2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GIULIANO DE AZEVEDO OLIVEIRA (CPF: 543.XXX.191-XX) em 29/05/2023 às 10:47:47

Emitido por: "SGP-e", emitido em 09/09/2020 - 18:05:17 e válido até 09/09/2120 - 18:05:17.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA2MTUwXzYxNTRfMjAyM19KOFQ3STRQMg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00006150/2023** e o código **J8T7I4P2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Relatório Mensal – Abril / 2023

Implantação e Pavimentação da Rodovia SC - 156

Rodovia: SC 156 (antiga SC 466)
Trecho: Divisa PR/SC – Até a SC 480 (São Domingos / SC)
Segmentos: SC 156 - km 0+000 a 21+109
Acesso a São Domingos - km 100+500 a 102+860
Extensão: SC 156 - 21,109 km e Acesso – 2,360 km = 23,469 km

AVALIAÇÃO GERENCIAL MENSAL





Índice

Folha

1. Informações Contratuais	3
1.1 Apresentação.....	3
1.2 Espelho do Contrato	3
1.3 Evolução Cronológica do CT 040/2022 - Obra.....	4
1.4 Evolução Financeira do CT 040/2022 - Obra.....	4
1.5 Evolução Cronológica do CT 119/2022 - Supervisão	5
1.6 Evolução Financeira do CT 119/2022 - Supervisão.....	5
1.7 Evolução Financeira do Contrato.....	6
2. Informações da Obra.....	7
2.1 Histograma de Equipamentos - Planaterra.....	7
2.2 Histograma de Mão de Obra - Planaterra.....	8
2.3 Histograma de Equipamentos – Alta Engenharia	9
2.4 Histograma de Mão de Obra - Alta Engenharia	9
3. Serviços em Execução.....	10
3.1 Serviços em Execução na Obra	10
3.2 Interferências na obra	11
3.3 Percentual Executado dos Serviços da Obra.....	12
4. Relatório Fotográfico	13
5. Anexos	17
5.1 Relatório de Pluviometria da Obra	18
5.2 Controle de Medições Emitidas - Planaterra	19
5.3 Controle de Pagamento de Medições - Planaterra.....	20
5.4 Controle de Medições Emitidas – Alta Engenharia.....	21
5.5 Controle de Pagamento de Medições – Alta Engenharia	22



1. Informações Contratuais

1.1 Apresentação

O presente relatório tem como finalidade mostrar de forma resumida as condições atuais de como se encontra a execução das obras de implantação da Rodovia SC 156, no trecho da Divisa dos estados do PR/SC até a SC 480 (São Domingos), objeto do contrato de execução da obra é composto por dois Contratos assim descritos:

- **CT Nº 040/2022** - Prestação de serviços especializados de engenharia para execução de obras de implantação e pavimentação da rodovia SC 156 (antiga SC 466); trecho: divisa SC/PR até o município de São Domingos, Contratada para a execução da obra a empresa **Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda.**
- **CT Nº 119/2022** - Coordenação, supervisão, controle e de subsídios à fiscalização de obras rodoviárias na execução dos trabalhos rodoviários de implantação e pavimentação da rodovia SC 156 (antiga SC 466); trecho: divisa SC/PR até o município de São Domingos – Supervisora contratada **Alta Engenharia de Infraestrutura Ltda.**

1.2 Espelho do Contrato

OBJETO: Prestação de serviços especializados de engenharia para execução de obras de implantação e pavimentação da rodovia SC - 156 (antiga SC - 466);

TRECHO: Divisa PR/SC – Entroncamento SC 480 (Para Ipuauçu), Segmento: km 0+000 – km 21+109, Com extensão de 21,109 km, Segmento: km 100+500 – km 102+860, Com extensão de 2,360 km, totalizando uma implantação de 23,469 km, em São Domingos no Estado de Santa Catarina.

CLIENTE: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE**



1.3 Evolução Cronológica do CT 040/2022 - Obra

Data de Assinatura do Contrato – CT 040/2022	14/02/2022
Data da Ordem de Serviço – O.S. 035/2022	28/07/2022
Data Atual	30/04/2023
Dias Transcorridos	277
Prazo Contratual – 18 meses	540
Dias a Transcorrer	263

1.4 Evolução Financeira do CT 040/2022 - Obra

Valores Medidos do Contrato

Faturado até Abril / 2023 (PI):	R\$ 251.299,61
Reajuste até Abril / 2023 (R):	R\$ 48.610,75
Saldo do Contrato em Abril / 2023 (PI + R)	R\$ 87.647.500,39

Controle Financeiro do Contrato

Valor Inicial do Contrato (PI) - (A)	R\$ 87.898.800,00
Valor de Reajuste do Contrato (R) - (B)	R\$ 48.610,75
Melhoria visualizada (Aditivos) - SC 156 (PI + R) - (C)	R\$ 0,00
Valor Total do Contrato (A + B +C):	R\$ 87.947.410,75



1.5 Evolução Cronológica do CT 119/2022 - Supervisão

Data de Assinatura do Contrato – CT 119/2022	12/05/2022
Data da Ordem de Serviço – O.S. 038/2022	01/08/2022
Data Atual	30/04/2023
Dias Transcorridos	273
Prazo Contratual – 19 meses	570
Dias a Transcorrer	297

1.6 Evolução Financeira do CT 119/2022 - Supervisão

Valores Medidos do Contrato



Faturado até Abril / 2023 (PI):	R\$ 498.268,74
Reajuste até Abril / 2023 (R):	R\$ 27.261,23
Saldo do Contrato em Abril / 2023 (PI + R)	R\$ 2.138.731,26

Controle Financeiro do Contrato

Valor Inicial do Contrato (PI) - (A)	R\$ 2.637.000,00
Valor de Reajuste do Contrato (R) - (B)	R\$ 27.261,23
Melhoria visualizada (Aditivos) - SC 156 (PI + R) - (C)	R\$ 0,00
Valor Total do Contrato (A + B +C):	R\$ 2.664.261,23



1.7 Evolução Financeira do Contrato

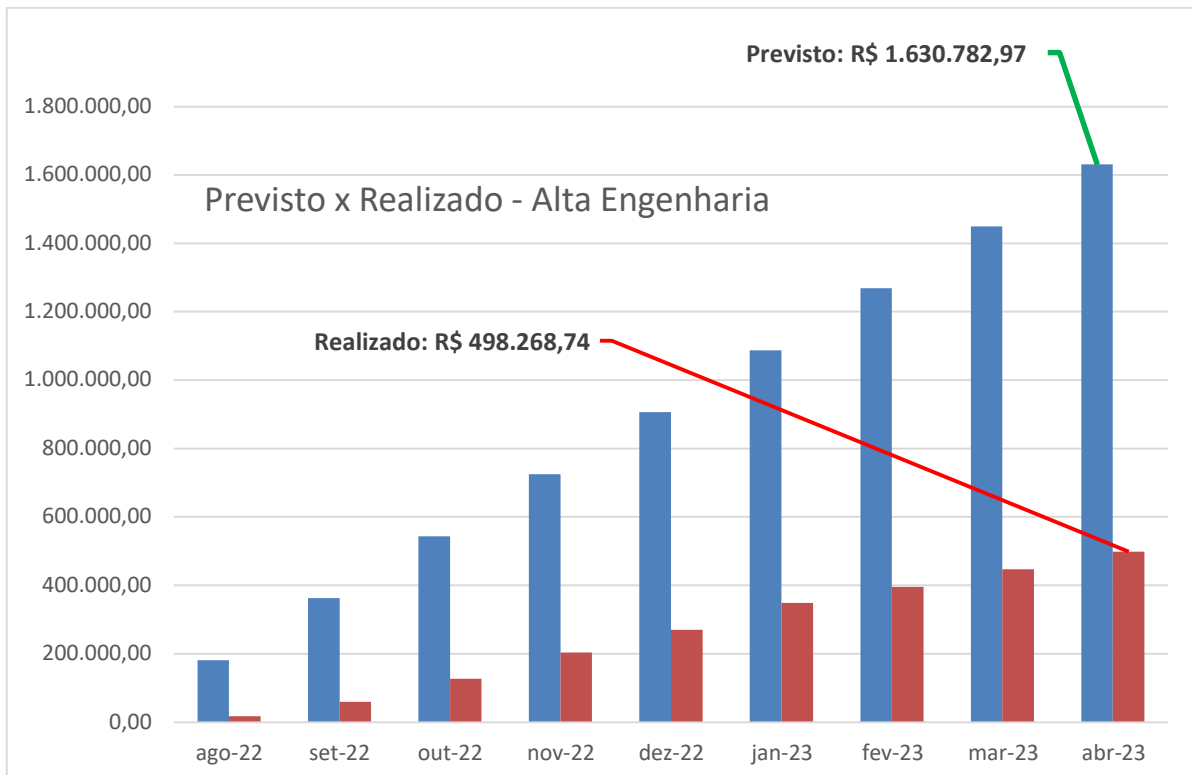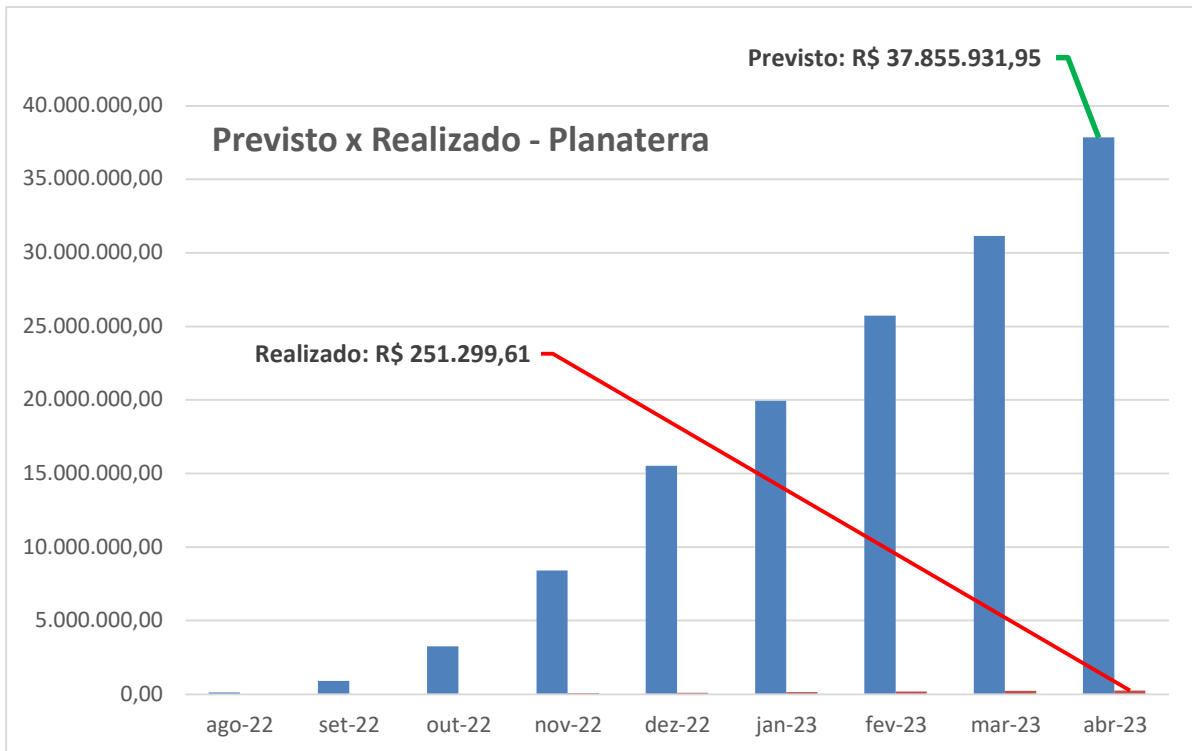



2. Informações da Obra

2.1 Histograma de Equipamentos - Planaterra

EQUIPAMENTOS	QTDE	LOCAL DE OPERAÇÃO
Caminhão fora de Estrada	01	Estaca 0+000 até 8+500
Caminhão Basculante	03	Estaca 0+000 até 8+500
Escavadeira Hidráulica	02	Estaca 0+000 até 8+500
Trator Agrícola com Grade	01	Estaca 0+000 até 8+500
Trator de Esteiras	01	Estaca 0+000 até 8+500
Rolo Compactador – Pé de Carneiro	01	Estaca 0+000 até 8+500
Caminhão Pipa	01	Estaca 0+000 até 8+500
Motoniveladora	01	Estaca 0+000 até 8+500
Caminhão Basculante	04	Estaca 12+640 até 15+800
Escavadeira Hidráulica	03	Estaca 12+640 até 15+800
Trator Agrícola com Grade	01	Estaca 12+640 até 15+800
Trator de Esteiras	01	Estaca 12+640 até 15+800
Rolo Compactador – Pé de Carneiro	01	Estaca 12+640 até 15+800
Caminhão Pipa	01	Estaca 12+640 até 15+800
Motoniveladora	02	Estaca 12+640 até 15+800
Veículos de Passeio - Hatch		Apoio a produção
Veículos Utilitário – 4x4		Apoio a produção



2.2 Histograma de Mão de Obra - Planaterra

COLABORADORES	QTDE
Operador de Caminhão fora de Estrada	01
Motorista de Caminhão Basculante	07
Operador de Escavadeira Hidráulica	05
Operador de Trator Agrícola com Grade	02
Operador de Trator de Esteiras	02
Operador de Rolo Compactador	02
Motorista de Caminhão Pipa	02
Operador de Motoniveladora	03
Encarregado Geral	01
Encarregado de Frente de Serviço	02
Equipe de Topografia	04
Equipe de Laboratório	02
Técnico de Segurança	01
Engenheiro de Campo	01
Engenheiro de Planejamento e Controle	01
Gerente de Contrato - Engenheiro	01



2.3 Histograma de Equipamentos – Alta Engenharia

EQUIPAMENTOS	QTDE	LOCAL DE OPERAÇÃO
Laboratório de topografia	01	Obra
Veículos de Passeio - Hatch	03	Apoio a supervisão
Veículos Utilitário – 4x4		Apoio a supervisão

2.4 Histograma de Mão de Obra - Alta Engenharia

COLABORADORES	QTDE
Equipe de Topografia	02
Gerente de Contrato - Engenheiro	01



3. Serviços em Execução

3.1 Serviços em Execução na Obra

Terraplenagem: A construtora deu continuidade nos serviços de terraplenagem entre os km 12+400 ao 15+800 LD e LE, executando o serviço de limpeza do terreno e desmate de árvores exóticas (eucalipto e pinus). No outro segmento, seguem os serviços de terraplenagem e limpeza do terreno e desmatamento da faixa de domínio entre km 0+000 ao km 3+800, totalizando uma extensão de aproximadamente 7,00 km, com a execução de serviços de escavações nos cortes/alargamentos e execução de aterros. Podemos considerar que a construtora tem apresentado um avanço satisfatório nos serviços de terraplenagem e drenagem, incrementando com mais equipamentos pesados conforme o avanço físico da obra.

Drenagem/OAC: Esses serviços estão concentrados nos mesmos segmentos que estão sendo executados os serviços de terraplenagem. A Construtora está com uma equipe própria de drenagem, para a execução de bueiros, galerias, travessias de acesso, serviços de drenos profundos e valetas de proteção de corte.

Foram finalizados os serviços de drenagem da execução dos bueiros localizados no km 2+230 – BSTC D= 1,00 m e km 2+520 – BSTC D= 1,00 m. Além disso, foram executadas uma CCT 02 e CCT 03.

Canteiro de Obras: A Construtora está mobilizando seu canteiro de obras, no município de São Domingos, as margens da SC 480.

O cronograma até o mês de abril de 2023 está com 0,29% executado, quando deveria estar com 43,07% executado, o que nos retrata um grande atraso no cronograma físico-financeiro e no andamento dos serviços contratados. Está sendo informado no diário de obras a questão do atraso causado pela contratada.

Meio Ambiente: Não foi remetido nenhum relatório ou apontamento sobre a questão de meio ambiente para essa supervisora.

No presente mês, as condições climáticas favoráveis para a execução dos serviços em campo.



3.2 Interferências na obra

Postes Rede Energia elétrica

Há diversos postes de rede de energia elétrica que estão interferindo nas obras da referida rodovia. Entretanto, necessitamos a elaboração do projeto de remanejamento dos postes pela CELESC, para que seja realizada as tratativas entre a SIE e Concessionária, por questões contratuais (custos) para remanejamento por parte da concessionária.

Desapropriações

Serão necessárias as desapropriações no segmento do contorno do Município de São Domingos/SC. Entretanto esse segmento poderá ser iniciado os processos após a aprovação por parte da SIE da alteração na rotatória de encontro com SC 480.

Entretanto, de modo geral a obra encontra-se com aproximadamente 40 % de sua extensão liberada, não comprometendo de imediato o avanço físico da obra. Registra-se que em janeiro/23 o setor de desapropriação da SIE, orientou que não fosse realizado nenhuma negociação de desapropriação, até que fosse definido pelo atual governo quais são as obras prioridades.

Alterações Geometria:

Foi necessário a elaboração de estudo de alteração de geometria da rodovia em diversos segmentos da rodovia SC 156 e no trevo do contorno do município de São Domingos/SC. O referido estudo com alteração da geometria foi encaminhado para análise da Fiscalização e posterior encaminhamento a SIE/SEDE e depende de aprovação. Assim, a construtora não está atacando o referido segmento até a aprovação por parte da SIE.

A alteração é devida a três justificativas:

1) No km 16+200 LE há um aviário e uma casa que foram construídos após a elaboração do projeto executivo (ano 2014 e atualização de custos em 2021), e uma nascente, sendo que conforme tratativas com o proprietário, necessitaríamos de uma distância mínima, que os frigoríficos exigem entre o bordo acostamento até o aviário, de no mínimo 30,0m. Assim, nesse local foi necessário ajustar o eixo para o Lado direito para respeitar o afastamento mínimo e evitar desapropriações;

2) No km 12+000 está previsto no projeto original um desvio do traçado existente, passando por cima de uma grota com aterro de aproximadamente 11 metros. Solicitamos



a Supervisora o estudo de um traçado da rodovia, de modo a adequar o mais próximo possível da estrada existente. Assim, a alternativa proposta irá diminuir os custos da obra bem como o impacto ambiental neste trecho;

3) No km 21+109, está prevista um trevo para acesso à rodovia SC 480, mas da forma que foi concebido trará muitos conflitos entre as duas rodovias, por este motivo foi solicitado outro estudo de viabilidade a Supervisora para adequação deste encontro.

3.3 Percentual Executado dos Serviços da Obra

ETAPA	PREVISTO	REALIZADO	DESVIO
Terraplenagem	70 %	1 %	69 %
Pavimentação	45 %	0 %	45 %
Drenagem	50 %	0,63 %	49,37 %
Sinalização	0 %	0 %	0 %
Obras Complementares	0 %	0 %	0 %
Obras de Arte Especiais	50 %	0 %	50 %
Meio Ambiente	25 %	0 %	25 %
Administração Local	49 %	0,41 %	48,59 %
% Global da Obra	43,07 %	0,29 %	42,78 %



4. Relatório Fotográfico



Limpeza e remoção de camada vegetal



Limpeza e remoção de camada vegetal



Intersecção do Posto da CIDASC



Limpeza e remoção de camada vegetal



Interferência rede de energia CELESC



Execução de limpeza e terraplenagem



Execução de limpeza e terraplenagem



Limpeza e remoção de camada vegetal



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
COORDENADORIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA OESTE



Execução de Terraplenagem



Execução de Terraplenagem



Execução de Terraplenagem



Limpeza e remoção de camada vegetal



Limpeza e remoção de camada vegetal



Execução de drenagem



Execução de drenagem



Execução de drenagem



5. Anexos

RELATÓRIO DE PLUVIOMETRIA



OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC 156 (ANTIGA SC 466) - SÃO DOMINGOS - SC			Medição:	10ª MP
RODOVIA: RODOVIA ESTADUAL SC 156 / SC			CONTRATO: CT 040/2022	
TRECHO: DIVISA PR/SC ATÉ O ENTROCAMENTO SC 480			ORDEM DE SERVIÇO: O.S. N° 035/2022 - 28/07/2022	
SUBTRECHO: DIVISA PR/SC ATÉ O ENTROCAMENTO SC 480 - SÃO DOMINGOS / SC			EMPRESA: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PVIMENTAÇÃO LTDA	
ACESSO AO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS / SC			Período Líquido:	01/04/2023 a 30/04/2023
SEGMENTO RODOVIA SC 156: ESTACA INICIAL 0+000 ATÉ A ESTACA FINAL 21+109 - COMPRIMENTO TOTAL 21,109 KM			Período Acumulado:	28/07/2022 a 30/04/2023
SEGMENTO ACESSO SÃO DOMINGOS: ESTACA INICIAL 100+500 ATÉ A ESTACA FINAL 102+860 - COMPRIMENTO TOTAL 2,360 KM			COMPRIMENTO TOTAL DA OBRA - 23,469 KM	

QUADRO PLUVIOMÉTRICO

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MANHÃ	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B
TARDE	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B
NOITE	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B

- CONVENÇÕES:**
- B BOM
 - C CHUVA
 - X IMPRATICÁVEL

OBS: Os dados pluviométricos são médias referentes a todos os locais de atuação do contrato.

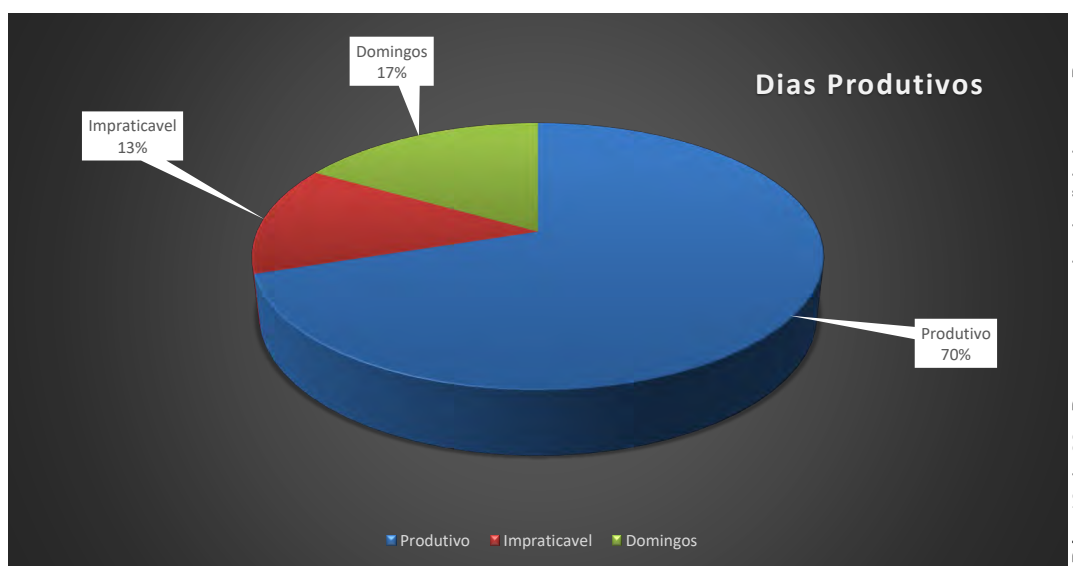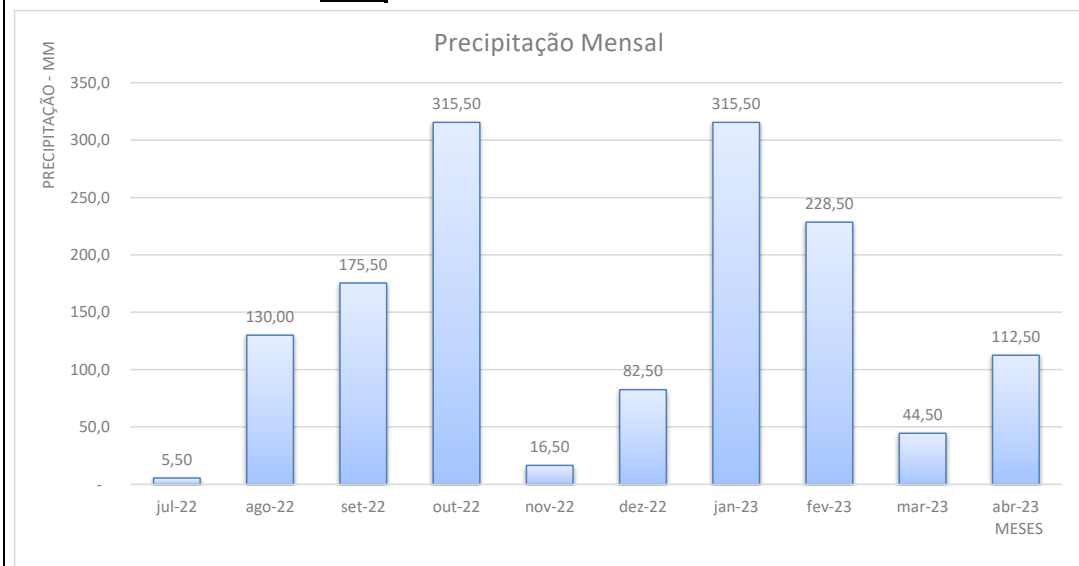



SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA

CONTROLE FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 040/2022

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC - 156 (ANTIGA SC - 466); TRECHO: DIVISA SC/PR ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

MED.	PERÍODO		PROCESSO SGP ^e	DETALHAMENTO DA MEDIÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO (%)					RECEBIMENTOS DAS MEDIÇÕES (% SOBRE O MEDIDO)					SALDO FINANCEIRO (RESTOS A PAGAR)		
	DE	ATÉ		DATA	VALOR MEDIDO	VALOR REAJUSTE	VALOR TOTAL	%	IMPOSTOS (PI + R)	VALOR MEDIÇÃO	VALOR REAJUSTE	VALOR RECEBIDO	%	MENSAL	ACUMULADO	%
01	01/08/2022	31/08/2022	----	----	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
02	01/08/2022	31/08/2022	----	----	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
03	01/09/2022	30/09/2022	----	----	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
04	01/10/2022	31/10/2022	----	----	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
05	01/11/2022	30/11/2022	SIE 45152/2022	03/12/2022	R\$ 64.911,18	R\$ 17.116,43	R\$ 82.027,61	0,09%	R\$ 2.460,83	R\$ 62.963,84	R\$ 16.602,94	R\$ 82.027,61	100%	R\$ -	R\$ -	-
06	01/12/2022	31/12/2022	SIE 525/2023	02/01/2023	R\$ 31.099,48	R\$ 7.885,82	R\$ 38.985,30	0,04%	R\$ 7.885,82	R\$ 31.099,48	R\$ -	R\$ 38.985,30	100%	R\$ -	R\$ -	-
07	01/01/2023	31/01/2023	SIE 4569/2023	01/02/2023	R\$ 31.344,01	R\$ 7.952,57	R\$ 39.296,58	0,04%	R\$ 7.952,57	R\$ 31.344,01	R\$ -	R\$ 39.296,58	100%	R\$ -	R\$ -	-
08	01/02/2023	28/02/2023	SIE 8763/2023	01/03/2023	R\$ 50.072,64	R\$ 7.669,10	R\$ 57.741,74	0,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 57.741,74	R\$ 57.741,74	0,07%
09	01/03/2023	31/03/2023	SIE 11951/2023	03/04/2023	R\$ 52.109,33	R\$ 7.986,83	R\$ 60.096,16	0,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 60.096,16	R\$ 117.837,90	0,13%
10	01/04/2023	30/04/2023	SIE 15519/2023	02/05/2023	R\$ 21.762,97	R\$ -	R\$ 21.762,97	0,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 21.762,97	R\$ 139.600,87	0,16%
11														R\$ -	R\$ 139.600,87	0,16%
12														R\$ -	R\$ 139.600,87	0,16%
13														R\$ -	R\$ 139.600,87	0,16%
14														R\$ -	R\$ 139.600,87	0,16%
15														R\$ -	R\$ 139.600,87	0,16%
16														R\$ -	R\$ 139.600,87	0,16%
17														R\$ -	R\$ 139.600,87	0,16%
FINAL														R\$ -	R\$ 139.600,87	0,16%

VALORES CONTRATUAIS MEDIDOS ACUMULADO:	R\$ 251.299,61	R\$ 48.610,75	R\$ 299.910,36	0,34%		R\$ 160.309,49	53,45%		R\$ 139.600,87	0,16%
SALDO FINANCEIRO TOTAL:			87.647.500,39	99,66%						

VALOR CONTRATUAL:	R\$ 87.898.800,00	99,94%
VALOR REAJUSTE:	R\$ 48.610,75	0,06%
VALOR ADITIVO:	R\$ -	
VALOR TOTAL:	R\$ 87.947.410,75	100,00%

CONTROLE FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 040/2022

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC - 156 (ANTIGA SC - 466); TRECHO: DIVISA SC/PR ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

MED.	PERÍODO		PROCESSO SGPe MEDIÇÃO	DETALHAMENTO DA MEDIÇÃO				PROCESSO SGPe REAJUSTE	DETALHAMENTO DOS REAJUSTES			
	DE	ATÉ		DATA (OBC)	IMPOSTOS MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO	VALOR RECEBIDO		DATA (OBC)	IMPOSTOS REAJUSTE	VALOR REAJUSTE	VALOR RECEBIDO
01	01/08/2022	31/08/2022	----	----	R\$ -	R\$ -	R\$ -	----	----	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02	01/08/2022	31/08/2022	----	----	R\$ -	R\$ -	R\$ -	----	----	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03	01/09/2022	30/09/2022	----	----	R\$ -	R\$ -	R\$ -	----	----	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04	01/10/2022	31/10/2022	----	----	R\$ -	R\$ -	R\$ -	----	----	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05	01/11/2022	30/11/2022	SIE 45152/2022	27/12/2022	R\$ 1.947,34	R\$ 62.963,84	R\$ 64.911,18	SIE 47329/2022	27/12/2022	R\$ 513,49	R\$ 16.602,94	R\$ 17.116,43
06	01/12/2022	31/12/2022	SIE 525/2023	27/01/2023	R\$ -	R\$ 31.099,48	R\$ 31.099,48	SIE 2006/2023	18/01/2023	R\$ 7.885,82	R\$ -	R\$ 7.885,82
07	01/01/2023	31/01/2023	SIE 4569/2023	12/04/2023	R\$ -	R\$ 31.344,01	R\$ 31.344,01	SIE 5504/2023	12/04/2023	R\$ 7.952,57	R\$ -	R\$ 7.952,57
08	01/02/2023	28/02/2023	SIE 8763/2023		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SIE 15798/2023		R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	01/03/2023	31/03/2023	SIE 11951/2023		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SIE 13229/2023		R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	01/04/2023	30/04/2023	SIE 15519/2023		R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
FINAL												

VALORES CONTRATUAIS MEDIDOS ACUMULADO:

R\$ 1.947,34

R\$ 125.407,33

R\$ 127.354,67

R\$ 32.954,82

CONTROLE FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 119/2022

OBRA: COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE E DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS RODOVIÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC 156; TRECHO: DIVISA SC/PR ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

MED.	PERÍODO		PROCESSO SGP	DETALHAMENTO DA MEDIÇÃO MENSAL (% SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO)					RECEBIMENTOS DAS MEDIÇÕES (% SOBRE O MEDIDO)					SALDO FINANCEIRO (RESTOS A PAGAR)		
	DE	ATÉ		DATA	VALOR MEDIDO	REAJUSTES	VALOR TOTAL	%	IMPOSTOS (MED + REAJ)	VALOR MEDIÇÃO	VALOR REAJUSTE	VALOR RECEBIDO	%	MENSAL	ACUMULADO	%
01	01/08/2022	31/08/2022	SIE 43853/2022	02/06/2022	R\$ 16.998,47	R\$ 1.036,89	R\$ 18.035,36	0,68%	R\$ 811,59	R\$ 16.233,54	R\$ 990,23	R\$ 18.035,36	100%	R\$ -	R\$ -	
02	01/09/2022	30/09/2022	SIE 43864/2022	02/06/2022	R\$ 42.535,53	R\$ 2.594,65	R\$ 45.130,18	1,69%	R\$ 2.030,86	R\$ 40.621,43	R\$ 2.477,89	R\$ 45.130,18	100%	R\$ -	R\$ -	
03	01/10/2022	31/10/2022	SIE 44094/2022	02/06/2022	R\$ 66.608,33	R\$ 4.063,08	R\$ 70.671,41	2,65%	R\$ 3.180,21	R\$ 63.610,96	R\$ 3.880,24	R\$ 70.671,41	100%	R\$ -	R\$ -	
04	01/11/2022	30/11/2022	SIE 44974/2022	01/12/2022	R\$ 77.066,95	R\$ 4.701,06	R\$ 81.768,01	3,07%	R\$ 3.679,56	R\$ 73.598,94	R\$ 4.489,51	R\$ 81.768,01	100%	R\$ -	R\$ -	
05	01/12/2022	31/12/2022	SIE 447/2023	18/01/2023	R\$ 66.254,84	R\$ 4.041,52	R\$ 70.296,36	2,64%	R\$ 3.163,34	R\$ 63.273,37	R\$ 3.859,65	R\$ 70.296,36	100%	R\$ -	R\$ -	
06	01/01/2023	31/01/2023	SIE 5364/2023	06/02/2023	R\$ 78.965,73	R\$ 4.816,88	R\$ 83.782,61	3,14%	R\$ 3.770,22	R\$ 75.412,27	R\$ 4.600,12	R\$ 83.782,61	100%	R\$ -	R\$ -	
07	01/02/2023	28/02/2023	SIE 7629/2023	06/03/2023	R\$ 47.118,07	R\$ 2.874,18	R\$ 49.992,25	1,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 49.992,25	R\$ 49.992,25	1,88%
08	01/03/2023	31/03/2023	SIE 12002/2023	11/04/2023	R\$ 51.360,41	R\$ 3.132,97	R\$ 54.493,38	2,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 54.493,38	R\$ 104.485,63	3,92%
09	01/04/2023	30/04/2023	SIE 15471/2023	04/05/2023	R\$ 51.360,41	R\$ -	R\$ 51.360,41	1,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 51.360,41	R\$ 155.846,04	5,85%
10														R\$ -	R\$ 155.846,04	5,85%
11														R\$ -	R\$ 155.846,04	5,85%
12														R\$ -	R\$ 155.846,04	5,85%
13														R\$ -	R\$ 155.846,04	5,85%
14														R\$ -	R\$ 155.846,04	5,85%
15														R\$ -	R\$ 155.846,04	5,85%
16														R\$ -	R\$ 155.846,04	5,85%
17														R\$ -	R\$ 155.846,04	5,85%
18														R\$ -	R\$ 155.846,04	5,85%
FINAL														R\$ -	R\$ 155.846,04	5,85%

VALORES CONTRATUAIS MEDIDOS ACUMULADO:	R\$ 498.268,74	R\$ 27.261,23	R\$ 525.529,97	19,73%	VALORES RECEBIDOS ACUMULADO:	R\$ 369.683,93	13,88%	R\$ 155.846,04	5,85%
--	----------------	---------------	----------------	--------	------------------------------	----------------	--------	----------------	-------

SALDO FINANCEIRO TOTAL:	R\$ 2.138.731,26	80,27%
-------------------------	------------------	--------

VALOR CONTRATUAL:	R\$ 2.637.000,00	98,98%	OBS.:
VALOR REAJUSTE:	R\$ 27.261,23	1,02%	
VALOR ADITIVO:	R\$ -		
VALOR TOTAL:	R\$ 2.664.261,23	100,00%	

CONTROLE FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 119/2022

OBRA: COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE E DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS RODOVIÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC 156; TRECHO: DIVISA SC/PR ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

MED.	PERÍODO		PROCESSO SGP _e MEDIÇÃO	DETALHAMENTO DA MEDIÇÃO				PROCESSO SGP _e REAJUSTE	DETALHAMENTO DOS REAJUSTES			
	DE	ATÉ		DATA (OBC)	IMPOSTOS MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO	VALOR RECEBIDO		DATA (OBC)	IMPOSTOS REAJUSTE	VALOR REAJUSTE	VALOR RECEBIDO
01	01/08/2022	31/08/2022	SIE 43853/2022	27/12/2022	R\$ 764,93	R\$ 16.233,54	R\$ 16.998,47	SIE 44788/2022	27/12/2022	R\$ 46,66	R\$ 990,23	R\$ 1.036,89
02	01/09/2022	30/09/2022	SIE 43864/2022	27/12/2022	R\$ 1.914,10	R\$ 40.621,43	R\$ 42.535,53	SIE 44800/2022	27/12/2022	R\$ 116,76	R\$ 2.477,89	R\$ 2.594,65
03	01/10/2022	31/10/2022	SIE 44094/2022	27/12/2022	R\$ 2.997,37	R\$ 63.610,96	R\$ 66.608,33	SIE 44810/2022	27/12/2022	R\$ 182,84	R\$ 3.880,24	R\$ 4.063,08
04	01/11/2022	30/11/2022	SIE 44974/2022	27/12/2022	R\$ 3.468,01	R\$ 73.598,94	R\$ 77.066,95	SIE 45550/2022	27/12/2022	R\$ 211,55	R\$ 4.489,51	R\$ 4.701,06
05	01/12/2022	31/12/2022	SIE 447/2023	16/02/2023	R\$ 2.981,47	R\$ 63.273,37	R\$ 66.254,84	SIE 2320/2023	16/02/2022	R\$ 181,87	R\$ 3.859,65	R\$ 4.041,52
06	01/01/2023	31/01/2023	SIE 5364/2023	26/04/2023	R\$ 3.553,46	R\$ 75.412,27	R\$ 78.965,73	SIE 5876/2023	26/04/2022	R\$ 216,76	R\$ 4.600,12	R\$ 4.816,88
07	01/02/2023	28/02/2023	SIE 7629/2023		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SIE 7861/2023		R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	01/03/2023	31/03/2023	SIE 12002/2023		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SIE 14022/2023		R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	01/04/2023	30/04/2023	SIE 15471/2023		R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
FINAL												
VALORES CONTRATUAIS MEDIDOS:					R\$ 15.679,34	R\$ 332.750,51	R\$ 348.429,85			R\$ 956,44	R\$ 20.297,64	R\$ 21.254,08



Assinaturas do documento



Código para verificação: **VZS620L4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GIULIANO DE AZEVEDO OLIVEIRA (CPF: 543.XXX.191-XX) em 29/05/2023 às 10:47:48

Emitido por: "SGP-e", emitido em 09/09/2020 - 18:05:17 e válido até 09/09/2120 - 18:05:17.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA2MTUwXzYxNTRfMjAyM19WWIM2MjBMNA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00006150/2023** e o código **VZS620L4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 0721/2023

Processo SCC 6150/2023

Florianópolis, 29 de maio de 2023.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1019/SCC-DIAL-GEAPI, nos autos do Processo Digital SCC 6150/2023, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0140/2023, o qual solicita informações acerca das obras de pavimentação e implantação da Rodovia Estadual SC-156, entre o Município de São Domingos e a divisa com o Estado do Paraná.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos manifestação da Fiscalização da Obas desta Secretaria (págs. 09 a 32), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER

Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor

MARCELO MENDES

Diretor de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis – SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5W6J8P5L**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 05/06/2023 às 12:29:24

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA2MTUwXzYxNTRfMjAyM181VzZKOFA1TA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00006150/2023** e o código **5W6J8P5L** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 1599/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 6 de junho de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0140/2023, de autoria do Deputado Neodi Saretta, encaminho o Ofício nº 0721/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete o Ofício SIE/CROES/ENG/CCO 019/2023, da Coordenadoria Regional de Infraestrutura Oeste, contendo informações a respeito das obras de pavimentação e implantação da Rodovia SC-156, entre o Município de São Domingos e a divisa com o Estado do Paraná.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.com.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **0823CXHS**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 06/06/2023 às 13:17:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA2MTUwXzYxNTRfMjAyM18wODIzQ1hIUw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00006150/2023** e o código **0823CXHS** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
