



**GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

# MONITORAMENTO DAS DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OS PROJETOS EM ANDAMENTO

EM ATENDIMENTO AO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

EXERCÍCIO LDO 2026



**GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

## **A Conservação do Patrimônio Público Estadual e Projetos em Andamento**

**GOVERNADOR DO ESTADO**

Jorginho Mello

**VICE-GOVERNADORA DO ESTADO**

Marilisa Boehm

**SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA**

Cleverson Siewert

**SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA**

Augusto Puhl Piazza

**DIRETOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Luciano de Sousa Rodrigues da Fonseca

**COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO**

Diretoria de Planejamento Orçamentário – Secretaria de Estado da Fazenda

**EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO**

Gerência de Elaboração e Acompanhamento do Orçamento

Sandro Luiz Barbosa  
Giuliano Silveira Martins  
Roberto Fialho  
Rosi Mari Ramos de Oliveira

**INFORMAÇÕES**

Secretaria de Estado da Fazenda  
Diretoria de Planejamento Orçamentário  
Gerência de Elaboração e Acompanhamento do Orçamento - GEORC  
georc@sef.sc.gov.br (48) 3665-2804

Centro Administrativo do Governo  
Rodovia SC-401, nº 4.600 – Km 5 – Saco Grande II – Florianópolis – SC



## SUMÁRIO

---

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>1. DESPESAS COM À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL.....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELACIONADA À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.....</b>	<b>10</b>
1.1.1 <i>Despesas Liquidadas por Classificação .....</i>	<i>10</i>
1.1.2 <i>Valor médio de aplicação dos últimos 5 anos .....</i>	<i>11</i>
1.1.3 <i>Evolução das despesas com manutenção e conservação 2020 a 2024 .....</i>	<i>12</i>
1.1.4 <i>Despesas liquidadas por função de governo.....</i>	<i>13</i>
1.1.5 <i>Percentual de Aplicação por Função de Governo .....</i>	<i>15</i>
1.1.6 <i>Despesas executadas por Unidade Gestora.....</i>	<i>16</i>
1.1.7 <i>Percentual de aplicação por Unidade Gestora.....</i>	<i>17</i>
<b>2. PROJETOS EM ANDAMENTO.....</b>	<b>18</b>
<b>2.1 MONITORAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO .....</b>	<b>19</b>
2.1.1 <i>Situação dos projetos em andamento .....</i>	<i>19</i>
<b>2.2 DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO.....</b>	<b>19</b>
2.2.1 <i>Projetos em Andamento do Orçamento Fiscal e Seguridade Social.....</i>	<i>19</i>
2.2.2 <i>Projetos em Andamento do Orçamento de Investimento.....</i>	<i>38</i>



## APRESENTAÇÃO

---

O presente relatório tem como objetivo demonstrar o andamento dos projetos atuais e a contemplação das despesas de conservação do patrimônio público, em atendimento ao Art. 45 disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:

*Art. 45. Observado o disposto no § 5º do art. 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.*

*Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação.*

Para melhor análise o demonstrativo foi dividido em duas partes: uma relacionada especificamente à conservação do patrimônio público estadual e outra relacionada aos projetos em andamento.

Além de encaminhar para a Assembleia Legislativa do Estado, será dado a este estudo ampla publicidade, com a disponibilização no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda, bem como será remetido para os Órgãos e Entidades do Poder Executivo, para conhecimento e observância na elaboração da proposta orçamentária de 2026.



## 1. DESPESAS COM À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL

Para efeito do atendimento ao art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o entendimento do conceito de conservação do patrimônio público é o mesmo preconizado na ABNT NBR 5674:1999, que textualmente assim o define:

*São as atividades que visam preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. Incluem todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho ou para atualizá-las às necessidades dos seus usuários. Não incluem os serviços realizados para alterar o uso das edificações, bem como aqueles que visem tão somente manter as edificações limpas e vigiadas.*

A partir do conceito de conservação do patrimônio público, foi realizada uma detalhada análise do Decreto nº 1.323 - Classificação da Despesa Pública, de 21/12/2012, com a finalidade de identificar quais despesas públicas estão diretamente relacionadas ao conceito de conservação do patrimônio público. A análise resultou na identificação das seguintes classificações da despesa pública: Classificação se refere ao subelemento de despesa.

Classificação	Nome Classificação	Descrição Classificação
339030-24 339130-24 449030-24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de qualquer bem público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, biombos, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, carpetes, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, cortinas, curvas, divisórias removíveis, esquadrias, estrados, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, persianas, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tapetes, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins.
339030-25 339130-25 449030-25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Registra o valor das despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes para aplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como: base para mastros, cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado, esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogão, margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição para instrumentos musicais e afins.
339030-26 339130-26 449030-26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: abajur, benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, chuveiro ou duchas elétricas, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminária, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, quebra-luz (luminária de mesa), reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomadas de corrente, torneira elétrica e afins.
339030-32 339130-32 449030-32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais empregados na manutenção e reparo de aeronaves, tais como: acessórios, peças de reposição de aeronaves, sobressalentes e afins.
339030-34 339130-34 449030-34	SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	Registra o valor das despesas com a aquisição de material utilizado na manutenção e reparo de máquinas e motores de navios, inclusive da esquadra e de embarcações em geral.



Classificação	Nome Classificação	Descrição Classificação
339030-37 339130-37 449030-37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	Registra o valor das despesas com a aquisição de material utilizado na manutenção e reparo de armamento, tais como: material de manutenção e armamento, peças de reposição e afins.
339030-38 339130-38 449030-38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	Registra o valor das despesas com as peças de reposição de radares e sistema de comunicação.
339030-39 339130-39 449030-39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifão, colar de embreagem, condensador, platinado, correias, disco de embreagem, ignição junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, pára-brisa, pára-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvulas da marcha lenta e termostática, refrigeração, injeção eletrônica e câmbio, central eletrônicas, velas, e afins.
339030-51 339130-51 449030-51	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição em bens de uso comum do povo, tais como: estradas, rodovias, pontes, praças, ciclovias, ferrovias e afins.
339036-18 449036-18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos revisões e adaptações, tais como: máquinas e equipamentos de processamento de dados e periféricos, máquinas e equipamentos gráficos, aparelhos de fax, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, máquinas de escrever e afins.
339036-20 449036-20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura e afins.
339036-21 449036-21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.
339036-22 449036-22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pedreiro, carpinteiro e serralheiro, pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris e afins.
339036-89 449036-89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES – SERVIÇO EXTERIOR	Registra o valor das despesas com serviços utilizados a manutenção de embaixadas, consulados, vice-consulados, missões diplomáticas e outras repartições sediadas no exterior.
339037-04 449037-04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com a locação de mão-de-obra para efetuar reparos e reformas de imóveis em geral, instalações, elétricas, hidráulicas e correlatas desde que o contrato especifique o quantitativo físico de pessoal a ser utilizado.
339037-06 449037-06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Registra o valor das despesas com a manutenção de bens móveis, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.



Classificação	Nome Classificação	Descrição Classificação
339039-08 339139-08 449039-08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (Classificação até 31/12/2017)	Registra o valor das despesas com os serviços, atualização e adaptação de software, suporte técnico, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar novas funções, aumento da capacidade de processamento, novas funções e manutenção de software.
339039-16 339139-16 449039-16	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com os reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, limpeza defossa e afins.
339039-17 339139-17 449039-17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Registra o valor das despesas com os reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos, aparelhos de fax e telex, elevadores, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança, equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas de escrever, turbinas e afins.
339039-19 339139-19 449039-19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.
339039-20 339139-20 449039-20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões, reformas e adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.
339039-21 339139-21 449039-21	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, recuperação, reforma, manutenção, adaptação e conservação de obras de infraestrutura.
339039-24 339139-24 449039-24	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	Registra o valor das despesas com os serviços prestados para confecção, manutenção e instalação de placas, fixas e banners de sinalização visual e de trânsito, identificação, endereçamento e afins.
339039-89 339139-89 449039-89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES DE SERVIÇOS NO EXTERIOR	Registra o valor das despesas com os serviços utilizados na manutenção de embaixadas, consulados, vice-consulados, missões diplomáticas e outras repartições sediadas no exterior.
339039-93 339139-93 449039-93	MANUTENÇÃO DE PALÁCIOS	Registra o valor das despesas com a manutenção de palácios governamentais (residência e despacho).
339039-95 339139-95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação até 31/12/2017)	Registra o valor das despesas com os serviços, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados – <i>hardware</i> .



Classificação	Nome Classificação	Descrição Classificação
449039-95		
339040-08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	Registra o valor das despesas com os serviços, atualização e adaptação de softwares, suporte técnico, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar novas funções, aumento da capacidade de processamento, novas funções e manutenção de softwares.
339140-08		
449040-08		
339040-95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	Registra o valor das despesas com os serviços, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados - hardware.
339140-95		
449040-95		

Fonte: Decreto nº 1.323- Classificação da Despesa Pública de 21/12/2012.

Com base na tabela, foi realizada uma busca por classificação de despesas na execução orçamentária do período de 2020 a 2024 com a finalidade de identificar as despesas dos órgãos do poder executivo relacionadas à conservação do patrimônio público, conforme apresentado a seguir:



## 1.1 Execução Orçamentária Relacionada à Conservação do Patrimônio Público

### 1.1.1 DESPESAS LIQUIDADAS POR CLASSIFICAÇÃO


Os valores informados representam a execução do período de 2020 a 2024 além de informar a média executada dos últimos 5 anos.

Classificação	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	4.634.935,68	884.755,99	1.305.722,44	772.255,44	222.445,42	<b>7.820.114,97</b>
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	22.929.255,39	27.661.168,44	33.080.137,30	38.712.432,43	38.935.943,31	<b>161.318.936,87</b>
Manut.Conserv.Bens Móveis Outr.Naturezas	2.900,00	9.450,00	20.970,00		2.110,00	<b>35.430,00</b>
Manutenção de Palácios	954.912,74	1.918.764,28	2.428.437,03	1.799.360,18	1.602.265,85	<b>8.703.740,08</b>
Manutenção de Repartições-Serv. Exterior		0,00		0,00		<b>0,00</b>
Manutenção de Software	23.482.488,15	31.892.571,46	44.554.888,71	52.655.521,27	59.163.173,54	<b>211.748.643,13</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.355.660,18	6.654.252,20	8.313.050,90	6.982.374,43	7.381.449,47	<b>34.686.787,18</b>
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.981,53	16.000,00	650,00		0,00	<b>18.631,53</b>
Manutenção e Conservação de Equipamentos	7.791,00	3.780,00	170.894,98	268.530,90	5.543,25	<b>456.540,13</b>
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.942.096,18	3.868.311,74	3.665.845,38	3.791.334,08	5.314.136,04	<b>20.581.723,42</b>
Manutenção e Conservação de Veículos	6.486.401,63	7.309.416,10	9.255.815,47	9.070.805,09	10.298.841,64	<b>42.421.279,93</b>
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	3.671.193,72	12.134.578,50	8.222.710,60	13.137.384,82	4.052.878,38	<b>41.218.746,02</b>
Material Elétrico e Eletrônico	1.411.441,37	5.188.259,83	7.221.877,11	3.969.231,78	4.015.417,07	<b>21.806.227,16</b>
Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.134.593,31	13.607.854,80	24.683.717,77	12.073.008,14	12.436.852,21	<b>69.936.026,23</b>
Material para Manutenção de Bens Móveis	3.315.371,93	3.680.966,37	5.279.240,11	4.677.002,32	6.216.130,01	<b>23.168.710,74</b>
Material para Manutenção de Veículos	10.578.375,08	10.168.217,79	15.549.389,86	15.747.772,11	17.914.291,52	<b>69.958.046,36</b>
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38.218.613,77	109.654.172,33	411.393.725,72	146.798.921,42	181.422.582,21	<b>887.488.015,45</b>
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	22.174.528,37	25.591.693,35	25.156.262,05	19.945.739,34	21.518.728,33	<b>114.386.951,44</b>
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	136.953,64	662.358,71	31.153.855,89	24.261.680,09	51.655.436,06	<b>107.870.284,39</b>
Sobressalentes de Armamento	61.907,14	36.143,90	36.706,01	12.865,45	2.469,00	<b>150.091,50</b>
Sobressalentes de Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	84.688,06	16.230,27	0,00	750,00	0,00	<b>101.668,33</b>
Suprimento de Aviação	2.100.729,85	4.536.859,20	5.019.370,74	5.316.540,29	9.705.646,37	<b>26.679.146,45</b>
<b>Total</b>	<b>156.686.818,72</b>	<b>265.495.805,26</b>	<b>636.513.268,07</b>	<b>359.993.509,58</b>	<b>431.866.339,68</b>	<b>1.850.555.741,31</b>



### 1.1.2 VALOR MÉDIO DE APLICAÇÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS


#### VALOR MÉDIO DE APLICAÇÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS

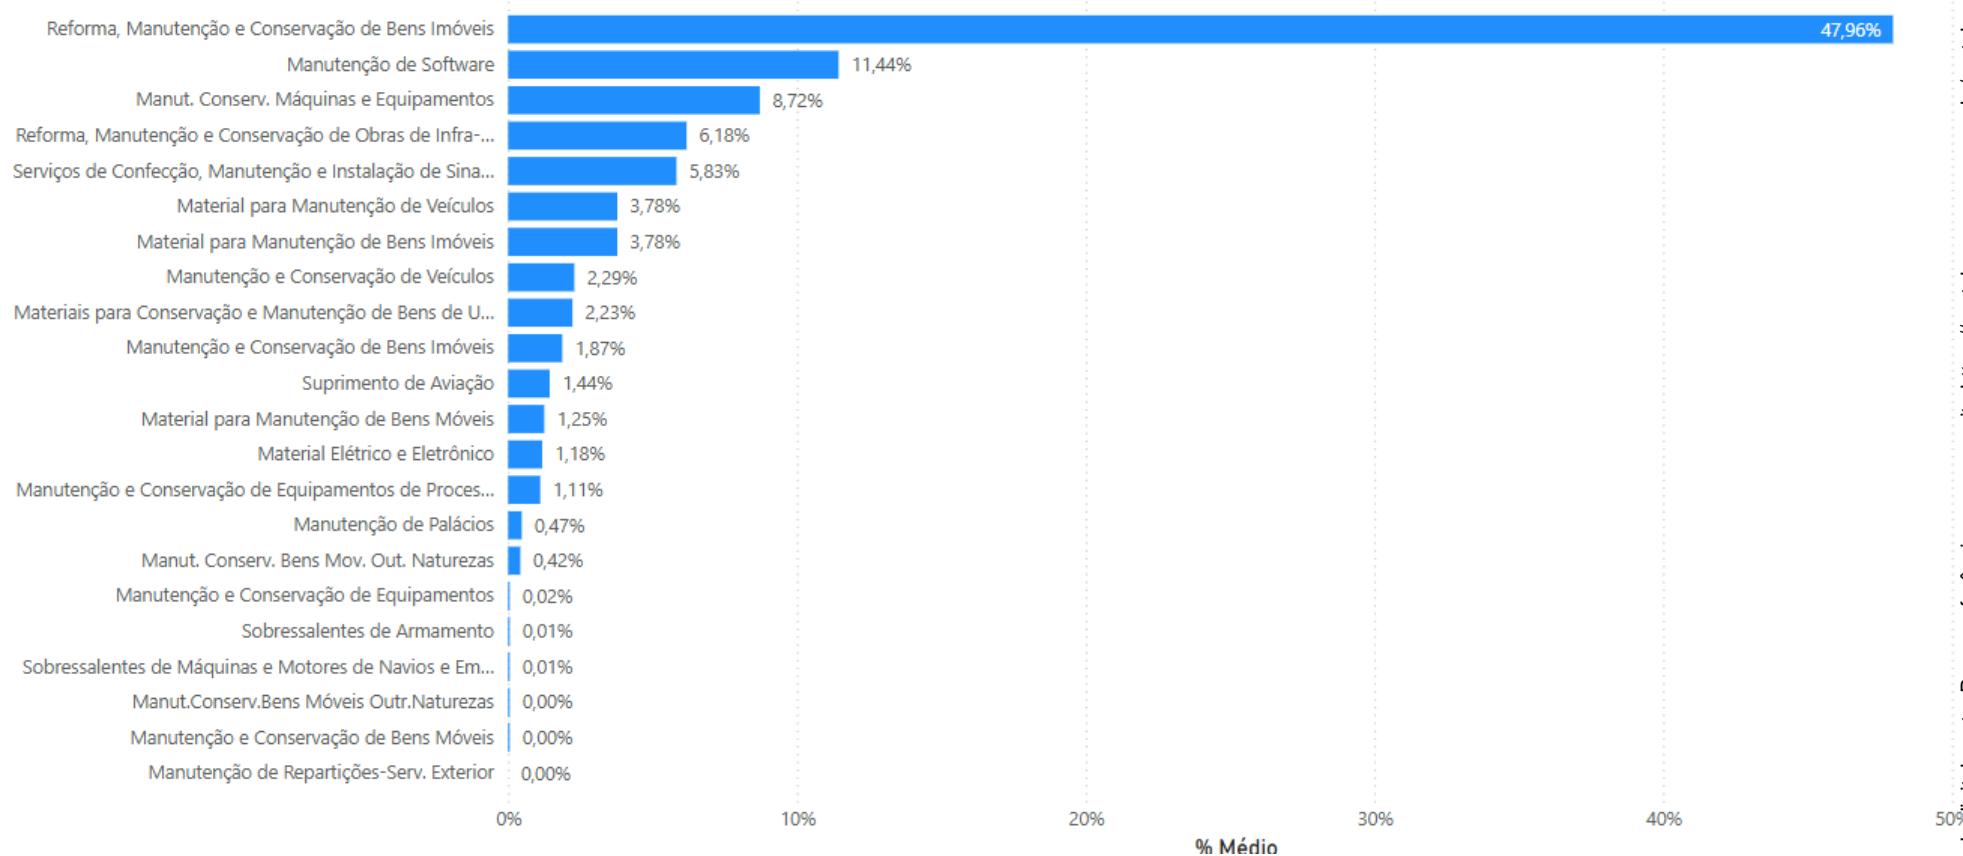

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2025.



### 1.1.3 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2020 A 2024

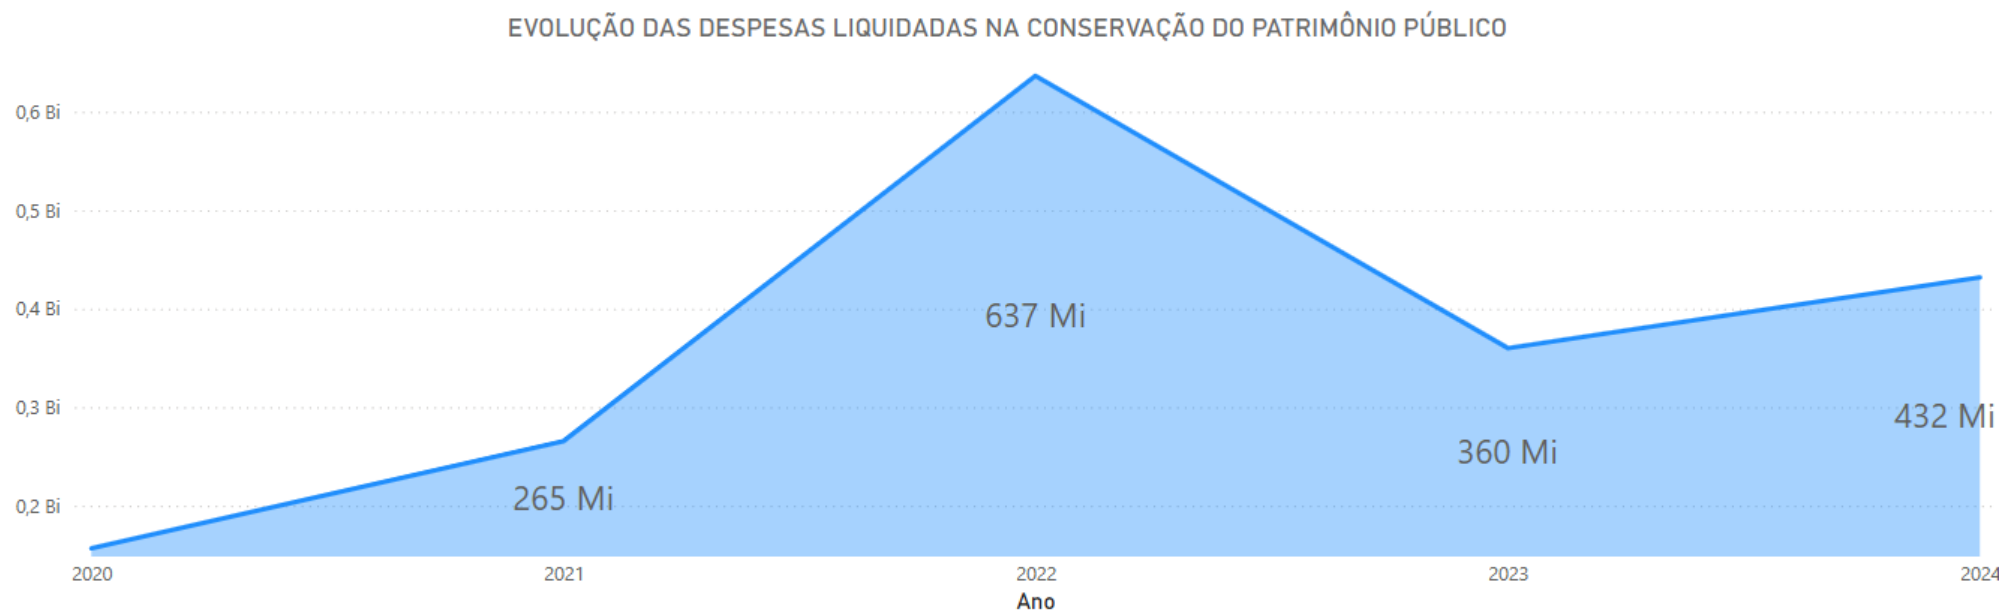

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2025.



#### 1.1.4 DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Os valores informados representam a execução, por função, do período de 2020 a 2024.

Função	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Administração	20.165.975,30	27.426.601,81	41.644.938,16	37.274.123,60	44.441.092,81	<b>170.952.731,68</b>
Agricultura	5.174.419,70	8.499.084,60	10.730.988,80	12.130.177,41	13.680.055,54	<b>50.214.726,05</b>
Assistência Social	39.392,66	116.615,53	120.685,29	137.447,38	83.439,77	<b>497.580,63</b>
Ciência e Tecnologia	308.020,11	364.386,68	116.337,66	1.177.114,06	1.703.202,93	<b>3.669.061,44</b>
Comércio e Serviços	657.662,12	922.996,59	1.025.689,47	1.174.102,39	1.573.657,05	<b>5.354.107,62</b>
Cultura	971.216,23	2.833.580,83	3.331.792,06	1.767.725,03	3.163.405,14	<b>12.067.719,29</b>
Desporto e Lazer		25.738,01		49.068,51	79.640,48	<b>154.447,00</b>
Direitos da Cidadania	6.594.434,12	16.850.400,10	21.846.059,40	17.509.536,70	22.839.212,19	<b>85.639.642,51</b>
Educação	36.139.581,83	105.232.408,46	415.756.895,30	148.308.759,50	175.152.484,12	<b>880.590.129,21</b>
Energia			37.171,98			<b>37.171,98</b>
Essencial à Justiça	2.141.483,79	2.056.856,18	2.006.798,93	2.102.497,72	2.920.640,44	<b>11.228.277,06</b>
Gestão Ambiental	1.272.961,58	2.275.573,31	4.334.239,17	2.567.278,47	2.574.354,66	<b>13.024.407,19</b>
Habitação	25.075,28	31.701,10	23.818,31	22.955,24	16.785,65	<b>120.335,58</b>
Previdência Social	348.054,56	350.805,35	476.566,54	372.111,51	403.259,20	<b>1.950.797,16</b>
Saúde	18.545.072,60	24.031.286,12	32.830.805,91	39.516.429,52	42.389.560,79	<b>157.313.154,94</b>
Segurança Pública	38.931.924,58	37.741.378,83	48.131.624,92	49.654.473,51	50.753.594,81	<b>225.212.996,65</b>
Trabalho	23.123,32	12.575,72	29.993,16	7.044,80	140.883,04	<b>213.620,04</b>
Transporte	25.348.420,94	36.723.816,04	54.068.863,01	46.222.664,23	69.951.071,06	<b>232.314.835,28</b>
<b>Total</b>	<b>156.686.818,72</b>	<b>265.495.805,26</b>	<b>636.513.268,07</b>	<b>359.993.509,58</b>	<b>431.866.339,68</b>	<b>1.850.555.741,31</b>


Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2025.



Função	Média por ano	% Médio 2020 a 2024
Administração	170.952.731,68	9,24%
Agricultura	50.214.726,05	2,71%
Assistência Social	497.580,63	0,03%
Ciência e Tecnologia	3.669.061,44	0,20%
Comércio e Serviços	5.354.107,62	0,29%
Cultura	12.067.719,29	0,65%
Desporto e Lazer	154.447,00	0,01%
Direitos da Cidadania	85.639.642,51	4,63%
Educação	880.590.129,21	47,59%
Energia	37.171,98	0,01%
Essencial à Justiça	11.228.277,06	0,61%
Gestão Ambiental	13.024.407,19	0,70%
Habitação	120.335,58	0,01%
Previdência Social	1.950.797,16	0,11%
Saúde	157.313.154,94	8,50%
Segurança Pública	225.212.996,65	12,17%
Trabalho	213.620,04	0,01%
Transporte	232.314.835,28	12,55%
<b>Total</b>	<b>1.850.555.741,31</b>	<b>100,00%</b>



### 1.1.5 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

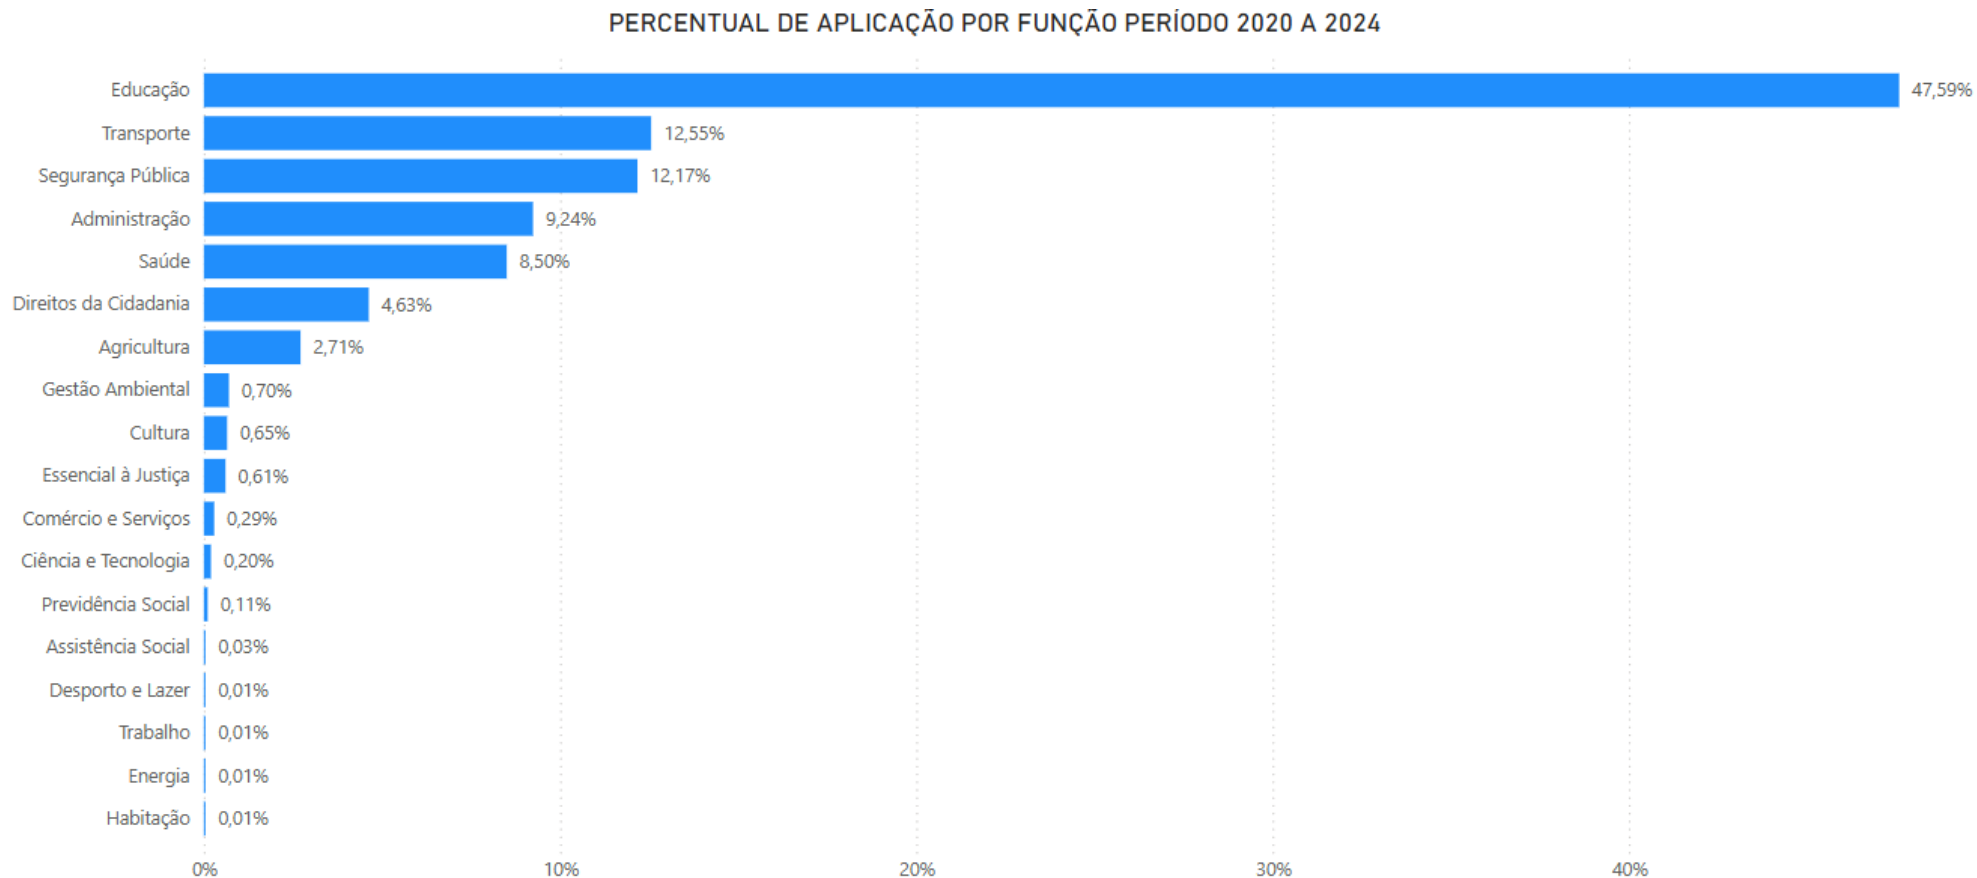

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2025.



### 1.1.6 DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA


Os valores informados representam a execução, por Unidade Gestora, do período de 2020 a 2024.

Unidades Gestoras	2020	2021	2022	2023	2024	Total
SED	30.214.982,96	94.404.608,30	403.647.270,74	137.534.746,24	162.931.881,68	<b>828.733.489,92</b>
Secretaria da Infraestrutura	25.348.420,94	36.732.273,58	54.073.751,47	46.106.774,23	69.277.010,85	<b>231.538.231,07</b>
Demais Unidades Gestoras	27.592.117,81	41.601.374,02	69.027.350,92	40.412.744,45	49.719.509,36	<b>228.353.096,56</b>
Fundo de Saúde	18.383.027,30	22.293.879,94	29.897.005,22	36.943.341,36	38.452.397,49	<b>145.969.651,31</b>
Fundo da Polícia Militar	19.022.263,35	17.860.828,06	23.559.143,02	20.494.929,78	24.418.446,27	<b>105.355.610,48</b>
SEF	15.347.452,88	15.843.856,68	20.876.716,18	21.286.720,20	25.941.873,13	<b>99.296.619,07</b>
UDESC	5.542.950,37	9.904.568,96	10.598.754,99	10.552.917,92	11.790.489,43	<b>48.389.681,67</b>
FUNPDEC				18.768.908,68	14.810.791,65	<b>33.579.700,33</b>
EPAGRI	2.803.162,82	5.220.366,24	5.673.189,38	6.928.169,25	8.007.542,66	<b>28.632.430,35</b>
Fundo da Polícia Civil	5.523.743,81	7.001.843,23	5.621.318,97	4.274.254,62	3.666.262,92	<b>26.087.423,55</b>
CIDASC	2.311.417,28	3.174.138,37	4.910.680,26	5.023.021,61	5.712.247,95	<b>21.131.505,47</b>
Fundo do Corpo de Bomb Militar	966.331,82	3.048.706,22	3.408.035,05	3.712.788,14	4.431.072,62	<b>15.566.933,85</b>
Fundo Penit. Chapecó	1.489.463,59	6.352.505,48	3.213.252,94			<b>11.055.222,01</b>
Fundo Juríd de Reparelhamento	2.141.483,79	2.056.856,18	2.006.798,93	2.102.497,72	2.212.257,97	<b>10.519.894,59</b>
SCTI				795.115,00	2.995.634,73	<b>3.790.749,73</b>
Casa Civil					2.735.729,88	<b>2.735.729,88</b>
Casa Civil - SCC				2.691.367,75		<b>2.691.367,75</b>
SEPLAN				763.443,61	1.265.095,34	<b>2.028.538,95</b>
SICOS				708.368,58	417.779,30	<b>1.126.147,88</b>
IMA					1.117.493,07	<b>1.117.493,07</b>
SPAF				115.890,00	674.060,21	<b>789.950,21</b>
Fundo Rotativo Regional Sul				467.192,09	260.879,25	<b>728.071,34</b>
Fundo Rot. São Pedro Alcântara					438.075,21	<b>438.075,21</b>
SETUR				164.820,06	62.266,88	<b>227.086,94</b>
SAS				137.447,38	83.439,77	<b>220.887,15</b>
Fundo Rot.Reg.Méd. Vale Itajai					152.324,92	<b>152.324,92</b>
SEMAE				8.050,91	83.879,59	<b>91.930,50</b>
Sec. da Agricultura e Pecuária					90.982,34	<b>90.982,34</b>
Fundo Rotativo Reg.Vale Itajai					58.986,00	<b>58.986,00</b>
Planalto Norte (FR-08)					53.534,20	<b>53.534,20</b>
SAQ					4.242,01	<b>4.242,01</b>
SUDESC					153,00	<b>153,00</b>
<b>Total</b>	<b>156.686.818,72</b>	<b>265.495.805,26</b>	<b>636.513.268,07</b>	<b>359.993.509,58</b>	<b>431.866.339,68</b>	<b>1.850.555.741,31</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2025.



### 1.1.7 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO POR UNIDADE GESTORA

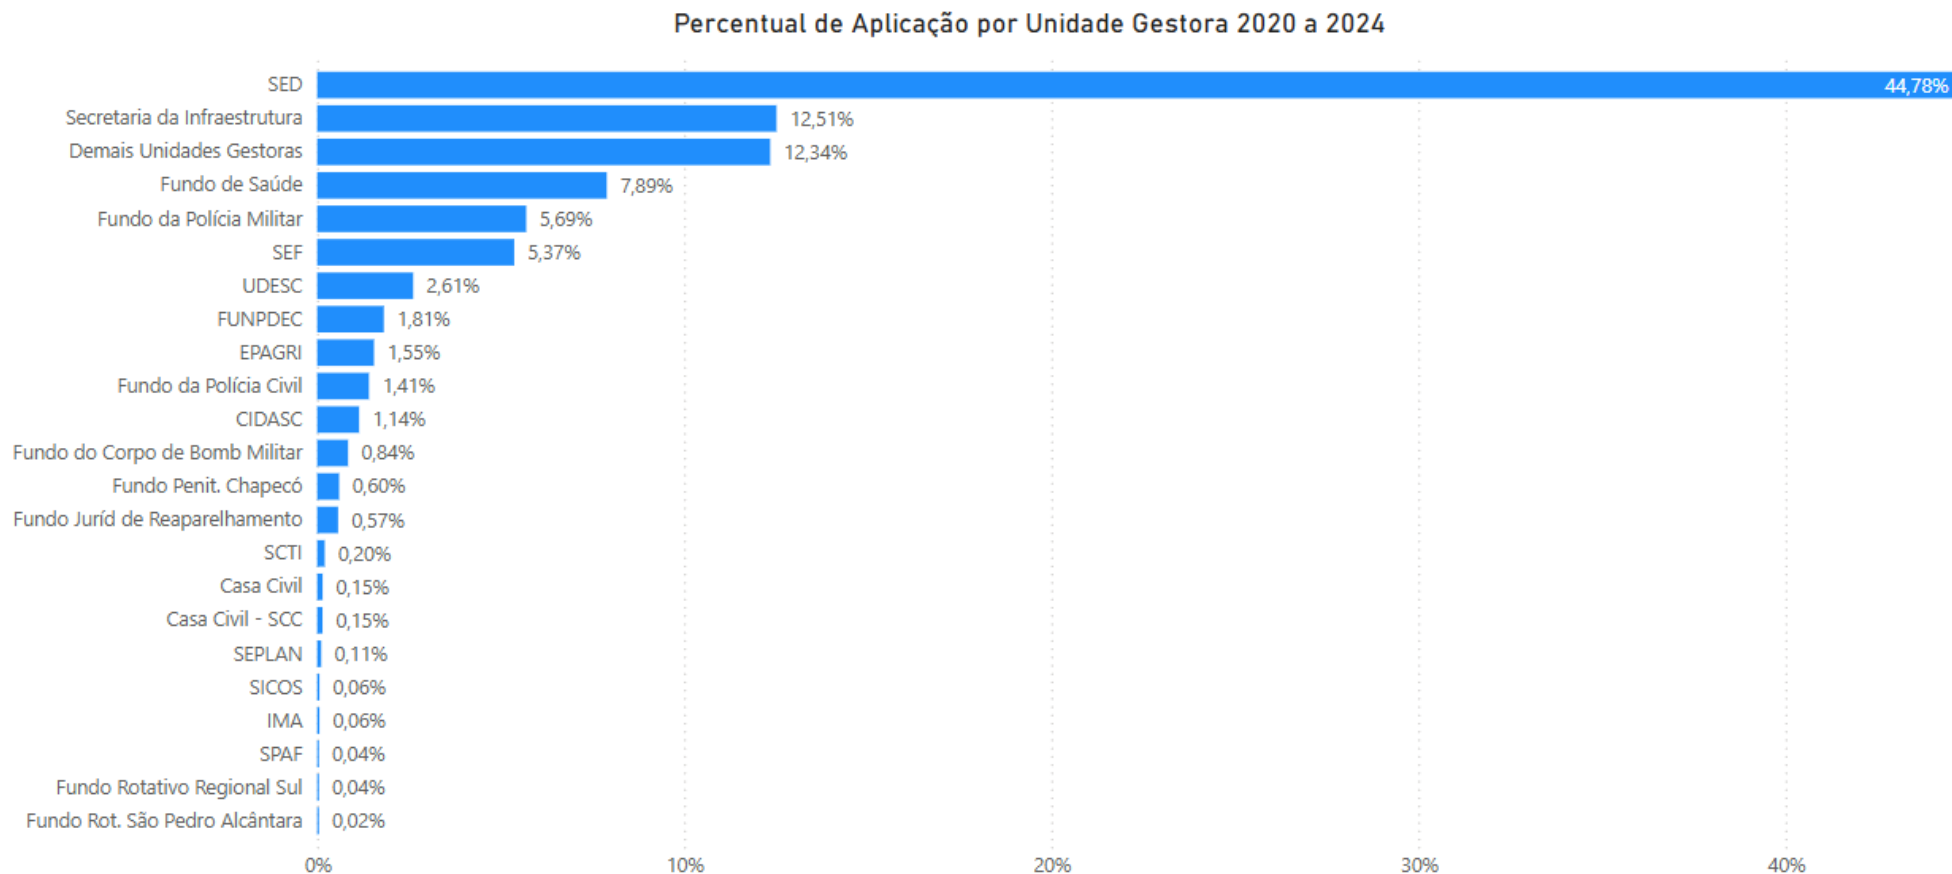

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2025.



## 2. PROJETOS EM ANDAMENTO

---

Durante o processo de elaboração do PPA, todas as subações são classificadas em projeto ou atividade. Portanto, com base nessa classificação, as subações tipificadas como projeto foram rastreadas na LOA – 2024. Feita a identificação das subações que financiam os projetos, foi possível identificar a situação e o fluxo orçamentário e financeiro de cada projeto. Foram considerados somente os projetos nas seguintes situações: em andamento, atrasado ou paralisado que possuem a previsão de conclusão superior ao mês de janeiro de 2025, conforme apresentado nas próximas páginas. Para demonstrar a situação de cada projeto em andamento, financiado pelas subações orçamentárias classificadas como projeto, foi utilizado o conceito de “objeto de execução”, conforme estabelecido no inciso II do art. 5º do Decreto nº 1.534, de 22 de outubro de 2021.

Objeto de Execução é o instrumento de programação do produto da subação do qual resulta um bem ou serviço destinado a um público-alvo, ofertado à sociedade ou ao próprio Estado.

Utilizou-se o conceito de objeto de execução, pois as subações orçamentárias em muitos casos são genéricas, como por exemplo: Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares e não possuem a situação (andamento, atrasado, paralisado ou concluído).

As informações dos objetos de execução foram extraídas do Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF e com base nessas informações foi possível verificar individualmente em qual situação encontram-se os projetos até o dia 31/03/2025. Estas informações são de responsabilidade das unidades gestoras e foram consideradas de acordo com os registros no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

No entanto, cabe ressaltar que é de responsabilidade dos órgãos que compõem a administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual o monitoramento das subações orçamentárias que financiam bens e serviços à sociedade, por meio da programação e execução dos objetos de Execução. Portanto, a veracidade dos dados apresentados a seguir é de responsabilidade de cada unidade gestora.



## 2.1 Monitoramento dos Projetos em Andamento

### 2.1.1 SITUAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

Os objetos de execução em seu cadastro inicial totalizam a realização física executada até 31 de março de 2025.

A tabela abaixo relaciona por esfera os objetos de execução com previsão de conclusão superior a 01/01/2025, com os respectivos valores liquidados em 2024 para as esferas Fiscal e Seguridade Social. Os valores aplicados no orçamento de investimento são referentes ao exercício de 2024, informados pelas próprias empresas.

## 2.2 Demonstrativo dos Projetos em Andamento

### 2.2.1 Projetos em Andamento do Orçamento Fiscal e Seguridade Social

Abaixo estão relacionados os 375 projetos cadastrados e atualizados até 31/03/2024 que se encontram nas situações: em andamento, atrasado ou paralisado das unidades gestoras dos orçamentos fiscal e de seguridade social.

UG	Suba- ção	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Fí- sico	Real. Físico	IE Fí- sico		Empenhado	Liquidado	IE Finan- ceiro	Status
160084	015789	2024OE000009 Obra de reforma e de ampliação da Delegacia de Polícia de Trombudo Central.	Obra executada	unidade	1,00	0,47	47,00 %		300.009,88	75.345,63	25,11 %	Em andamento
160084	015789	2024OE000010 Projetos para reforma de 4 delegacias ocupadas pela PCSC em Chapecó e Concórdia.	Obra executada	unidade	4,00	0,20	5,00 %		68.180,04	0,00	0,00 %	Em andamento
160084	015789	2024OE000011 Reforma do muro e execução do cercamento da Academia de Polícia Civil - ACADEPOL.	Obra executada	unidade	1,00	0,50	50,00 %		509.611,86	338.576,44	66,44 %	Em andamento
160084	015789	2024OE000015 Projeto de reforma e ampliação da 6ª Delegacia de Polícia da Capital.	Obra executada	unidade	1,00	0,60	60,00 %		0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
160084	015789	2024OE000017 Projetos para regularização e reforma da DPCAMI de Joinville.	Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00	0,00 %	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

160084	015789	2024OE000021 Reforma de conclusão do Complexo de Segurança de Forquilha.	Obra executada	unidade	1,00	0,04	3,64	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
160084	015789	2024OE000029 Projetos de engenharia e arquitetura para reforma da Delegacia Municipal de Lontras.	Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	8.799,96	0,00	0,00	%	Em andamento
160084	015789	2024OE000031 Obras e projetos - ART	Obra executada	unidade	30,00	30,00	100,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
160084	015789	2024OE000032 Projetos para reforma e ampliação da Central de Plantão Policial de Chapecó.	Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
160084	015789	2024OE000041 Reforma e recuperação da cobertura da Delegacia Regional de Polícia de Joinville.	Obra executada	unidade	1,00	0,86	86,04	%	46.976,46	0,00	0,00	%	Em andamento
160084	015789	2024OE000043 Reforço e recuperação estrutural da Delegacia Regional de Polícia de Araranguá.	Obra executada	unidade	1,00	0,89	88,79	%	64.497,95	64.379,53	99,82	%	Em andamento
160084	015789	2024OE000073 Projeto de engenharia e arquitetura para a reforma da 7ª DRP de Rio do Sul	Obra executada	unidade	1,00	0,36	35,67	%	30.773,89	0,00	0,00	%	Em andamento
160084	015789	2024OE000074 Projeto executivo para reforma da fachada da DEIC	Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	41.805,00	0,00	0,00	%	Em andamento
160084	015789	2024OE000075 Reforma do centro de treinamento operacional da ACADEPOL de Florianópolis	Obra executada	unidade	1,00	1,00	100,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
160084	015789	2024OE000077 Projeto de reforma e ampliação da DPCo de Navegantes	Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
160085	011839	2024OE000041 Construção Instalações Físicas BM - Centro de Treinamento	Obra executada	unidade	1,00	0,80	80,00	%	581.487,38	229.278,53	39,43	%	Atrasado
160085	015394	2025OE000002 Manutenção da Aeronave Arcanjo-01 - matrícula PRHGR - do CBMSC	Equipamento fornecido	unidade	1,00	0,00	0,00	%	4.305.728,94	4.305.728,94	100,00	%	Em andamento
160099	011799	2024OE000035 Construção do novo quartel da PMSC em Maracajá	Obra executada	unidade	1,00	0,40	40,02	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
160099	015028	2024OE000003 Elaboração dos projetos de Arq. e Eng. da Polícia Científica em Chapecó (2022OE000009)	Obra executada	unidade	1,00	0,75	74,73	%	13.290,41	0,00	0,00	%	Atrasado
160099	015028	2024OE000008 Elaboração de projetos de Arq. e Eng. da PCI em São Miguel do Oeste (2023OE000008)	Obra executada	unidade	1,00	0,09	9,02	%	8.881,95	0,00	0,00	%	Atrasado
160099	015028	2024OE000017 Reforma e ampliação do imóvel que abrigará a Polícia Científica em Tubarão	Obra executada	unidade	1,00	0,11	11,39	%	2.189.592,77	134.237,92	6,13	%	Em andamento
160099	015028	2024OE000020 Manutenção predial e readequação do sistema de esgoto da PCI em Lages	Obra executada	unidade	1,00	0,97	97,47	%	134.513,87	105.048,23	78,09	%	Em andamento
160099	015028	2025OE000001 Contratação de Projetos de Eng. e Arq. para a SRFLN - Itacorubi (2024OE00005, 2022OE00012)	Obra executada	unidade	1,00	0,20	20,00	%	41.286,23	0,00	0,00	%	Em andamento
160099	015028	2025OE000004 Manutenção Predial da unidade da PCI de Joinville (2024OE22)	Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	27.378,07	0,00	0,00	%	Em andamento
160099	015028	2025OE000005 Elaboração dos projetos da Edifi. da PCI em Criciúma (2024OE04, 2022OE010)	Obra executada	unidade	1,00	0,32	31,58	%	50.963,37	0,00	0,00	%	Em andamento
160099	015028	2025OE000008 Indenização de reforma para entrega do imóvel da PCI em Curitiba.	195 Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	46.115,26	0,00	0,00	%	Em andamento
160099	015789	2025OE000003 Projeto regularização Setor Med. Legal-PCI e DIC São Miguel do Oeste (2024OE011, 2023OE03)	Obra executada	unidade	1,00	0,09	9,02	%	34.718,69	0,00	0,00	%	Em andamento
260001	015771	2024OE000021 Programa de proteção a crianças e adolescentes	Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado
290001	015394	2024OE000015 Construção de cerca metálica e drenagem pluvial no Aeroporto de Rio do Sul	Equipamento fornecido	unidade	2,00	0,90	45,00	%	834.212,98	834.212,98	100,00	%	Atrasado
350001	015992	2025OE000002 Elaboração de projetos para construção de três barragens na bacia do Rio Itajaí	195 Obra executada	unidade	1,00	0,98	97,78	%	383.744,66	68.470,49	17,84	%	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

350001	015993	2025OE000001	Melhoramento fluvial no município de Rio do Sul	195 Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	6.914.051,50	3.774.051,50	54,59	%	Em andamento
350001	015994	2025OE000003	Crédito de Reposição Florestal	195 Obra executada	unidade	1,00	0,20	20,00	%	2.250,00	0,00	0,00	%	Em andamento
350091	015387	2024OE000023	Enrocamento das margens do Rio Capivari no Município de Armazém	Obra executada	unidade	1,00	0,60	60,00	%	625.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
350091	015387	2024OE000027	Reconstrução de 03 pontes - Município Orleans/SC (2023OE0007	Obra executada	unidade	3,00	1,80	60,00	%	1.745.300,00	0,00	0,00	%	Em andamento
350091	015387	2024OE000064	Construção da Ponte Divo Debiasi em Grão Pará - 2023OE000054 (UG 410092)	Obra executada	unidade	1,00	0,60	60,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
350091	015988	2024OE000040	Recomposição da passarela de acesso - Barragem Sul - Itupora	Barragem adequada	unidade	0,10	0,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
350091	015988	2024OE000089	Reforma e recuperação operacional - Barragem Sul	Barragem adequada	unidade	0,80	0,04	5,09	%	18.668.199,01	5.462.568,99	29,26	%	Em andamento
350091	015988	2025OE000002	Aquisição e Instalação de motobombas nos diques de contenção de Blumenau	Barragem adequada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	9.746.770,00	0,00	0,00	%	Em andamento
350091	015989	2024OE000024	Elaboração do componente indígena e estudo ambiental na Barragem de José Boiteux	Ação realizada	unidade	0,40	0,00	0,00	%	159.285,85	0,00	0,00	%	Em andamento
350091	015989	2024OE000066	Suporte à implementação do Programa Proteção Levada a Sério	Ação realizada	unidade	0,50	0,00	0,00	%	3.411.396,80	499.228,80	14,63	%	Em andamento
440001	015211	2024OE000064	Melhorias estruturais da Secretaria de Estado da Agricultura - Reforma do Prédio da SAR	Obra executada	unidade	1,00	0,30	30,00	%	4.636.802,88	2.222.004,37	47,92	%	Em andamento
440093	015420	2025OE000003	Contratação de empresa p/ prestação de serviços para realização de guarda de acervo papel	Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00	%	447.399,66	31.855,42	7,12	%	Em andamento
440093	015420	2025OE000004	Contratação de serviços para o desenvolvimento do Sistema de Gestão da Maricultura - SIGMA	Projeto apoiado	unidade	1,00	0,00	0,00	%	273.930,54	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000002	Construção da Quadra Poliesportiva da EEB Marilda Lenia Araujo de Rancho Queimado.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,95	94,75	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000004	Reforma e Ampliação da EEB Walter Holthausen, município de Lauro Muller.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	1,00	99,61	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000005	Reforma da EEB Maria de Lourdes Scherer, município de Biguaçu.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,83	83,29	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000008	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Vicente Silveira - Palhoça	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,57	56,54	%	800.000,00	590.091,84	73,76	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000014	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Dom Pio de Freitas - Joinville	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,89	88,62	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000015	Reforma e ampliação da EEB Araranguá, município de Araranguá.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,76	76,14	%	300.000,00	119.555,59	39,85	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000016	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profº Rudolfo Meyer - Joinville	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,93	93,00	%	300.000,00	185.875,08	61,96	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000017	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Prof. Tercilio Bast em Major Gercino	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,22	22,29	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001	011490	2024OE000018	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Marechal Luz - Jaguaruna	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,63	62,74 %	200.000,00	91.660,66	45,83 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000019	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Comendador Rocha - Laguna	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,71	70,93 %	500.000,00	447.185,51	89,44 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000020	Reforma e Ampliação da EEB Prof. Avelino Muller - Município Biguaçu	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,48	47,78 %	500.000,00	355.389,73	71,08 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000021	Reforma e Ampliação da EEB Neusa Massolini, município de Xaxim	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,80	79,53 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000022	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Potasio Joaquim Cunha - Município: Sombrio	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,97	96,59 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000023	Quadra Poliesportiva - EEB Profª Francisca Martins de Oliveira Burigo - Cocal do Sul	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,11	10,90 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000025	Reforma e Ampliação EEB Aderbal Ramos da Silva - Município Florianópolis	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,63	63,03 %	310.000,00	266.740,01	86,05 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000027	Reforma e Ampliação da EEB Profª Maria da Glória Silva - Içara	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,96	96,36 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000028	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Eng. Annes Gualberto - Município: Imbituba	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,97	97,13 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000029	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Venceslau Bueno - Palhoça	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,57	57,00 %	630.000,00	411.695,55	65,35 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000030	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Gov. Heriberto Hulse - Criciúma	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,94	93,95 %	400.000,00	258.230,72	64,56 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000031	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Francisco de Paula Seara - Itajaí	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,99	98,61 %	51.477,73	51.477,73	100,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000032	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Galeazzo Paganelli - Vargem Bonita.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,92	91,68 %	800.000,00	419.082,26	52,39 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000033	Reforma e Ampliação da EEB Conêgo Rodolfo Machado - município Biguaçu	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,82	82,16 %	540.000,00	414.180,34	76,70 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000037	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profº Gustavo Augusto Gonzaga- Joinville	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,94	93,76 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000038	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profª Maria do Carmo de Souza - Palhoça.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,67	67,33 %	400.000,00	301.379,89	75,34 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000039	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Sen. Francisco Benjamin Gallotti - Tubarão	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,79	79,12 %	800.000,00	416.967,04	52,12 %	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001	011490	2024OE000041	Contratação de empresa para a quadra EEB Catequista Joana Pendica , de Gravatal.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,67	66,66 %	800.000,00	325.025,04	40,63 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000042	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Gregório Manoel de Bem - LAGUNA	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,89	88,50 %	200.000,00	165.454,81	82,73 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000043	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Profª Valesca Carmen Resk Parizotto - Chapecó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,93	93,41 %	770.000,00	603.427,42	78,37 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000044	Reforma e Ampliação da EEB Profª Tânia Mara Faria e Silva Locks - município Biguaçu	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,80	80,15 %	300.000,00	296.693,48	98,90 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000045	Construção de Quadra Poliesportiva- EEB Encano do Norte - Indaial	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,89	89,09 %	900.000,00	798.571,84	88,73 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000047	Reforma e Ampliação Cedup Abílio Paulo - Município: Criciúma.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,47	46,78 %	1.500.000,00	487.429,99	32,50 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000048	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Zulma Becker - Santo Amaro da Imperatriz	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,69	68,66 %	630.000,00	368.488,69	58,49 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000050	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Werner Knabben - Braço do Norte.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,83	82,77 %	400.000,00	25.407,44	6,35 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000051	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Pedro Maciel - Chapecó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,89	89,21 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000053	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB São Francisco - Chapecó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,90	89,98 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000058	Construção de Quadra Poliesportiva- EEB Iracy Tonello - Xanxerê	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,94	94,22 %	521.305,45	521.305,45	100,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000061	Reforma e Ampliação EEB Gov. Pedro Ivo Figueiredo de Campos - Palhoça	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,80	80,09 %	1.200.000,00	712.348,53	59,36 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000062	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Maria Amin Ghanem - Joinville	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,96	96,01 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000064	Reforma da EEB Cacilda Guimarães - Vidal Ramos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,98	98,39 %	300.000,00	111.217,70	37,07 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000065	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profª Ursulina de Senna Castro Palhoça.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,54	54,21 %	600.000,00	589.106,47	98,18 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000067	Reforma e Ampliação EEB João Frassetto - Criciúma	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,57	56,99 %	690.000,00	455.506,64	66,02 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000068	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Nicolina Tancredo - Palhoça	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,57	56,57 %	710.000,00	448.218,53	63,13 %	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001	011490	2024OE000069	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Imaculada Conceição - Jacinto Machado.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	1,00	99,79 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000070	Recuperação marquises e infiltrações do Ginásio da EEB Eugênio Marchetti de Herval d'Oeste	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,59	58,69 %	177.533,57	22.794,97	12,84 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000071	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Profª Eloisa Maria Prazeres de Faria - Biguaçu	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,12	11,78 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000072	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Profª Julieta Lentz Puerta - Joaçaba.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,95	94,94 %	1.200.000,00	1.093.099,96	91,09 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000073	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Idelfonso Linhares - Florianópolis	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,71	70,56 %	800.000,00	562.106,68	70,26 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000077	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Carmen Seara Leite - Garuva	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,86	86,25 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000078	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Prof. Noé Abati - Tubarão	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,89	88,59 %	800.000,00	275.063,76	34,38 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000079	Construção de Quadra Poliesportiva - CEDUP Diomicio Freitas - Tubarão	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,75	75,01 %	600.000,00	203.416,69	33,90 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000081	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Mota Pires - Araranguá	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	1,00	99,58 %	200.000,00	181.654,96	90,83 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000083	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Georg Keller - Joinville	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,96	96,42 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000084	Reforma do Muro e Calçada EEB Jurrema Cavallazzi - Florianópolis	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,85	85,42 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000085	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Conselheiro Astrogildo Odon Aguiar - Barra Velha	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,74	73,84 %	300.000,00	175.642,22	58,55 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000086	Reforma e Ampliação da EEB São Ludgero - Município de São Ludgero	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,79	79,06 %	1.500.000,00	654.859,30	43,66 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000087	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Prof Silveira de Matos Santo Amaro da Imperatriz	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,63	63,36 %	700.000,00	519.079,57	74,15 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000088	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Gov. Aderbal Ramos da Silva - Tubarão	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,79	78,84 %	800.000,00	746.434,42	93,30 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000089	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Prof. João Rocha - Joinville	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,28	28,14 %	600.000,00	128.294,02	21,38 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000093	Reforma e Ampliação EEB Wanderley Junior - São José	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,37	37,29 %	500.000,00	390.737,60	78,15 %	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001	011490	2024OE000094	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Martinho Ghizzo - Tubarão	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,90	90,16	%	100.000,00	33.375,31	33,38	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000095	Reforma EEF Julio da Costa Neves, Florianópolis	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,96	96,31	%	500.000,00	453.125,44	90,63	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000097	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Angelo Ize - Forquilha	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,90	89,60	%	558.085,24	353.794,80	63,39	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000098	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Conego Nicolau Gesing - Braço do Norte	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,95	95,19	%	61.967,51	61.967,51	100,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000099	Reforma e ampliação da EEB Vendelino Jungles, no município de Pinhalzinho	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,97	96,70	%	500.000,00	478.751,43	95,75	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000100	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Profª. Palmira Morais de Miranda - Pescaria Brava	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,74	73,83	%	800.000,00	686.014,56	85,75	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000101	Conclusão da Reforma e Ampliação da EEB Henrique Estefano Koerich - município: Palhoça	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,98	98,40	%	68.840,95	68.840,95	100,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000103	Reforma e Ampliação da EEB Profª Neusa Ostetto Cardoso - município: Araranguá	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,73	72,60	%	200.000,00	86.307,43	43,15	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000104	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profª Clairinice Vieira Caldeira - São Francisco	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,95	95,11	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000106	Reforma e Ampliação da EEB Idelfonso Linhares, município de Florianópolis.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,68	68,07	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000108	Construção da quadra da EEB Jurereza Cavalazi de Florianópolis.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,95	95,49	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000110	Reforma e Ampliação EEB Aníbal Nunes Pires - Município: Florianópolis	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,64	64,38	%	750.000,00	596.692,48	79,56	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000112	Construção de Quadra poliesportiva na EEF SÃO Cristóvão Cristóvão de Criciúma.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,86	86,45	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000113	Construção de Quadra poliesportiva na EEB Leopoldo Koprowsky em Benedito Novo	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,93	93,06	%	800.000,00	624.944,89	78,12	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000114	Reforma da EEB Irmã Edvigés, município de Criciúma.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,72	71,61	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000117	Reforma e Ampliação da EEF Santo Antônio - Biguaçu	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,64	63,77	%	370.000,00	188.139,83	50,85	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000118	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Operária - Araranguá	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,97	97,29	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001	011490	2024OE000126 Reforma e Ampliação da EEB Luiz Coradi - Xanxerê	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,52	51,51	%	300.000,00	62.549,97	20,85	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000127 Execução do Muro de Contenção EEB Martinho Alves dos Santos - Tubarão	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,85	84,88	%	205.087,49	79.473,23	38,75	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000129 Elaboração de Projetos e Realização de diagnóstico da Estrutura Física das UGs	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,30	0,07	23,00	%	3.622.429,40	2.308.225,33	63,72	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000159 Reforma e Ampliação EEB Leopoldo Jacobsen - Taió	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,96	96,14	%	550.000,00	515.539,90	93,73	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000199 Instalação de sistema fotovoltaico na EEB Artur da Costa e Silva de Xanxerê	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,23	23,05	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000230 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Irmã Gertrudes - Ponte Alta	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,05	10,76	%	600.000,00	154.348,22	25,72	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000232 Ampliação da EEB Alfredo Dalfovo - Rio do Sul	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,30	0,07	22,42	%	300.000,00	146.866,21	48,96	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000327 Reforma do Ginásio de Esporte EEB Rosa Torres de Miranda - Florianópolis	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,56	70,55	%	806.383,39	203.851,73	25,28	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000333 Reforma e Ampliação da EEB Cecilia Bertha Hildegard Cardoso, em Lontras	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,58	72,36	%	1.100.000,00	465.380,35	42,31	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000350 Reforma do Ginásio de Esporte EEB João Paulo I - Correira Pinto	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,32	39,83	%	610.608,27	220.354,87	36,09	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000355 Reforma do Ginásio de Esporte EEB José do Patrocínio - Siderópolis	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,37	46,00	%	800.000,00	227.240,13	28,41	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000366 Reforma e ampliação da EEB Pio XII, no município de Entre Rios	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,42	52,66	%	1.350.000,00	1.125.229,96	83,35	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000371 Reforma e ampliação da EEB João Boos, no município de Guabiruba.	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,14	27,26	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000372 Reforma das instalações elétricas da EEB Gama Rosa de São Pedro de Alcântara	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,96	96,13	%	39.846,51	26.424,19	66,31	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000386 Construção Escola Nova EIEF Vila Nova - Abelardo Luz	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,40	50,17	%	300.000,00	181.367,04	60,46	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000630 Subestação de energia elétrica EEB Visconde de Cairu - Lages	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,91	91,35	%	99.800,00	91.172,25	91,35	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000632 Instalações Elétricas e Subestação Energia Elétrica - EEB Prof. Marcílio Dias São Thiago	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	1,00	100,00	%	17.454,79	17.454,79	100,00	%	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001	011490	2024OE000638	Reforma e Ampliação da EIEF Mbya Limeira - Entre Rios	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,18	22,38	%	300.000,00	67.803,27	22,60	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000639	Reforma, Ampliação, Reforma do Ginásio da EEB Pero Vaz de Caminha - Florianópolis	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,14	28,03	%	650.000,00	432.423,48	66,53	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000653	Recuperação Estrutural da EEB Dom Pedro II - Caibi	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,98	98,05	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000655	Reforma do Ginásio de Esporte da EEB Manoel Cruz - São Joaquim	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,57	56,81	%	569.139,50	212.045,88	37,26	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000656	Reforma das instalações elétricas EEB PRofªOtilia Ulyssea Ungaretti em Cerro Negro	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,83	82,53	%	70.762,24	57.539,32	81,31	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000657	Quadra Poliesportiva EEF Prefeito Osny Pereira, município de Jaguaruna	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,05	6,44	%	200.000,00	126.357,63	63,18	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000658	Quadra Poliesportiva EEF Pe Heriberto Borgert, município de Grão Pará	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,01	1,49	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000659	Quadra Poliesportiva EEB PE Jacob Luiz Neibel - Braço do Norte	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,09	17,35	%	700.000,00	240.255,51	34,32	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000660	Manta Asfáltica Aluminizada na Cobertura do Ginásio - EEB Santa Rita - São Miguel D Oeste	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,98	98,32	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000661	Reforma Instalações Elétricas e Subestação de Energia - EEB João Colin - Joinville	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,52	52,00	%	292.982,38	99.195,84	33,86	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000664	Reforma das instalações Elétricas EEB Profª Lourdes Angela Sarturi Lago - Chapecó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,09	8,93	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000671	Reforma parcial das instalações elétricas EEB Galeazzo Paganelli em Vargem Bonita	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,20	%	234.900,00	22.287,69	9,49	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000677	Quadra Poliesportiva EEB Gov. Ireneu Bornhausen - Dionísio Cerqueira	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,06	12,09	%	1.000.000,00	303.625,42	30,36	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000681	Subestação de energia elétrica da EEB EMB. Edmundo da Luz Pinto - Curitibaanos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,26	25,72	%	138.490,90	35.632,33	25,73	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000694	Subestação de entrada de energia EEB Domingos Magarinos - Concórdia	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,00	0,10	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000697	Subestação energia/reforma instalações elétricas EEB Profª Lourdes Tonin Planalto Alegre	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,44	55,06	%	154.370,65	68.990,86	44,69	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000698	Subestação energia/reforma instalações elétricas EEB Prof Genoveva Dalla Costa - Riqueza	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,00	0,10	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001	011490	2024OE000699 Subestação de energia /reforma das instalações elétricas EEB Prof. João Rocha Joinville	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,46	57,62	%	132.109,80	54.945,76	41,59	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000700 Subestação de energia /reforma das instalações elétricas EEB Antônio Morandini - Chapecó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,41	50,95	%	169.800,00	86.523,40	50,96	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000701 Entrada de Energia Elétrica EEB Freya Hoffmann Wettengel - Concórdia	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,15	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000702 Subestação de energia /reforma das instalações elétricas EEB Pref Higino Aguiar Araquari	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,88	88,00	%	128.044,09	113.743,76	88,83	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000703 Subestação energia elétrica EEB Prof Jaldyr Bhering Faustino da Silva -São Miguel do Oeste	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,99	98,91	%	140.000,01	137.934,81	98,52	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000705 Reforma e Ampliação da EEB São Francisco em Chapecó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,08	10,00	%	800.000,00	459.794,17	57,47	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000711 Reforma e Ampliação da EEB Irmã Wienfrida - Catanduvas	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,07	13,23	%	1.200.000,00	957.836,60	79,82	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000715 Reforma Elétrica EEB João Roberto Moreira - São Domingos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,98	98,13	%	252.697,75	247.331,30	97,88	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000716 Subestação de energia /reforma das instalações elétricas EEB Rosina Nardi - Seara	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,10	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000717 Reforma das instalações elétricas EEB Erich Gruetzmacher em Jaraguá do Sul	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,25	24,61	%	120.839,51	13.176,53	10,90	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000719 Subestação de energia /reforma das instalações elétricas EIEF FEN NO - Chapecó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,19	23,24	%	179.178,72	17.987,81	10,04	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000720 Subestação de energia /reforma das instalações elétricas EEB Profª Geni Comel - Chapecó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,36	44,64	%	203.594,00	51.342,96	25,22	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000721 Subestação de energia /reforma das instalações elétricas EEB Bela Vista - Fraiburgo	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,17	21,01	%	100.000,00	34.459,02	34,46	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000722 Subestação de energia /reforma das instalações elétricas EEB Olga Fin Travi - Chapecó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,27	27,06	%	236.049,53	63.884,19	27,06	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000723 Subestação energia /reforma das instalações elétricas EEB Dr Naya Gonzaga Sampaio-Caçador	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,18	23,07	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000724 Subestação de energia /reforma das instalações elétricas EEB 25 de Maio - Fraiburgo	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,38	47,68	%	150.000,00	102.574,79	68,38	%	Em andamento
450001	011490	2024OE000725 Subestação energia /reforma instalações elétricas EEB Josefina Caldeira Andrade - Videira	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,10	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001	011490	2024OE000726	Reforma Elétrica EEB Anita Garibaldi - Itapema	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,05 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000739	Reforma das instalações elétricas EEB Coronel Gasparino Zorzi em Campos Novos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,05	4,95 %	212.700,00	10.543,16	4,96 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000833	Quadra Poliesportiva EEF Sen. Francisco Bejamin Gallotti - Rodeio	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,12	24,41 %	500.000,00	387.420,31	77,48 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000848	Subestação de energia /reforma das instalações elétricas EEB Calmon - Município de Calmon	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,10 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000849	Construção de subestação de energia na EEB Padre Bruno Pokolm de Videira	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,13	13,46 %	145.999,99	19.658,35	13,46 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000904	Quadra Poliesportiva EEB Campos Sales - Bocaína do Sul	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,07	14,23 %	800.000,00	295.465,08	36,93 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000905	Subestação de energia EEB Irmão Joaquim - Ibicaré	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,15	14,90 %	127.900,00	19.064,40	14,91 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000906	Reforma e Ampliação da EEF Tiradentes - Cunha Porã	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,30	0,02	8,20 %	500.000,00	219.228,99	43,85 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000907	Quadra Poliesportiva EEB Luiz Felix Barreto - Imaruí	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,47	58,45 %	400.000,00	206.403,82	51,60 %	Em andamento
450001	011490	2024OE000910	Reforma das instalações elétricas da EEB Deodoro do município de Concórdia	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,01	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2025OE000008	Reforma e Ampliação Instalações Elétricas EEF Francisco de Paula Seara - Itajaí	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,00 %	123.250,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2025OE000009	Reforma e Ampliação Instalações Elétricas EEB Roland Harold Dornbusch - Jaraguá do Sul	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,16	16,04 %	154.800,00	24.837,16	16,04 %	Em andamento
450001	011490	2025OE000010	Reforma e Ampliação Instalações Elétricas EEB Campos Sales - Bocaína do Sul	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,00 %	159.000,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2025OE000011	Reforma e Ampliação Instalações Elétricas EEB Gov. Irineu Bornhausem - Dionisio Cerqueira	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,00 %	190.475,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2025OE000012	Reforma e Ampliação Instalações Elétricas EEB Cristo Rei - São João do Oeste	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,00 %	195.821,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2025OE000013	Reforma e Ampliação Instalações Elétricas EEB Marino Pisani - Monte Carlo	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,00 %	210.000,00	0,00	0,00 %	Em andamento
450001	011490	2025OE000014	Reforma e Ampliação Instalações Elétricas EEB Gov. Bornhausen Arroio Trinta	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,00 %	220.000,00	0,00	0,00 %	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001	011490	2025OE000015 Reforma e Ampliação Instalações Elétricas EEB Profª Maria da Glória Mattos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	181.119,50	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000016 Reforma e Ampliação Instalações Elétricas EEB Profª Eremeta Souza - Araranguá	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	149.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000017 Reforma e Ampliação Instalações Elétricas EEB Julieta Aguiar Bertoncini	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	177.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000018 Reforma e Ampliação Instalações Elétricas EEB Samuel Sandrini - Orleans	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	238.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000020 Construção de quadra poliesportiva - EEF Laudelino de Souza Medeiros, São José do Cerreto	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,78	78,42	%	400.000,00	362.798,44	90,70	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000021 Execução de muro de arrimo na EEB Dep. Altir Webber de Mello de Curitibaanos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	2.640.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000023 Quadra Poliesportiva EEB Vinte e Cinco de Maio - Fraiburgo	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,00	0,00	%	2.303.298,57	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000029 Reforma e Ampliação EEB Ruth Lebarbechon - Água Doce	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,01	2,53	%	500.000,00	141.853,74	28,37	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000031 Reforma e Ampliação EEB Bertino Silva - município de Leoberto Leal	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,00	0,00	%	500.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000035 Construção Muro de Arrimo/Reforma das Instalações Elétricas - EEB Sara Castelhana Kleinkauf	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,30	0,00	0,00	%	500.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000041 Construção de passarela na EEB Jorge Schutz em Turvo	147 Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,00	0,00	%	320.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000047 Muro de contenção/recuperação/estabilização geotécnica - EEB Costa Carneiro - Orleans	147 Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,00	0,00	%	600.000,00	271.190,01	45,20	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000048 Aquisição e Instalação de Plataforma Elevatória EEB Aleixo DellaGiustina - Ituporanga	147 Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,50	0,00	0,00	%	68.899,82	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000051 Reforma da Quadra de Esporte da EEB Manoel Cruz em São Joaquim	147 Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,30	0,00	0,00	%	254.500,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000052 Reforma da Quadra de Esporte da EEB Emiliano Ramos em Capão Alto	147 Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,30	0,00	0,00	%	462.500,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000055 Reforma da EEB Jurema Savi Milanez - Quilombo	147 Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,30	0,00	0,00	%	1.000.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011490	2025OE000056 Reforma EEB Santa Helena no município de Santa Helena	147 Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,30	0,00	0,00	%	1.000.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001	011490	2025OE000057 Reforma e Ampliação da EEB Virgílio Varzea - Itaiópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,30	0,00	0,00	%	1.000.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	011492	2024OE000670 Reforma na Sala Ordenha e Esterqueira Cedup Profº Jaldyr B. Faustino da Silva - Água Doce	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	0,80	0,29	36,54	%	406.544,36	125.486,63	30,87	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000150 Reestruturação Física da Escola Mun. Valentin Bernardi, Itá - (TE 72/22) Cont. OE169/23	Município atendido	unidade	1,00	0,05	5,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000153 Ampliação de unidades de educação infantil no município de Taió.	Município atendido	unidade	1,00	0,50	50,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000200 Projetos executivos e construção do CMEI Professora Natalina Sabel do Amaral - Navegantes.	Município atendido	unidade	1,00	0,20	20,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000213 Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório - Matos Costa (2023TE277)	Município atendido	unidade	1,00	0,50	50,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000220 Construção de uma escola Municipal no bairro Desbravador - Chapecó (TE 1130/21)	Município atendido	unidade	1,00	0,70	70,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000226 Ampliação e reforma da EMEF Prefeito Dário Crepaldi, Morro Grande (TE 274/23)	Município atendido	unidade	1,00	0,50	50,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000227 Construção CEIM no bairro Desbravador - Chapecó - (TE1129/21)	Município atendido	unidade	1,00	0,70	70,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000228 Construção de sala de aula na Creche Criança Feliz - Urupema (TE 43/23)	Município atendido	unidade	1,00	0,50	50,00	%	240.000,00	240.000,00	100,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000234 Construção de uma escola em Garuva - (TE091/23)	Município atendido	unidade	1,00	0,30	30,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000328 Reforma e ampliação da Escola César Avelino Bragagnolo - Erval Velho - (TE 238/23)	Município atendido	unidade	0,50	0,15	30,00	%	321.000,00	321.000,00	100,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000382 Construção de Entro Educacional Infantil no município de Caibi. 2023TE272	Município atendido	unidade	1,00	0,40	40,00	%	500.000,00	500.000,00	100,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000385 Construção da Escola Municipal Prof. João Maria de Souza Jr. Leoberto Leal (TE475/2024)	Município atendido	unidade	1,00	0,50	50,00	%	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000391 Construção de uma escola no município de Treze Tílias - (TE538/24)	Município atendido	unidade	1,00	0,50	50,00	%	1.237.500,00	1.237.500,00	100,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000395 Finalização da nova escola em Treze Tílias - (TE 539/24)	Município atendido	unidade	1,00	0,50	50,00	%	954.166,67	954.166,67	100,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000396 Ampliação da Escola de Educação Básica Belchior em Gaspar -	Município atendido	unidade	1,00	0,40	40,00	%	1.192.513,56	1.192.513,56	100,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000401 Construção de Quadras Esportiva em Urupema - (TE688/24)	Município atendido	unidade	1,00	0,30	30,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000901 Troca Parcial da Cobertura do Acesso CEI Municipal Frei Silvano - Água Doce	Município atendido	unidade	1,00	0,50	50,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	015133	2024OE000908 Aquisição de mobiliário e equipamentos para Escolas do município de Balneário Rincão	Município atendido	unidade	1,00	0,50	50,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450001	015133	2025OE000005 Construção de Bloco de Salas de Aula no município de Barra Bonita	Município atendido	unidade	1,00	0,00	0,00	%	150.000,00	150.000,00	100,00	%	Em andamento
450022	005312	2024OE000072 Elaborar projetos executivos para obras no Oeste do Estado, no centro de ensino CEO/UDESC	Obra executada	unidade	1,00	0,10	10,31	%	35.507,84	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	005315	2024OE000019 Executar reforma em prédio da Agronomia no CAV/UDESC em Lages/SC	Obra executada	unidade	1,00	0,83	83,39	%	1.700.000,00	579.010,10	34,06	%	Em andamento
450022	005315	2024OE000021 Construir Bloco Cirúrgico do hospital de clínica veterinária do CAV/UDESC em Lages	Obra executada	unidade	1,00	0,76	75,57	%	2.813.477,36	664.446,59	23,62	%	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450022	005315	2024OE000031 Construir alojamento e 2 barracões de depósito para FECAV no Cav em Lages/SC	Obra executada	unidade	1,00	0,99	98,97	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	005315	2024OE000032 Executar Reforma das Edificações do Tambo, em Lages/SC	Obra executada	unidade	1,00	1,00	100,00	%	33.240,10	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	005315	2024OE000044 Executar Instalações de PPCI em LA-GES	Obra executada	unidade	1,00	0,85	84,66	%	61.070,54	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	005317	2024OE000011 Construir infraestrutura para elevadores e banheiros acessíveis no campus de Joinville	Obra executada	unidade	1,00	0,76	75,90	%	272.354,31	272.354,31	100,00	%	Em andamento
450022	005317	2024OE000012 Adequar sistema preventivo de incêndio no campus de Joinville	Obra executada	unidade	1,00	0,84	84,38	%	250.000,00	213.566,82	85,43	%	Em andamento
450022	005317	2024OE000081 Elaborar projeto de iluminação externa do campus do Município de Joinville	Obra executada	unidade	1,00	0,57	57,00	%	10.590,04	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	005317	2024OE000082 Reformar prédios (Blocos B, D e N) do campus do Município de Joinville	Obra executada	unidade	1,00	0,04	3,88	%	30.000,00	29.961,14	99,87	%	Em andamento
450022	005318	2024OE000071 Elaborar projetos executivos para obras em São Bento do Sul no CEPLAN/UEDESC	Obra executada	unidade	1,00	0,08	8,45	%	39.515,30	2.255,84	5,71	%	Em andamento
450022	005320	2024OE000070 Elaborar projetos executivos para obras em Laguna no CERES/UEDESC	Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	8.369,02	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	009111	2025OE000010 Executar serviço de sondagem geotécnica em Balneário Camboriú no CESFI/UEDESC	195 Obra executada	unidade	0,01	0,00	0,00	%	5.242,22	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	012709	2024OE000053 Executar obra de reurbanização no CEAVI/UEDESC - Ibirama/SC	Obra executada	unidade	1,00	0,67	67,16	%	2.779.069,00	2.779.067,61	100,00	%	Em andamento
450022	012709	2025OE000009 Sondagem Geotécnica em Ibirama no CEAVI/UEDESC	195 Obra executada	unidade	0,01	0,00	0,00	%	51.924,59	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	014834	2024OE000069 Elaborar projetos executivos para obras em Florianópolis na ESAG/UEDESC	Obra executada	unidade	1,00	0,05	4,64	%	156.329,25	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	014835	2024OE000033 Executar o restauro e reforma da DAPE/FAED - Florianópolis/SC	Obra executada	unidade	1,00	0,46	45,81	%	972.735,67	69.065,91	7,10	%	Em andamento
450022	014835	2024OE000036 Executar fiscalização do restauro e reforma da DAPE/FAED - Florianópolis/SC	Obra executada	unidade	1,00	0,77	77,24	%	64.481,33	17.252,39	26,76	%	Em andamento
450022	014836	2024OE000068 Elaborar projetos executivos para obras em Florianópolis no CEART/UEDESC	Obra executada	unidade	1,00	0,01	1,02	%	201.309,25	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	014836	2025OE000007 Executar Serviços de Sondagem no CEART, em FLORIANÓPOLIS	195 Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	21.309,29	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	014837	2025OE000006 Executar Serviços de Sondagem no CEAD, em FLORIANÓPOLIS	195 Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	11.072,69	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	014838	2024OE000067 Elaborar projetos executivos para obras em Florianópolis no CEFID/UEDESC	Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	9.176,76	2.331,01	25,40	%	Em andamento
450022	015051	2024OE000024 Elaborar Projetos para nova sede Reitoria e CEAD em Florianópolis/SC	Obra executada	unidade	1,00	0,28	27,78	%	214.500,00	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	015051	2024OE000027 Elaborar projetos executivos de prev. de incêndio e SPDA no Campus I em Florianópolis/SC	Obra executada	unidade	1,00	0,41	41,11	%	27.476,36	0,00	0,00	%	Em andamento
450022	015051	2024OE000088 Consultoria e Elaboração de Laudo Técnico Em Acessibilidade	Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	10.800,00	10.800,00	100,00	%	Em andamento
450022	015960	2024OE000090 Bolsistas Projeto ECOSAB - UDESC	Projeto apoiado	unidade	1,80	0,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
470093	009259	2024OE000010 Contratar serviço de Arquitetura para imóvel tombado pelo IPHAN - Laguna	Obra executada	unidade	1,00	0,95	94,94	%	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado
470093	009259	2024OE000011 Manut de pintura externa e da cobertura Bloco II do Centro Administrativo - Florianópolis	Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado
470093	009259	2024OE000017 Manut de pintura externa e da cobertura Bloco III do Centro Administrativo - Florianópolis	Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

470093	009259	2024OE000019	Projetos de Engenharia Blocos II e III do Centro Administrativo - Florianópolis	Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000081	Executar continuidade da obra da Medicina Nuclear do Instituto de Cardiologia	Ação realizada	unidade	1,00	0,82	82,30	%	227.246,97	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000084	Elaborar projetos de Gases Medicinais para o Hospital Infantil Joana de Gusmão	Ação realizada	unidade	1,00	0,50	50,00	%	155.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000093	Reformar cobertura de setores do HRSJ	Ação realizada	unidade	1,00	1,00	99,80	%	127.580,68	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000099	Adequar instalação de gases medicinais no HIJG	Ação realizada	unidade	1,00	0,78	77,90	%	400.960,22	115.651,76	28,84	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000100	Reformar 04 elevadores do Hospital Regional de São José	Ação realizada	unidade	1,00	0,25	25,46	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000131	Executar reforma das instalações elétricas do Hospital Santa Teresa	Ação realizada	unidade	1,00	0,47	47,20	%	507.310,93	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000133	Elaborar projeto elétrico para Hospital Tereza Ramos	Ação realizada	unidade	1,00	0,63	62,50	%	16.107,25	0,00	0,00	%	Atrasado
480091	013268	2024OE000147	Projetar setor de Imagenologia do Hospital Nereu Ramos	Ação realizada	unidade	1,00	0,16	16,38	%	46.463,06	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000149	Elaborar projeto elétrico para HGCR e IPQ	Ação realizada	unidade	1,00	0,79	78,93	%	53.488,56	29.835,46	55,78	%	Atrasado
480091	013268	2024OE000210	Substituir piso vinílico para o HGCR	Ação realizada	unidade	1,00	0,73	72,84	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000237	Executar reforma de coberturas do Hospital Santa Teresa HST	Ação realizada	unidade	1,00	0,27	26,52	%	1.404.759,67	143.942,33	10,25	%	Atrasado
480091	013268	2024OE000251	Executar reforma do Grupo C e da Emergência do Hospital Infantil	Ação realizada	unidade	1,00	0,82	82,26	%	328.594,88	79.555,38	24,21	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000252	Executar reforma em vários setores do HRSJ	Ação realizada	unidade	1,00	0,55	54,58	%	752.834,26	173.825,86	23,09	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000390	Reformar a fachada do HRSJ/ICSC	Ação realizada	unidade	1,00	0,36	35,50	%	1.441.256,34	131.570,44	9,13	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000392	Reformar esquadrias das fachadas do HRSJ e do ICSC	Ação realizada	unidade	1,00	0,24	24,06	%	992.461,90	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000697	Realizar manutenção dos elevadores do Edifício Halley, SES	Ação realizada	unidade	1,00	0,17	16,67	%	63.384,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000708	Executar serviços de manutenção do HGRC	Ação realizada	unidade	1,00	0,03	3,39	%	600.000,00	7.812,70	1,30	%	Atrasado
480091	013268	2024OE000709	Executar serviços de manutenção da MDC	Ação realizada	unidade	1,00	0,02	2,28	%	250.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000710	Executar serviços de manutenção do CCR	Ação realizada	unidade	1,00	0,26	25,98	%	125.607,35	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000711	Executar serviços de manutenção do HIJG	Ação realizada	unidade	1,00	0,28	27,73	%	900.000,00	246.466,52	27,39	%	Atrasado
480091	013268	2024OE000712	Executar serviços de manutenção do HNR	Ação realizada	unidade	1,00	0,05	4,85	%	250.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000714	Executar serviços de manutenção do Ed. Halley - Sede da SES	Ação realizada	unidade	1,00	0,13	13,41	%	250.000,00	2.544,50	1,02	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000715	Executar serviços de manutenção da GERSA Grande Florianópolis	Ação realizada	unidade	1,00	0,02	2,23	%	68.250,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000716	Executar serviços de manutenção predial para Anexo I da SES	Ação realizada	unidade	1,00	0,02	1,67	%	250.000,00	4.008,15	1,60	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000717	Executar serviços de manutenção predial área LACEN/DIVS	Ação realizada	unidade	1,00	0,19	18,78	%	200.000,00	82.284,57	41,14	%	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

480091	013268	2024OE000718 Executar serviços de manutenção predial do Almoxarifado da D	Ação realizada	unidade	1,00	0,17	17,10	%	62.562,54	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000719 Executar serviços de manutenção predial da GEPAT	Ação realizada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	68.250,00	2.048,22	3,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000720 Executar serviços de manutenção predial do HRSJ	Ação realizada	unidade	1,00	0,12	11,64	%	250.000,00	167.144,86	66,86	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000721 Execução de serviços de manutenção predial para o ICSC	Ação realizada	unidade	1,00	0,06	5,77	%	250.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000722 Executar serviços de manutenção predial do HST	Ação realizada	unidade	1,00	0,04	3,57	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000723 Executar serviços de manutenção predial do IPQ	Ação realizada	unidade	1,00	0,55	54,57	%	450.000,00	177.431,91	39,43	%	Atrasado
480091	013268	2024OE000724 Executar serviços de manutenção predial do HRHDS	Ação realizada	unidade	1,00	0,26	25,59	%	800.009,61	283.359,95	35,42	%	Atrasado
480091	013268	2024OE000725 Executar serviços de manutenção predial da GERSA Criciúma	Ação realizada	unidade	1,00	0,68	67,78	%	74.962,50	50.811,07	67,78	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000726 Executar serviços de manutenção predial do LAREG Criciúma	Ação realizada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	74.962,50	0,00	0,00	%	Atrasado
480091	013268	2024OE000727 Executar serviços de manutenção predial da GERSA de Ararangu	Ação realizada	unidade	1,00	0,81	80,51	%	74.962,50	60.354,13	80,51	%	Atrasado
480091	013268	2024OE000729 Executar serviços de manutenção predial do LAREG Joaçaba	Ação realizada	unidade	1,00	0,83	82,66	%	75.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000731 Executar serviços de manutenção predial da GERSA Videira	Ação realizada	unidade	1,00	0,83	82,66	%	13.767,45	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000735 Executar serviços de manutenção predial da MDV	Ação realizada	unidade	1,00	0,66	66,06	%	281.415,24	64.630,41	22,97	%	Atrasado
480091	013268	2024OE000738 Executar serviços de manutenção predial da GERSA Jaraguá do	Ação realizada	unidade	1,00	0,23	22,94	%	57.792,28	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000741 Executar reforma do Bloco F do IPQ	Ação realizada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	1.563.784,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000745 Executar sistema preventivo contra incêndio do HGMTR	Ação realizada	unidade	1,00	0,61	61,42	%	288.725,71	123.585,10	42,80	%	Em andamento
480091	013268	2024OE000752 Executar reforma das marquises do HIJG	Ação realizada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	142.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2025OE000021 Reformar sistema de aquecimento de água do Hospital Tereza R	Ação realizada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	1.705.540,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2025OE000031 Recuperar das áreas internas do Hospital Governador Celso Ramos	Ação realizada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	4.595.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2025OE000045 Executar serviços de manutenção predial no HDWC	Ação realizada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	434.485,16	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2025OE000089 Realizar manutenção de subestações e rede primária das Unida	446 Ação realizada	unidade	1,00	0,05	4,92	%	1.134.138,00	0,00	0,00	%	Em andamento
480091	013268	2025OE000090 Realizar manutenção de equipamentos de climatização para as	446 Ação realizada	unidade	1,00	0,11	11,28	%	2.098.156,26	216.966,95	10,34	%	Em andamento
480091	013268	2025OE000091 Prestar assistência técnica e manutenção em Nobreaks e estab	446 Ação realizada	unidade	1,00	0,10	9,97	%	425.683,50	14.571,52	3,42	%	Em andamento
530001	012932	2024OE000103 Execução + Supervisão obras implant/pavim. acesso Norte de Blumenau, tr. BR-47 - SC-108	Rodovia pavimentada	km	15,60	3,83	24,58	%	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado
530001	012932	2024OE000121 Implantação de Viaduto sobre a Rua Guilherme Scharf, trecho BR-470 - Vila Itoupava	Rodovia pavimentada	km	0,07	0,07	93,12	%	2.200.000,00	76.669,66	3,48	%	Atrasado



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001	012933	2024OE000106 Supervisão + Obras de OAE e os respectivos acessos na Rod. BR-280, Entr. SC-413 e SC-143	Rodovia pavimentada	km	8,90	5,61	63,04 %	4.891.855,90	1.394.004,08	28,50 %	Atrasado
530001	012939	2024OE001011 Obras de implementação PAOI na lateral esquerda da cabeceira do aeroporto de Lages	Obra executada	unidade	1,00	0,90	89,53 %	0,00	0,00	0,00 %	Atrasado
530001	014296	2024OE000482 Supervisão + Obras na Rod. SC-370, tr. Urubici - Grão Pará - Serra do Corvo Branco	Rodovia pavimentada	km	9,60	2,65	27,64 %	7.295.018,00	760.577,39	10,43 %	Em andamento
530001	014445	2024OE000078 Programas Ambientais das obras da SC-290, trecho Divisa SC/RS - Praia Grande	Rodovia pavimentada	km	15,74	14,28	90,70 %	900.932,05	580.142,11	64,39 %	Atrasado
530001	014445	2024OE000173 Supervisão + obras da rod. SC-290, trecho Praia grande - Divisa SC/RS (Serra do Faxinal)	Rodovia pavimentada	km	15,63	5,02	32,11 %	18.136.484,85	10.465.502,40	57,70 %	Atrasado
530001	014465	2024OE001902 Supervisão das obras de restauração das rodovias SC-401 e SC-404	Rodovia reabilitada	km	9,14	0,00	0,00 %	500.000,00	162.250,16	32,45 %	Em andamento
530001	014471	2024OE000056 Sup. + Obras rest. melhor. aum. capac. rod. SC-283, Tr Concórdia-Arabutã-Ct Concórdia	Rodovia reabilitada	km	9,94	3,78	38,02 %	1.700.000,00	0,00	0,00 %	Atrasado
530001	014471	2024OE000203 Supervisão + obras de rest. aum. capac. da rod. SC-283, Tr. Seara - Arvoredo	Rodovia reabilitada	km	12,89	9,98	77,43 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
530001	014471	2024OE000447 Execução de ponte sobre o rio Macuco na rodovia SC-283	Rodovia reabilitada	km	0,06	0,01	17,15 %	0,00	0,00	0,00 %	Atrasado
530001	014471	2024OE001017 Supervisão + Obras de rest. aum. capac. da rod. SC-283, tr. Seara - Arvoredo	Rodovia reabilitada	km	27,56	0,88	3,19 %	7.519.910,79	3.034.999,09	40,36 %	Atrasado
530001	014471	2024OE001861 Obras rest. e aum. capac. SC-283, tr. Águas de Chapecó - São Carlos - Palmitos	Rodovia reabilitada	km	13,86	1,90	13,71 %	10.752.228,77	10.252.228,77	95,35 %	Em andamento
530001	014472	2024OE000119 Superv. + obras Rod. SC-150 (Entr.SC-467(p/Zortea) - Entr. SC-390-Piratuba-Entr.SC-150	Rodovia reabilitada	km	25,12	21,11	84,03 %	7.382.198,94	6.324.714,25	85,68 %	Atrasado
530001	014476	2024OE000100 Supervisão + obras de Restauração da Rod. SC-120, trecho Lebon Régis - Curitibaanos	Rodovia reabilitada	km	37,93	24,94	65,76 %	10.322.516,70	9.243.415,56	89,55 %	Em andamento
530001	014477	2024OE000159 Suoerv. + Obras de rest. aum. capac. rod. SC-477, tr. Canoinhas - Entr BR-116 (M. Castelo)	Rodovia reabilitada	km	34,50	28,07	81,36 %	17.000.000,00	16.685.169,59	98,15 %	Em andamento
530001	014485	2024OE000163 Supervisão + obras de rest. rod. SC-160, tr. B. Jesus Oeste-Serra Alta-Modelo-Pinhalzinho	Rodovia reabilitada	km	23,10	16,96	73,42 %	10.000.000,00	2.799.837,39	28,00 %	Atrasado
530001	014486	2024OE000454 Supervisão + obras rest. SC-305, trecho São L. do Oeste (Entr. SC-157) - Campo Erê	Rodovia reabilitada	km	28,00	4,98	17,77 %	19.000.000,00	3.007.474,50	15,83 %	Em andamento
530001	014492	2024OE002103 Reabilitação / Aumento de Capacidade / Supervisão SC-486, trecho BR-101 - Brusque	Rodovia reabilitada	km	20,91	15,29	73,11 %	500.000,00	337.710,46	67,54 %	Em andamento
530001	014492	2024OE002105 Obras de implant. pavim. da inters. Rod. SC-486 (Antônio Heil), ponte e dois viadutos	Rodovia reabilitada	km	0,78	0,18	23,35 %	18.379.531,09	18.379.531,09	100,00 %	Em andamento
530001	014496	2024OE002100 Supervisão + obras restauração SC-281 e SC-112, tr.s Atalanta-Agrolândia-Trombudo Central	Rodovia reabilitada	km	9,13	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento
530001	014506	2024OE001663 Supervisão de obras de pavim. do contorno de rio das Antas, tr. SC-135 e pte Rio Peixe	Rodovia reabilitada	km	1,49	0,68	45,45 %	300.000,00	72.389,02	24,13 %	Atrasado
530001	014511	2024OE000050 Proj. de Rest. Aum. Capac. da Rodovia SC-163 com implant. Contorno Viário Iporã do Oeste	Projeto de rodovia elaborado	km	15,26	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	Atrasado
530001	014511	2024OE000389 Proj. obras de pavim. e implantação da rod. SC-408, tr. Leoberto Leal - Alfredo Wagner	Projeto de rodovia elaborado	km	11,60	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	Atrasado
530001	014511	2024OE000390 Proj. Rest. melhoramentos da travessia de Forquilha região Sul/SC Lote 12	Projeto de rodovia elaborado	km	4,78	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	Atrasado
530001	014511	2024OE000393 Projeto de Implant. e Pavim. da rodovia SC-110, trecho Petrolândia - BR-282	Projeto de rodovia elaborado	km	14,76	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	Atrasado



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001	014511	2024OE000394 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Braço do Norte região Sul - Lote 11	Projeto de rodovia elaborado	km	2,26	0,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado
530001	014511	2024OE000843 Projeto de Rest. Melhoramentos SC-477, tr. Benedito Novo - Indaial (Entr. BR-470)	Projeto de rodovia elaborado	km	4,68	0,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado
530001	014511	2024OE000846 Projeto obras de implantação e pavimentação do contorno de Monte Carlo	Projeto de rodovia elaborado	km	1,34	0,05	3,48	%	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado
530001	014511	2024OE001655 Proj. Obras Rest. Rod.452, tr. Rod. SC-355 (p/ Fraiburgo) - M. Castelo - Brunópolis	Projeto de rodovia elaborado	km	14,26	0,66	4,61	%	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado
530001	014511	2024OE001887 Projeto de recuperação da ponte Limoeiro sobre o rio Itajaí-Mirim no município de Itajaí	Projeto de rodovia elaborado	km	0,02	0,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado
530001	014511	2024OE001890 Projeto para obras de pavim. implan. na Rod. SC-283, trecho Itapiranga - Mondaiá	Projeto de rodovia elaborado	km	27,05	0,00	0,00	%	118.956,05	118.956,05	100,00	%	Em andamento
530001	014511	2024OE001903 Proj. obras implant. e duplic. rod. corredor lit. Norte, Tr. Entr. BR-101 - Entr. SC-486	Projeto de rodovia elaborado	km	45,25	20,03	44,26	%	68.391,00	68.391,00	100,00	%	Em andamento
530001	014511	2024OE001904 Projeto Obras Rest. Aum. Capac. Rod. SC-350, Tr Aurora - Ituporanga - Entr. Acesso Imbuia	Projeto de rodovia elaborado	km	3,61	0,17	4,60	%	35.615,06	35.615,06	100,00	%	Em andamento
530001	014511	2024OE002143 Projeto obras implant. duplicação rod. corredor litorâneo Norte, tr. BR-101 - entr. SC-486	Projeto de rodovia elaborado	km	12,89	0,14	1,09	%	148.691,23	148.691,23	100,00	%	Em andamento
530001	014511	2024OE002144 Projeto obras implant. duplicação rod. corredor litorâneo N. tr. BR-101-Entr. SC-486 L2	Projeto de rodovia elaborado	km	13,43	0,17	1,27	%	175.609,01	175.609,01	100,00	%	Em andamento
530001	014511	2024OE002158 Projeto obras implant. duplicação rod. corredor litorâneo N. tr. BR-101-Entr. SC-486 L3	Projeto de rodovia elaborado	km	8,38	0,38	4,50	%	77.340,56	77.340,56	100,00	%	Em andamento
530001	014511	2024OE002159 Elabor. alter. projeto da ponte sobre o rio Macuco na rod. SC-283 no município Itapiranga	Projeto de rodovia elaborado	km	0,12	0,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
530001	014511	2024OE002160 Proj. Duplicação Rest. via existente e implant ciclovias tr. Entr. SC-401-Itacorubi-L. Conc	Projeto de rodovia elaborado	km	0,80	0,09	10,97	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
530001	014516	2024OE001019 Proj. de OAE e contenções p/ pavim. e implant. SC-108, BR-470 - Serra da Vila Itoupava	Estudo realizado	unidade	0,60	0,00	0,00	%	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado
530001	014749	2024OE002104 Supervisão + obras de Implant. e pavim. da SC-436, tr. São Martinho - Inters. SC-437	Rodovia pavimentada	km	3,10	0,00	0,00	%	60.083,33	60.083,33	100,00	%	Em andamento
530001	014749	2025OE000019 Supervisão obras pavimentação SC-390, trecho BR-116-São Jorge acesso Bodegão inclusive OAE	Rodovia pavimentada	km	8,92	0,00	0,00	%	42.076,40	42.076,40	100,00	%	Em andamento
530001	015046	2024OE000116 Supervisão + Obras na Rodovia SC-456, trecho Abdon Batista - Vargem	Rodovia pavimentada	km	20,36	7,48	36,75	%	5.000.000,00	2.000.416,61	40,01	%	Atrasado
530001	015101	2024OE000142 Supervisão + Obras de implant. pavim. da rod. SC-156, tr. Divisa SC/PR até São Domingos	Rodovia pavimentada	km	23,47	5,21	22,19	%	4.127.765,35	3.900.645,45	94,50	%	Atrasado
530001	015102	2025OE000022 Supervisão + Obras de implant. pavim. rod. SC-154, Tr. Faxinal dos Guedes - Ipumirim	Rodovia pavimentada	km	13,00	0,00	0,00	%	300.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
530001	015103	2024OE000170 Supervisão das obras nas rodovias SC-350 e SC-155	Rodovia pavimentada	km	47,01	40,79	86,77	%	318.420,73	203.109,02	63,79	%	Atrasado
530001	015103	2024OE000171 Execução das obras na rodovia SC-350, trecho Abelardo Luz - Passos Maia Lote 02	Rodovia pavimentada	km	22,95	5,36	23,36	%	4.749.724,21	4.749.724,21	100,00	%	Atrasado
530001	015103	2024OE000172 Execução das obras na rodovia SC-350, trecho Abelardo Luz - Passos Maia Lote 01	Rodovia pavimentada	km	24,06	3,68	15,31	%	4.989.888,99	4.989.885,99	100,00	%	Em andamento
530001	015105	2024OE000141 Supervisão + obras de implant. pavim. rod. SC-281, tr. S. Pedro de Alcântara - Angelina	Rodovia pavimentada	km	22,80	1,41	6,19	%	3.306.366,88	3.306.366,88	100,00	%	Em andamento
530001	015106	2024OE000091 Supervisão + obras da rodovia SC-492, trecho São M. da Boa Vista - Romelândia	Rodovia pavimentada	km	8,60	3,33	38,73	%	5.000.000,00	4.438.716,53	88,77	%	Atrasado



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001	015109	2024OE000158 Superv + Obras rest. rod. SC-340, tr. Entr. BR-280 (p/ Porto União) - Sta Cruz Timbó	Rodovia reabilitada	km	12,53	10,59	84,54	%	6.014.996,46	5.603.043,36	93,15	%	Atrasado
530001	015116	2024OE000313 Superv. + Obras de Rest. da rod. SC-110, trecho Pé da Serra (p/ Jaraguá do Sul) - Pomerode	Rodovia reabilitada	km	11,00	5,38	48,91	%	427.956,38	427.956,38	100,00	%	Atrasado
530001	015121	2024OE001188 Obras de implant. e pavim. da rod. SC-303, trecho Contorno Viário de Rio das Antas	Rodovia pavimentada	km	1,77	0,41	23,36	%	2.697.809,82	940.053,74	34,85	%	Atrasado
530001	015124	2024OE000832 Supervisão e obras de implantação e pavim. rod. SC-451, tr. Frei Rogério - Fraiburgo	Rodovia pavimentada	km	12,31	0,75	6,10	%	1.540.040,78	1.540.040,78	100,00	%	Em andamento
530001	015129	2024OE000114 Supervisão das obras de rest. das Rod. SC-386, tr. Itapiranga Mondai, e OAE na SC-283	Rodovia reabilitada	km	0,85	0,04	4,37	%	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado
530001	015136	2024OE000125 Supervisão + obras de pavim. da SC-414, tr. Luiz Alves - Entr. SC-108 (p/ Massaranduba)	Rodovia pavimentada	km	12,79	4,02	31,42	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
530001	015138	2024OE000426 Superv. + Obras de reabilit. aum. capac. rod. SC-108, trecho Guarimir - Massaranduba	Rodovia reabilitada	km	9,00	0,47	5,25	%	18.500.000,00	6.405.178,77	34,62	%	Em andamento
530001	015142	2024OE000420 Supervisão + Obras implantação e pavimentação SC-108, , tr. Jacinto Machado - Praia Grande	Rodovia pavimentada	km	32,00	6,76	21,14	%	4.058.278,62	3.122.115,51	76,93	%	Atrasado
530001	015152	2024OE000430 Obras de implantação e pavimentação do Anel Viário de Criciúma	Rodovia pavimentada	km	2,60	1,07	41,09	%	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento
530001	015153	2025OE000021 Obras implant. pavim. SC-436, tr. São Martinho (Ac. Santuário A. Berkenbrock)-int. SC-437	Rodovia pavimentada	km	7,75	0,00	0,00	%	4.746.121,16	46.121,16	0,97	%	Em andamento
530001	015164	2024OE000144 Supervisão + Obras de implant. pavim. rod. SC-437, tr. entre Pescaria Brava div. Imaruí	Rodovia pavimentada	km	7,20	5,27	73,20	%	5.000.000,00	378.418,90	7,57	%	Atrasado
530001	015186	2024OE001892 Obras de implantação e pavimentação da SC-435, trecho São Bonifácio - São Martinho	Rodovia pavimentada	km	8,82	0,25	2,87	%	4.700.000,00	255.190,47	5,43	%	Em andamento
530001	015187	2025OE000020 Supervisão + Obras de implant. pavim. da Rod. SC-108, trecho Anitápolis - Sta Rosa de Lima	Rodovia pavimentada	km	12,50	0,00	0,00	%	90.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
530001	015191	2024OE000099 Supervisão + Obras de rest. com aum. capac. da rod. SC-355, tr. Catanduvas - Jaborá	Rodovia reabilitada	km	15,10	1,25	8,26	%	442.768,77	419.994,15	94,86	%	Em andamento
530001	015194	2024OE000355 Supervisão + Obras de implant. pavim. da rod. SC-370, tr. Urubici - Rio Rufino	Rodovia pavimentada	km	29,02	1,92	6,62	%	10.000.000,00	4.748.101,14	47,48	%	Atrasado
530001	015387	2024OE001876 Pavimentação e drenagem asfáltica da Av. Altos de Jaqueira em Palhoça	Obra executada	unidade	0,50	0,50	100,00	%	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	%	Em andamento
530001	015431	2024OE000122 Supervisão + obras de pavimentação da rodovia SC-281, trecho Ituporanga - Atalanta	Rodovia pavimentada	km	19,31	8,16	42,28	%	7.783.329,00	7.452.480,42	95,75	%	Atrasado
530001	015432	2024OE000102 Supervisão + Obras de Implant. e Pavim. da Rod. SC-465, trecho Macieira - Arroio Trinta	Rodovia pavimentada	km	8,59	2,23	25,92	%	5.971.103,03	5.971.103,03	100,00	%	Em andamento
530001	015434	2024OE000049 Supervisão + obras de pavim. Rod. Mosenhor Quinto Davide Baldessar - SC-443	Rodovia pavimentada	km	5,67	5,14	90,67	%	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado
530001	015453	2025OE000018 Supervisão + obras restauração SC-281 e SC-112, tr.s Atalanta-Agrolândia-Trombudo Central	Rodovia reabilitada	km	9,13	0,00	0,00	%	300.000,00	0,00	0,00	%	Em andamento
530001	015454	2024OE000048 Supervisão + obras de duplicação e restauração aum. capac. da SC-445 em Içara	Rodovia reabilitada	km	2,51	1,36	54,23	%	4.700.000,00	3.500.632,05	74,48	%	Atrasado
530001	015455	2024OE001653 Supervisão + obras de reab. aum. capac. rod. SC-108 entre Cricipuma-Urussanga-Cocal do Sul	Rodovia reabilitada	km	16,42	0,32	1,97	%	9.000.000,00	1.321.127,25	14,68	%	Em andamento



## 2.2.2 Projetos em Andamento do Orçamento de Investimento

Abaixo estão relacionados os 68 projetos cadastrados e atualizados até 31/03/2025 que se encontram nas situações: em andamento, atrasado ou paralisado das unidades gestoras. A coluna “Real. Financeiro” representa o valor financeiro realizado no objeto de execução que a própria unidade gestora informou no SIGEF.

UG	Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico		Real. Financeiro	Status
290005	016011	2024OE000001 Reforma de pisos e instalações Casas de Convivência	Edificação construída ou reformada	unidade	60,00	100,00	166,67	%	276.872,95	Em andamento
290005	016012	2024OE000003 Aquisição de mobiliário para escritório	Edificação construída ou reformada	unidade	40,00	95,00	237,50	%	31.665,00	Em andamento
290005	016012	2024OE000020 Execução de pavimentação com blocos intertravados	Edificação construída ou reformada	unidade	80,00	100,00	125,00	%	2.018.244,40	Em andamento
290005	016013	2024OE000007 Aquisição de datacenter modular	Sistema mantido	unidade	95,00	100,00	105,26	%	2.899.000,00	Em andamento
290005	016013	2024OE000008 Aquisição de servidores de rede e plataforma de armazenament	Sistema mantido	unidade	98,00	100,00	102,04	%	4.520.600,00	Em andamento
290005	016013	2024OE000009 Atualização de Softwares de VMS e Vídeo Analítico	Sistema mantido	unidade	80,00	65,00	81,25	%	315.150,00	Em andamento
290005	016013	2024OE000010 Atualização de Software de Controle de Acesso	Sistema mantido	unidade	20,00	60,00	300,00	%	58.400,00	Em andamento
290005	016013	2024OE000011 Aquisição de equipamentos para rede de dados	Sistema mantido	unidade	50,00	100,00	200,00	%	269.372,38	Em andamento
290005	016013	2024OE000012 Aquisição de equipamentos de rede óptica e CFTV	Sistema mantido	unidade	10,00	100,00	1.000,00	%	393.840,00	Em andamento
290005	016015	2024OE000014 Instalação de sistema de geração fotovoltaico	Rede elétrica adequada	m	90,00	100,00	111,11	%	1.666.742,19	Em andamento
290005	016015	2024OE000016 Aquisição de nobreaks e bancos de baterias	Rede elétrica adequada	m	30,00	57,00	190,00	%	33.180,00	Em andamento
290005	016020	2024OE000018 Recuperação e reforço estrutural do Cais 3	Obra executada	unidade	50,00	5,00	10,00	%	2.308.315,30	Em andamento
290005	016020	2024OE000019 Fiscalização da obra de recuperação e reforço do Cais 3	Obra executada	unidade	50,00	100,00	200,00	%	1.169.501,96	Em andamento
290006	016005	2024OE000005 Aquisição de Infraestrutura lógica para alfandegamento do TGSFS-CFTV	Sistema mantido	unidade	100,00	100,00	100,00	%	9.223.520,66	Em andamento
290006	016005	2024OE000010 Aquisição de data center e back up	Sistema mantido	unidade	100,00	75,40	75,40	%	8.840.940,78	Em andamento
290006	016005	2024OE000011 Aquisição de estrutura interna de rede	Sistema mantido	unidade	100,00	100,00	100,00	%	1.100.000,00	Em andamento
290006	016007	2024OE000012 Aquisição de máquina pá carregadeira para movimentações de vagões	Equipamento adquirido	unidade	100,00	100,00	100,00	%	1.090.800,00	Em andamento
290006	016009	2024OE000008 Aquisição de móveis para escritório da SCPAR PSFS	Unidade mobiliada e equipada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	74.482,59	Em andamento
290006	016010	2024OE000003 Pavimentação da área operacional	Unidade construída, ampliada ou reformada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	1.770.405,95	Em andamento
410021	014184	2024OE000005 Construção de usinas hidrelétricas para geração de energia.	Usina construída	unidade	25,00	25,00	100,00	%	27.035.312,38	Em andamento
410021	014185	2024OE000003 Execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento	Projeto implantado	unidade	25,00	25,00	100,00	%	1.100.000,00	Em andamento
410021	014186	2024OE000006 Execução de melhorias em usinas hidrelétricas	Usina melhorada	unidade	25,00	25,00	100,00	%	3.337.171,20	Em andamento
410021	014187	2024OE000004 Manutenção preventiva e corretiva em usinas hidrelétricas	Usina mantida	unidade	12,00	12,00	100,00	%	3.678.997,60	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

410021	014189	2024OE000001	Aquisição de veículos para operações da Celsc Geração	Veículo adquirido	unidade	25,00	0,00	0,00	%	0,00	Em andamento
410021	014191	2024OE000002	Aquisição e atualização do software de tecnologia da informação	Software contratado	unidade	25,00	32,61	130,44	%	4.990,26	Em andamento
410021	015724	2024OE000007	Apropriação de mão de obra	Usina ampliada	%	8,00	2,02	25,25	%	709.963,28	Em andamento
410022	000159	2024OE000003	Aquisição de equipamentos para medição elétrica em unidades consumidoras	Medidor instalado	unidade	160.396,00	377.302,00	235,23	%	14.313.219,33	Em andamento
410022	000281	2024OE000027	Execução de projetos de eficiência energética para consumidores	Energia economizada	MWh/ano	9.228,00	6.365,05	68,98	%	30.396.565,98	Em andamento
410022	000526	2024OE000016	Construção de subestação de alta tensão	Subestação construída	unidade	26,09	13,04	49,98	%	68.643.272,39	Em andamento
410022	000550	2024OE000018	Execução de melhorias e manutenção em subestações de alta tensão	Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade	ponto	403,00	336,00	83,37	%	5.362.702,43	Em andamento
410022	000583	2024OE000017	Ampliação de subestação de alta tensão	Subestação ampliada	unidade	44,44	25,93	58,35	%	67.768.581,48	Em andamento
410022	000599	2024OE000028	Construção de linha de transmissão de alta tensão	Linha construída	km	16,98	15,58	91,76	%	113.447.524,93	Em andamento
410022	000744	2024OE000020	Ampliação de redes de distribuição de energia elétrica em áreas urbanas e rurais	Rede de distribuição urbana ampliada	unidade	23,47	29,83	127,10	%	173.968.226,30	Em andamento
410022	000790	2024OE000015	Execução de melhorias e manutenção em linha de transmissão de alta tensão	Linha de alta tensão mantida	km	634,00	302,60	47,73	%	3.168.922,17	Em andamento
410022	000797	2024OE000023	Execução de manutenção preventiva e corretiva em redes de distribuição	Rede de distribuição mantida	unidade	26.950,00	31.729,00	117,73	%	100.165.249,64	Em andamento
410022	000812	2024OE000021	Execução de melhorias em redes de distribuição de energia elétrica	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	22,60	24,51	108,45	%	119.577.840,25	Em andamento
410022	000922	2024OE000019	Construção de alimentadores de energia elétrica para redes de distribuição	Alimentador de distribuição construído	km	22,60	24,41	108,01	%	62.305.500,45	Em andamento
410022	000923	2024OE000022	Aquisição de equipamentos especiais e acessórios para redes elétricas	Equipamento e material adquirido	unidade	25,37	13,64	53,76	%	14.817.280,75	Em andamento
410022	000941	2024OE000013	Aquisição de veículos para operações da Celsc	Veículo adquirido	unidade	32,56	45,35	139,28	%	20.670.968,94	Em andamento
410022	000949	2024OE000026	Execução de pesquisa e desenvolvimento para inovação no setor elétrico	Programa gerenciado	unidade	20,88	26,37	126,29	%	22.337.604,20	Em andamento
410022	000952	2024OE000014	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para modernização operacional	Equipamento adquirido	unidade	33,13	28,25	85,27	%	75.290.625,56	Em andamento
410022	001573	2024OE000024	Implantação de um sistema de telecomunicação de dados e rádio em operações elétricas	Sistema implantado	unidade	22,39	24,18	107,99	%	11.130.055,55	Em andamento
410022	014193	2024OE000005	Aquisição de equipamentos para ramais de entrada em instalações elétricas	Cabos adquiridos	m	787.600,00	885.200,00	112,39	%	4.685.275,54	Em andamento
410022	014194	2024OE000006	Execução de serviço de ligação para novas unidades consumidoras	Unidade comercial	unidade	93.538,00	70.936,58	75,84	%	13.536.043,30	Em andamento
410022	014195	2024OE000007	Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos para a área comercial	Equipamento adquirido	unidade	76,00	360,00	473,68	%	571.884,43	Em andamento
410022	014196	2024OE000012	Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos para a área de distribuição	Equipamento adquirido	unidade	23,38	55,01	235,29	%	3.376.839,36	Em andamento
410022	014197	2024OE000011	Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos	Equipamento adquirido	unidade	34,78	221,30	636,29	%	8.063.963,83	Em andamento
410022	014786	2024OE000029	Apropriação de mão de obra	Rede de distribuição ampliada	%	8,14	7,46	91,65	%	71.302.352,11	Em andamento
410022	014798	2024OE000010	Elaboração de projetos de combate a perdas de energia elétrica	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	29,08	6,90	23,73	%	1.107.274,19	Em andamento
410022	015077	2024OE000002	Elaboração de projeto de telemedicação para consumidores do Grupo B - Rede Inteligente	Programa gerenciado	unidade	29,65	13,91	46,91	%	18.416.138,34	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

410022	015078	2024OE000025	Contratação de licenciamento ambiental para projetos de infraestrutura	Meio ambiente preservado	unidade	29,00	13,00	44,83	%	104.253,08	Em andamento
410022	015761	2024OE000008	Pagamento de diárias para execução de projetos de investimentos	Serviço realizado	unidade	2.230,00	1.851,00	83,00	%	1.132.739,34	Em andamento
410022	015861	2024OE000009	Contratação de serviços de frete para obras da Celesc	Frete contratado	km	245.250,00	337.994,00	137,82	%	1.700.889,15	Em andamento
410025	013057	2024OE000070	Investimentos em estruturas de distribuição de água tratada	Obra executada	unidade	25,00	25,00	100,00	%	204.693.147,81	Em andamento
410025	014725	2024OE000068	Investimentos em estruturas de captações de água bruta	Obra executada	unidade	25,00	25,00	100,00	%	18.262.627,81	Em andamento
410025	014727	2024OE000069	Investimentos em estruturas de estações de tratamento de água	Obra executada	unidade	25,00	25,00	100,00	%	68.177.298,37	Em andamento
410025	014731	2024OE000072	Investimentos em estruturas de estações de tratamento de esg	Obra executada	unidade	25,00	25,00	100,00	%	162.065.891,80	Em andamento
410025	015793	2024OE000071	Investimentos em estruturas de coleta de esgoto	Obra executada	unidade	25,00	25,00	100,00	%	149.233.737,43	Em andamento
410025	015794	2024OE000073	Investimentos em estruturas de destinação final dos efluente	Obra executada	unidade	25,00	25,00	100,00	%	6.230.539,95	Em andamento
410025	015795	2024OE000075	Investimentos em melhorias e adequações de natureza administ	Programa implantado	unidade	25,00	25,00	100,00	%	2.891.794,07	Em andamento
410025	015796	2024OE000076	Investimentos em melhorias e adequações de natureza operacio	Programa implantado	unidade	25,00	25,00	100,00	%	1.592.433,89	Em andamento
410025	015797	2024OE000074	Investimentos em melhorias e adequações de natureza comercia	Programa implantado	unidade	25,00	25,00	100,00	%	20.344,35	Em andamento
410028	011510	2024OE000001	Ligações de novos clientes e pequenas extensões de rede	Rede de distribuição de gás natural	km	27,00	27,00	100,00	%	10.337.505,00	Em andamento
410028	013502	2024OE000002	Expansão de rede de distribuição de gás natural - projeto Serra Catarinense	Rede de distribuição de gás natural	km	100,00	87,00	87,00	%	22.091.652,00	Em andamento
410028	013508	2024OE000003	Extensões de rede de gás natural - outros projetos	Rede de distribuição de gás natural	km	13,00	88,00	676,92	%	11.173.589,00	Em andamento
410028	014744	2024OE000006	Expansão de rede de distribuição de gás natural - redes isoladas	Rede de distribuição de gás natural	km	4,00	76,00	1.900,00	%	3.252.184,00	Em andamento
410028	014745	2024OE000004	Expansão de rede de distribuição de gás natural - projetos urbanos	Rede de distribuição de gás natural	km	31,00	184,00	593,55	%	27.327.537,00	Em andamento
410028	015409	2024OE000005	Extensão de rede de gás natural - projetos operação	Rede de distribuição de gás natural	km	31,00	22,00	70,97	%	6.287.714,00	Em andamento

O presente relatório informou o valor de **R\$ 431.866.339,68** na conservação do patrimônio público no ano de 2024 e o total empenhado em subações de projetos do orçamento fiscal e de seguridade social no valor de **R\$ 213.822.454,82** e no orçamento de investimentos o valor de **R\$ 1.794.927.258,38**.



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **RAO30I40**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**CLEVERSON SIEWERT** (CPF: 017.XXX.629-XX) em 15/04/2025 às 14:08:08

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 18:34:16 e válido até 02/01/2123 - 18:34:16.

(Assinatura do sistema)



**JORGINHO DOS SANTOS MELLO** (CPF: 250.XXX.199-XX) em 15/04/2025 às 16:29:49

Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/04/2023 - 11:54:30 e válido até 14/04/2123 - 11:54:30.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMDU0MTJfNTQzMl8yMDI1X1JBTzMwSTQw> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00005412/2025** e o código **RAO30I40** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
