

MONITORAMENTO DAS DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OS PROJETOS EM ANDAMENTO

EM ATENDIMENTO AO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

EXERCÍCIO LDO 2024

A Conservação do Patrimônio Público Estadual e Projetos em Andamento

GOVERNADOR DO ESTADO

Jorginho Mello

VICE-GOVERNADORA DO ESTADO

Marilisa Boehm

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Cleverson Siewert

SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA

Augusto Puhl Piazza

DIRETORA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mayana Dos Anjos Damiani

COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO

Diretoria de Planejamento Orçamentário – Secretaria de Estado da Fazenda

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Gerência de Elaboração e Acompanhamento do Orçamento

Sandro Luis Barbosa
Giuliano Silveira Martins
Roberto Fialho
Rosi Mari Ramos de Oliveira

INFORMAÇÕES

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Planejamento Orçamentário
Gerência de Elaboração e Acompanhamento do Orçamento - GEORC
georc@sef.sc.gov.br (48) 3665-2804

Centro Administrativo do Governo
Rodovia SC-401, nº 4.600 – Km 5 – Saco Grande II – Florianópolis – SC



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
1. DESPESAS COM À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL	6
1.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELACIONADA À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10
1.1.1 Despesas Liquidadas por Classificação	10
1.1.2 VALOR MÉDIO DE APLICAÇÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS	11
1.1.3 Evolução das despesas com manutenção e conservação 2018 a 2022	12
1.1.4 Despesas liquidadas por função de governo	13
1.1.5 Percentual de Aplicação por Função de Governo	14
1.1.6 despesas executadas por Unidade Gestora	15
1.1.7 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO por UNIDADE GESTORA	16
2. PROJETOS EM ANDAMENTO	17
2.1 MONITORAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO	18
2.1.1 Situação dos projetos em andamento	18
2.2 DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO	19
2.2.1 Projetos em Andamento do Orçamento Fiscal e Seguridade Social	19
2.2.2 Projetos em Andamento do Orçamento de Investimento	42



APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem como objetivo demonstrar o andamento dos projetos atuais e a contemplação das despesas de conservação do patrimônio público, em atendimento ao Art. 45 disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:

Art. 45. Observado o disposto no § 5º do art. 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação.

Para melhor análise o demonstrativo foi dividido em duas partes: uma relacionada especificamente à conservação do patrimônio público estadual e outra relacionada aos projetos em andamento.

Além de encaminhar para a Assembleia Legislativa do Estado, será dado a este estudo ampla publicidade, com a disponibilização no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda, bem como será remetido para os Órgãos e Entidades do Poder Executivo, para conhecimento e observância na elaboração da proposta orçamentária de 2024.



1. DESPESAS COM À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL

Para efeito do atendimento ao art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o entendimento do conceito de conservação do patrimônio público é o mesmo preconizado na ABNT NBR 5674:1999, que textualmente assim o define:

São as atividades que visam preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. Incluem todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho ou para atualizá-las às necessidades dos seus usuários. Não incluem os serviços realizados para alterar o uso das edificações, bem como aqueles que visem tão somente manter as edificações limpas e vigiadas.

A partir do conceito de conservação do patrimônio público, foi realizada uma detalhada análise do Decreto nº 1.323 - Classificação da Despesa Pública, de 21/12/2012, com a finalidade de identificar quais despesas públicas estão diretamente relacionadas ao conceito de conservação do patrimônio público. A análise resultou na identificação das seguintes classificações da despesa pública: Classificação se refere ao subelemento de despesa.

Classificação	Nome Classificação	Descrição Classificação
339030-24 339130-24 449030-24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de qualquer bem público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, biombos, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, carpetes, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, cortinas, curvas, divisórias removíveis, esquadrias, estrados, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, persianas, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tapetes, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins.
339030-25 339130-25 449030-25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Registra o valor das despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes para aplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como: base para mastros, cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado, esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogão, margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição para instrumentos musicais e afins.
339030-26 339130-26 449030-26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: abajur, benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, chuveiro ou duchas elétricas, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminária, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, quebra-luz (luminária de mesa), reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomadas de corrente, torneira elétrica e afins.
339030-32 339130-32 449030-32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais empregados na manutenção e reparo de aeronaves, tais como: acessórios, peças de reposição de aeronaves, sobressalentes e afins.



Classificação	Nome Classificação	Descrição Classificação
339030-34 339130-34 449030-34	SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	Registra o valor das despesas com a aquisição de material utilizado na manutenção e reparo de máquinas e motores de navios, inclusive da esquadra e de embarcações em geral.
339030-37 339130-37 449030-37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	Registra o valor das despesas com a aquisição de material utilizado na manutenção e reparo de armamento, tais como: material de manutenção e armamento, peças de reposição e afins.
339030-38 339130-38 449030-38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	Registra o valor das despesas com as peças de reposição de radares e sistema de comunicação.
339030-39 339130-39 449030-39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifão, colar de embreagem, condensador, platinado, correias, disco de embreagem, ignição junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, pára-brisa, pára-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvulas da marcha lenta e termostática, refrigeração, injeção eletrônica e câmbio, central eletrônicas, velas, e afins.
339030-51 339130-51 449030-51	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição em bens de uso comum do povo, tais como: estradas, rodovias, pontes, praças, ciclovias, ferrovias e afins.
339036-18 449036-18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos revisões e adaptações, tais como: máquinas e equipamentos de processamento de dados e periféricos, máquinas e equipamentos gráficos, aparelhos de fax, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, máquinas de escrever e afins.
339036-20 449036-20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura e afins.
339036-21 449036-21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.
339036-22 449036-22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pedreiro, carpinteiro e serralheiro, pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris e afins.
339036-89 449036-89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES – SERVIÇO EXTERIOR	Registra o valor das despesas com serviços utilizados a manutenção de embaixadas, consulados, vice-consulados, missões diplomáticas e outras repartições sediadas no exterior.



Classificação	Nome Classificação	Descrição Classificação
339037-04 449037-04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com a locação de mão-de-obra para efetuar reparos e reformas de imóveis em geral, instalações, elétricas, hidráulicas e correlatas desde que o contrato especifique o quantitativo físico de pessoal a ser utilizado.
339037-06 449037-06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Registra o valor das despesas com a manutenção de bens móveis, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.
339039-08 339139-08 449039-08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (Classificação até 31/12/2017)	Registra o valor das despesas com os serviços, atualização e adaptação de software, suporte técnico, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar novas funções, aumento da capacidade de processamento, novas funções e manutenção de software.
339039-16 339139-16 449039-16	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com os reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, limpeza de fossa e afins.
339039-17 339139-17 449039-17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Registra o valor das despesas com os reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos, aparelhos de fax e telex, elevadores, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança, equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas de escrever, turbinas e afins.
339039-19 339139-19 449039-19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.
339039-20 339139-20 449039-20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões, reformas e adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.
339039-21 339139-21 449039-21	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, recuperação, reforma, manutenção, adaptação e conservação de obras de infraestrutura.
339039-24 339139-24 449039-24	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	Registra o valor das despesas com os serviços prestados para confecção, manutenção e instalação de placas, fixas e banners de sinalização visual e de trânsito, identificação, endereçamento e afins.
339039-89 339139-89 449039-89	MANUTENÇÃO DEREPARTIÇÕES DE SERVIÇOS NO EXTERIOR	Registra o valor das despesas com os serviços utilizados na manutenção de embaixadas, consulados, vice-consulados, missões diplomáticas e outras repartições sediadas no exterior.
339039-93	MANUTENÇÃO DE PALÁCIOS	Registra o valor das despesas com a manutenção de palácios governamentais (residência e despacho).



Classificação	Nome Classificação	Descrição Classificação
339139-93 449039-93		
339039-95 339139-95 449039-95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação até 31/12/2017)	Registra o valor das despesas com os serviços, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados – <i>hardware</i> .
339040-08 339140-08 449040-08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	Registra o valor das despesas com os serviços, atualização e adaptação de softwares, suporte técnico, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar novas funções, aumento da capacidade de processamento, novas funções e manutenção de softwares.
339040-95 339140-95 449040-95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	Registra o valor das despesas com os serviços, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados - <i>hardware</i> .

Fonte: Decreto nº 1.323- Classificação da Despesa Pública de 21/12/2012.

Com base na tabela, foi realizada uma busca por classificação de despesas na execução orçamentária do período de 2018 a 2022 com a finalidade de identificar as despesas dos órgãos do poder executivo relacionadas à conservação do patrimônio público, conforme apresentado a seguir.



1.1 Execução Orçamentária Relacionada à Conservação do Patrimônio Público

1.1.1 DESPESAS LIQUIDADAS POR CLASSIFICAÇÃO

Os valores informados representam a execução do período de 2018 a 2022 além de informar a média executada dos últimos 5 anos.

Classificação	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	1.763.647,66	2.185.119,24	4.634.935,68	884.755,99	1.305.722,44	10.774.181,01
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	27.361.652,43	26.888.816,91	22.929.255,39	27.661.168,44	33.080.137,30	137.921.030,47
Manut.Conserv.Bens Móveis Outr.Naturezas	56.228,65	0,00	2.900,00	9.450,00	20.970,00	89.548,65
Manutenção de Palácios	1.266.684,84	958.024,02	954.912,74	1.918.764,28	2.428.437,03	7.526.822,91
Manutenção de Repartições-Serv. Exterior				0,00		0,00
Manutenção de Software	21.356.426,73	26.456.715,26	23.482.488,15	31.892.571,46	44.554.888,71	147.743.090,31
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.853.250,80	5.893.288,43	5.355.660,18	6.654.252,20	8.313.050,90	31.069.502,51
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.712,00	6.386,60	1.981,53	16.000,00	650,00	30.730,13
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.615,00	6.812,70	7.791,00	3.780,00	170.894,98	194.893,68
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	1.824.592,37	1.778.844,07	3.942.096,18	3.868.311,74	3.665.845,38	15.079.689,74
Manutenção e Conservação de Veículos	7.934.231,20	7.326.679,02	6.486.401,63	7.309.416,10	9.255.815,47	38.312.543,42
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	2.252.189,19	4.017.712,93	3.671.193,72	12.134.578,50	8.222.710,60	30.298.384,94
Material Elétrico e Eletrônico	3.118.485,58	2.763.503,60	1.411.441,37	5.188.259,83	7.221.877,11	19.703.567,49
Material para Manutenção de Bens Imóveis	8.679.490,42	7.969.064,82	7.134.593,31	13.607.854,80	24.683.717,77	62.074.721,12
Material para Manutenção de Bens Móveis	3.655.458,02	3.298.943,06	3.315.371,93	3.680.966,37	5.279.240,11	19.229.979,49
Material para Manutenção de Veículos	12.021.270,74	12.522.021,08	10.578.375,08	10.168.217,79	15.549.389,86	60.839.274,55
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32.129.876,66	31.417.890,09	38.218.613,77	109.654.172,33	411.393.725,72	622.814.278,57
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	4.546.690,83	16.349.059,47	22.174.528,37	25.591.693,35	25.156.262,05	93.818.234,07
Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	206.513,89	223.402,35	136.953,64	662.358,71	31.153.855,89	32.383.084,48
Sobressalentes de Armamento	173,30	28.805,44	61.907,14	36.143,90	36.706,01	163.735,79
Sobressalentes de Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	44.187,14	152.042,14	84.688,06	16.230,27	0,00	297.147,61
Suprimento de Aviação	3.475.287,57	3.075.121,39	2.100.729,85	4.536.859,20	5.019.370,74	18.207.368,75
Suprimento de Proteção ao Voo	3.420,00					3.420,00
Total	136.561.085,02	153.318.252,62	156.686.818,72	265.495.805,26	636.513.268,07	1.348.575.229,69




1.1.2 VALOR MÉDIO DE APLICAÇÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Classificação	Média por ano	% médio 2018 a 2022
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	2.154.836,20	0,80%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	27.584.206,09	10,23%
Manut.Conserv.Bens Móveis Outr.Naturezas	17.909,73	0,01%
Manutenção de Palácios	1.505.364,58	0,56%
Manutenção de Repartições-Serv. Exterior	0,00	0,00%
Manutenção de Software	29.548.618,06	10,96%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.213.900,50	2,30%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.146,03	0,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos	38.978,74	0,01%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.015.937,95	1,12%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.662.508,68	2,84%
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	6.059.676,99	2,25%
Material Elétrico e Eletrônico	3.940.713,50	1,46%
Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.414.944,22	4,60%
Material para Manutenção de Bens Móveis	3.845.995,90	1,43%
Material para Manutenção de Veículos	12.167.854,91	4,51%
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	124.562.855,71	46,18%
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	18.763.646,81	6,96%
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	6.476.616,90	2,40%
Sobressalentes de Armamento	32.747,16	0,01%
Sobressalentes de Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	59.429,52	0,02%
Suprimento de Aviação	3.641.473,75	1,35%
Suprimento de Proteção ao Voo	3.420,00	0,00%
Total	269.715.045,94	100,00%



VALOR MÉDIO DE APLICAÇÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS

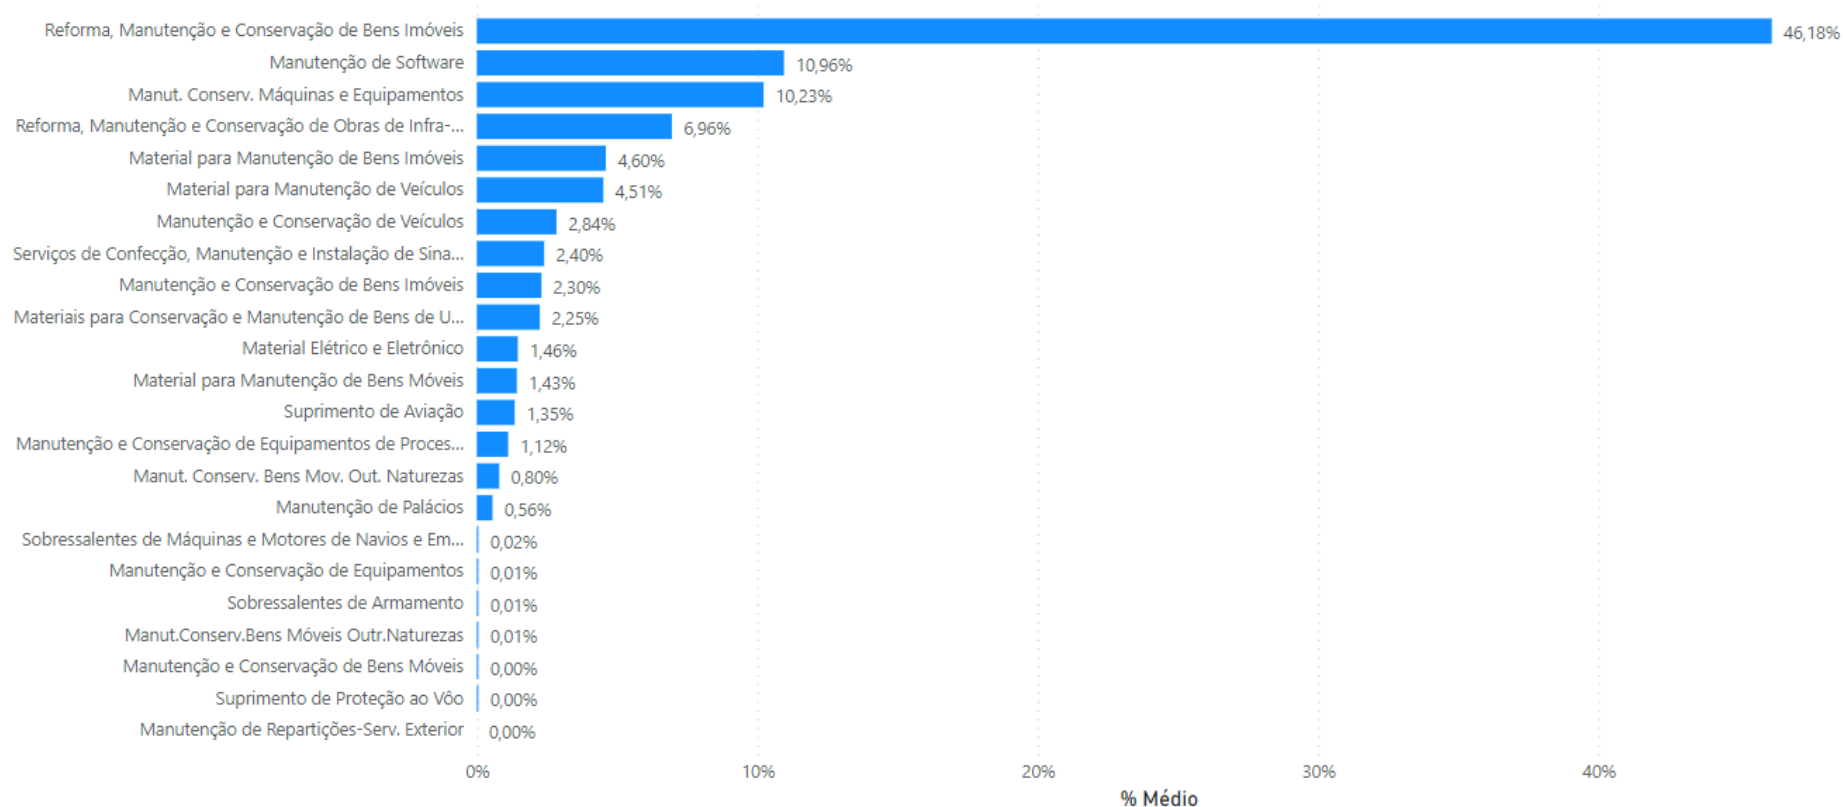


Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



1.1.3 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2018 A 2022

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

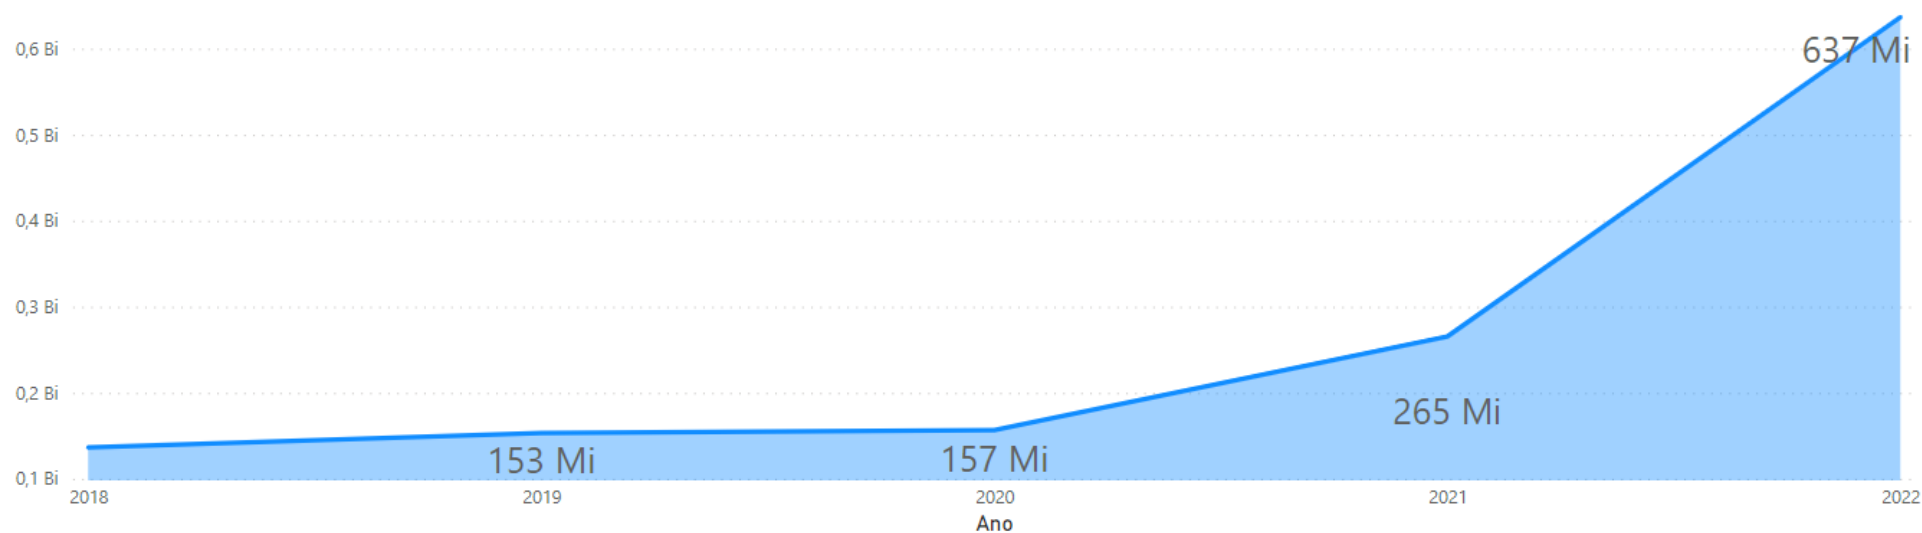

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2023.



1.1.4 DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Os valores informados representam a execução, por função, do período de 2018 a 2022.

Função	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Administração	20.457.448,94	19.657.418,07	20.165.975,30	27.426.601,81	41.644.938,16	129.352.382,28
Agricultura	4.840.983,01	5.082.111,96	5.174.419,70	8.499.084,60	10.730.988,80	34.327.588,07
Assistência Social	64.385,99	130.599,05	39.392,66	116.615,53	120.685,29	471.678,52
Ciência e Tecnologia	1.741.012,67	1.371.757,10	308.020,11	364.386,68	116.337,66	3.901.514,22
Comércio e Serviços	607.494,58	782.396,65	657.662,12	922.996,59	1.025.689,47	3.996.239,41
Comunicações	16.927,59	9.533,00				26.460,59
Cultura	2.109.080,73	1.568.254,38	971.216,23	2.833.580,83	3.331.792,06	10.813.924,23
Desporto e Lazer	37.958,15	28.425,40		25.738,01		92.121,56
Direitos da Cidadania	7.169.142,36	5.615.532,13	6.594.434,12	16.850.400,10	21.846.059,40	58.075.568,11
Educação	35.504.333,63	34.679.448,95	36.139.581,83	105.232.408,46	415.756.895,30	627.312.668,17
Energia					37.171,98	37.171,98
Essencial à Justiça	1.880.965,99	2.037.848,31	2.141.483,79	2.056.856,18	2.006.798,93	10.123.953,20
Gestão Ambiental	1.240.900,42	3.344.067,06	1.272.961,58	2.275.573,31	4.334.239,17	12.467.741,54
Habitação	28.312,11	50.305,49	25.075,28	31.701,10	23.818,31	159.212,29
Previdência Social	288.560,79	311.247,97	348.054,56	350.805,35	476.566,54	1.775.235,21
Saneamento	430,00					430,00
Saúde	20.414.880,54	23.882.572,46	18.545.072,60	24.031.286,12	32.830.805,91	119.704.617,63
Segurança Pública	34.656.095,88	36.084.746,17	38.931.924,58	37.741.378,83	48.131.624,92	195.545.770,38
Trabalho	137.327,40	70.376,27	23.123,32	12.575,72	29.993,16	273.395,87
Transporte	5.364.844,24	18.611.612,20	25.348.420,94	36.723.816,04	54.068.863,01	140.117.556,43
Total	136.561.085,02	153.318.252,62	156.686.818,72	265.495.805,26	636.513.268,07	1.348.575.229,69

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2023.




Função	Média por ano	% Médio 2018 a 2022
Administração	129.352.382,28	9,59%
Agricultura	34.327.588,07	2,55%
Assistência Social	471.678,52	0,03%
Ciência e Tecnologia	3.901.514,22	0,29%
Comércio e Serviços	3.996.239,41	0,30%
Comunicações	26.460,59	0,00%
Cultura	10.813.924,23	0,80%
Desporto e Lazer	92.121,56	0,01%
Direitos da Cidadania	58.075.568,11	4,31%
Educação	627.312.668,17	46,52%
Energia	37.171,98	0,01%
Essencial à Justiça	10.123.953,20	0,75%
Gestão Ambiental	12.467.741,54	0,92%
Habitação	159.212,29	0,01%
Previdência Social	1.775.235,21	0,13%
Saneamento	430,00	0,00%
Saúde	119.704.617,63	8,88%
Segurança Pública	195.545.770,38	14,50%
Trabalho	273.395,87	0,02%
Transporte	140.117.556,43	10,39%
Total	1.348.575.229,69	100,00%



1.1.5 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO POR FUNÇÃO PERÍODO 2018 A 2022

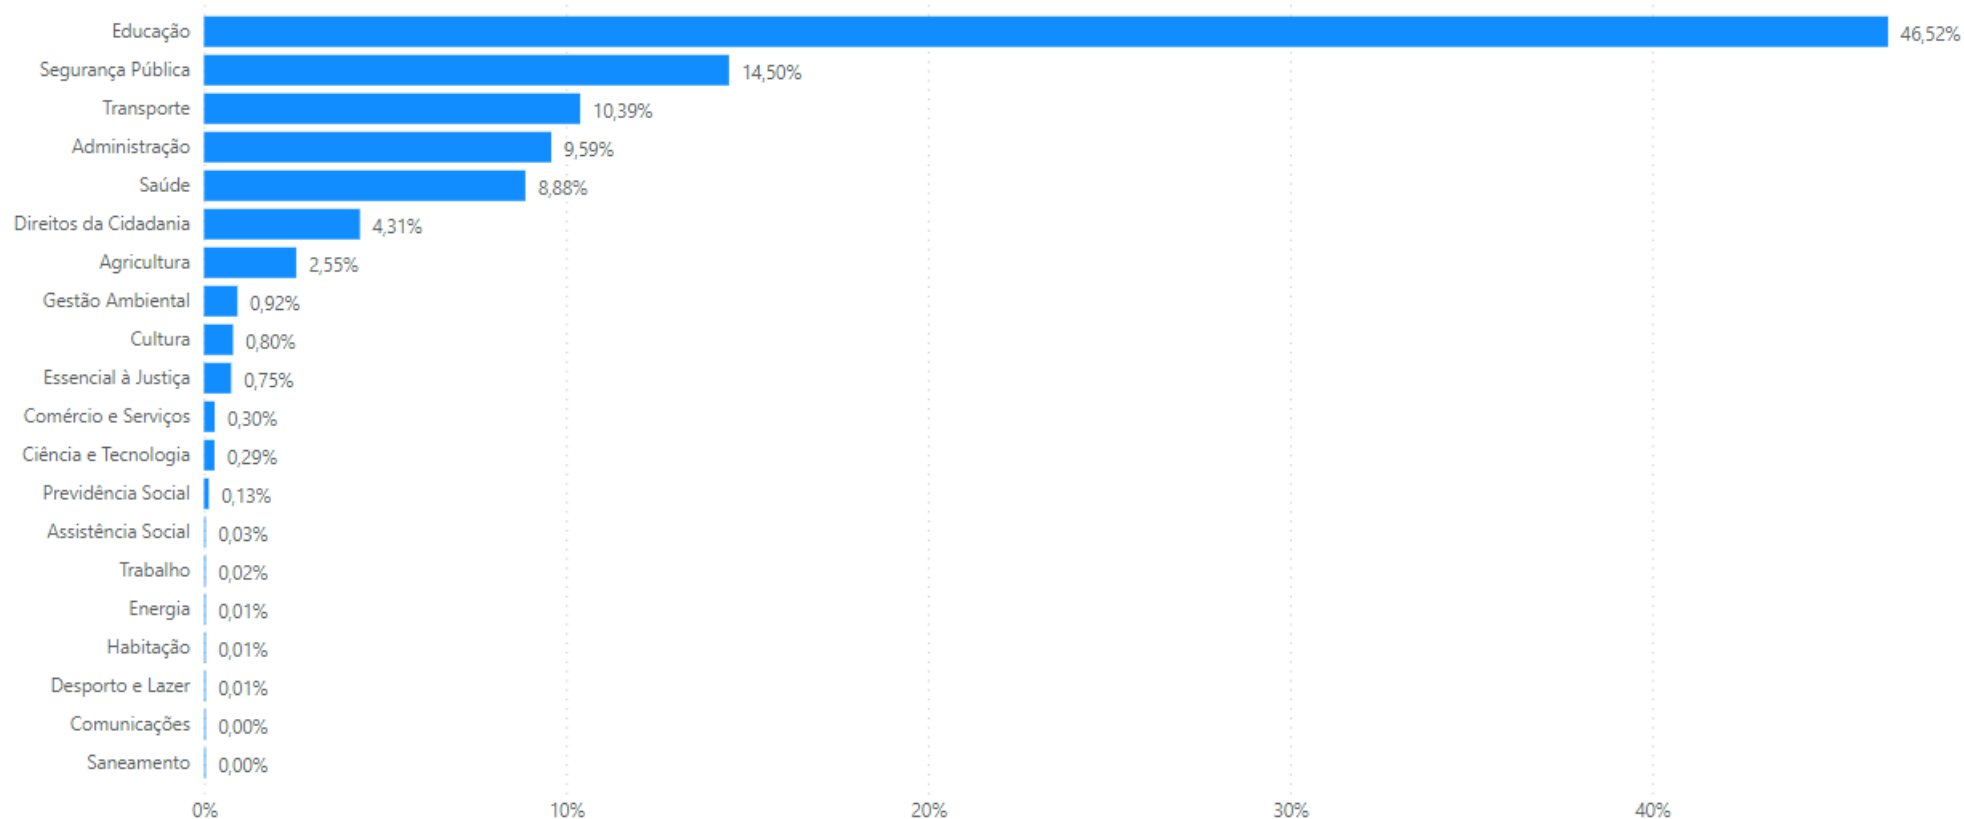

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



1.1.6 DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA


Os valores informados representam a execução, por Unidade Gestora, do período de 2018 a 2022.

Unidades Gestoras	2018	2019	2020	2021	2022	Total
SED	5.253.320,00	19.840.307,19	30.214.982,96	94.404.608,30	403.647.270,74	553.360.489,19
Demais Unidades Gestoras	60.857.905,56	33.585.835,50	27.592.117,81	41.601.374,02	69.027.350,92	232.664.583,81
Secretaria da Infraestrutura	174.288,96	16.339.148,19	25.348.420,94	36.732.273,58	54.073.751,47	132.667.883,14
Fundo de Saúde	18.583.505,62	23.797.492,72	18.383.027,30	22.293.879,94	29.897.005,22	112.954.910,80
Fundo da Polícia Militar	21.260.713,11	23.031.382,33	19.022.263,35	17.860.828,06	23.559.143,02	104.734.329,87
SEF	10.510.919,80	13.724.254,13	15.347.452,88	15.843.856,68	20.876.716,18	76.303.199,67
UDESC	6.429.879,51	7.616.075,34	5.542.950,37	9.904.568,96	10.598.754,99	40.092.229,17
Fundo da Polícia Civil	3.206.027,02	3.832.789,08	5.523.743,81	7.001.843,23	5.621.318,97	25.185.722,11
EPAGRI	4.185.158,57	2.822.972,50	2.803.162,82	5.220.366,24	5.673.189,38	20.704.849,51
CIDASC	1.544.899,39	3.225.662,16	2.311.417,28	3.174.138,37	4.910.680,26	15.166.797,46
Fundo Penit. Chapecó	1.027.621,85	2.363.844,29	1.489.463,59	6.352.505,48	3.213.252,94	14.446.688,15
Fundo do Corpo de Bomb Militar	1.660.751,03	1.220.637,58	966.331,82	3.048.706,22	3.408.035,05	10.304.461,70
Fundo Juríd de Reparcelamento	1.866.094,60	1.917.851,61	2.141.483,79	2.056.856,18	2.006.798,93	9.989.085,11
Total	136.561.085,02	153.318.252,62	156.686.818,72	265.495.805,26	636.513.268,07	1.348.575.229,69

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2023.



1.1.7 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO POR UNIDADE GESTORA

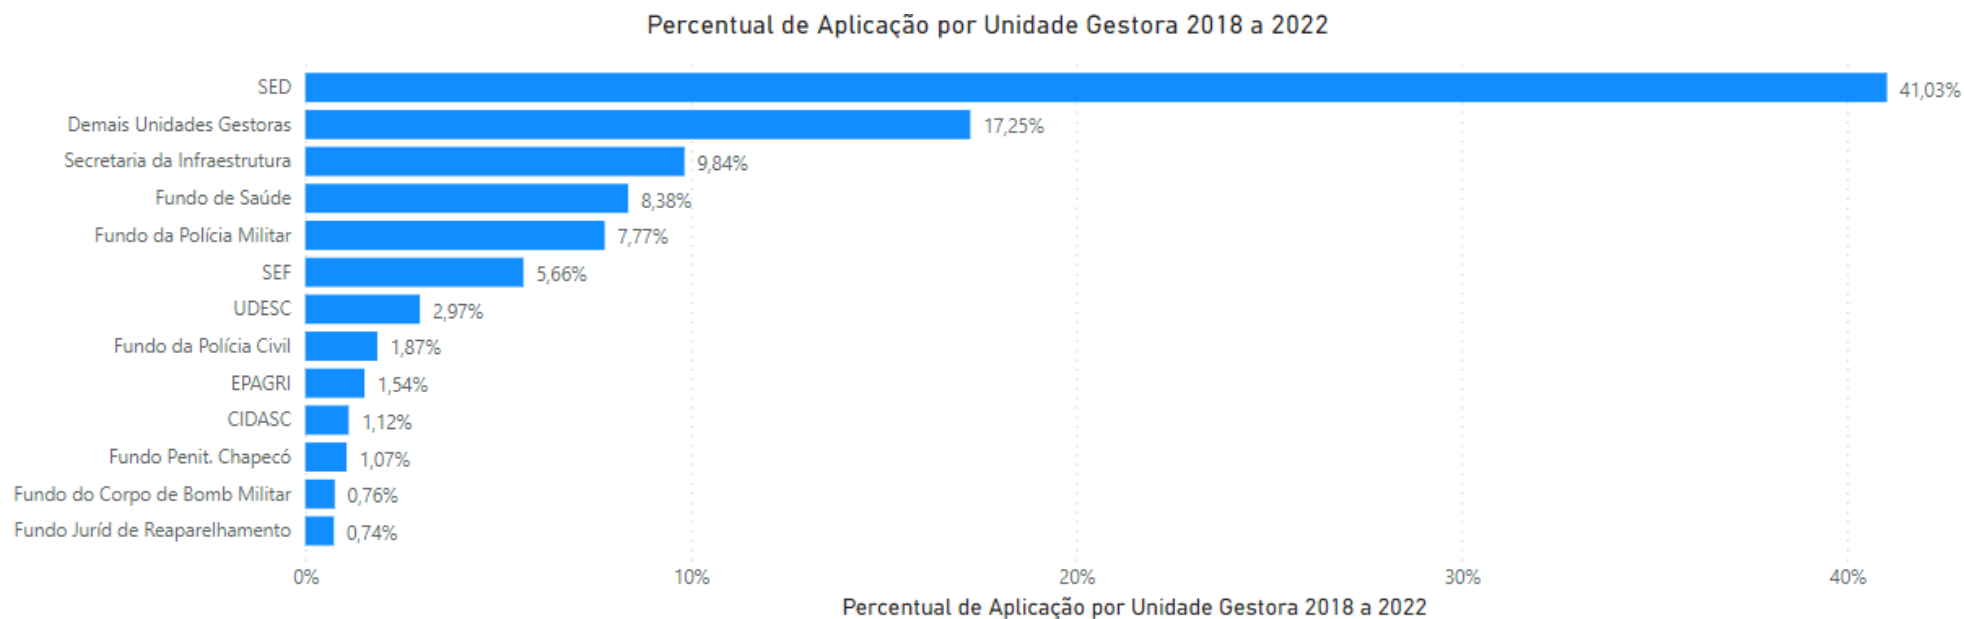

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2023.



2. PROJETOS EM ANDAMENTO

Durante o processo de elaboração do PPA, todas as subações são classificadas em projeto, atividade ou operação especial. Portanto, com base nessa classificação, as subações tipificadas como projeto foram rastreadas na LOA – 2022. Feita a identificação das subações que financiam os projetos, foi possível identificar a situação e o fluxo orçamentário e financeiro de cada projeto. Foram considerados somente os projetos nas seguintes situações: em andamento, atrasado ou paralisado que possuem a previsão de conclusão superior ao mês de janeiro de 2023, conforme apresentado nas próximas páginas. Para demonstrar a situação de cada projeto em andamento, financiado pelas subações orçamentárias classificadas como projeto, foi utilizado o conceito de “objeto de execução”, conforme estabelecido no inciso II do art. 5º do Decreto nº 1.324, de 21 de dezembro de 2012.

Instrumento de programação do produto da subação do qual resulta um bem ou serviço destinado a um público-alvo, ofertado à sociedade ou ao próprio Estado.

Utilizou-se o conceito de objeto de execução, pois as subações orçamentárias em muitos casos são genéricas, como por exemplo: Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares e não possuem a situação (andamento, atrasado, paralisado ou concluído).

As informações dos objetos de execução foram extraídas do Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF e com base nessas informações foi possível verificar individualmente em qual situação encontram-se os projetos em andamento, atrasados ou paralisados até o dia 31/12/2022. Estas informações são de responsabilidade das unidades gestoras e foram consideradas de acordo com os registros no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.


No entanto, cabe ressaltar que é de responsabilidade dos órgãos que compõem a administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual o monitoramento das subações orçamentárias que financiam bens e serviços à sociedade, por meio da programação e execução dos objetos de Execução. Portanto, a veracidade dos dados apresentados a seguir é de responsabilidade de cada unidade gestora.



2.1 Monitoramento dos Projetos em Andamento

2.1.1 SITUAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

Previsão de conclusão dos projetos superior a 01/01/2023. A tabela abaixo relaciona por esfera a situação dos objetos de execução com os respectivos valores liquidados somados os restos não processados pagos em 2023 para as esferas Fiscal e Seguridade Social e valor investido para a esfera de investimento, este último foi informado pela própria unidade gestora no SIGEF.

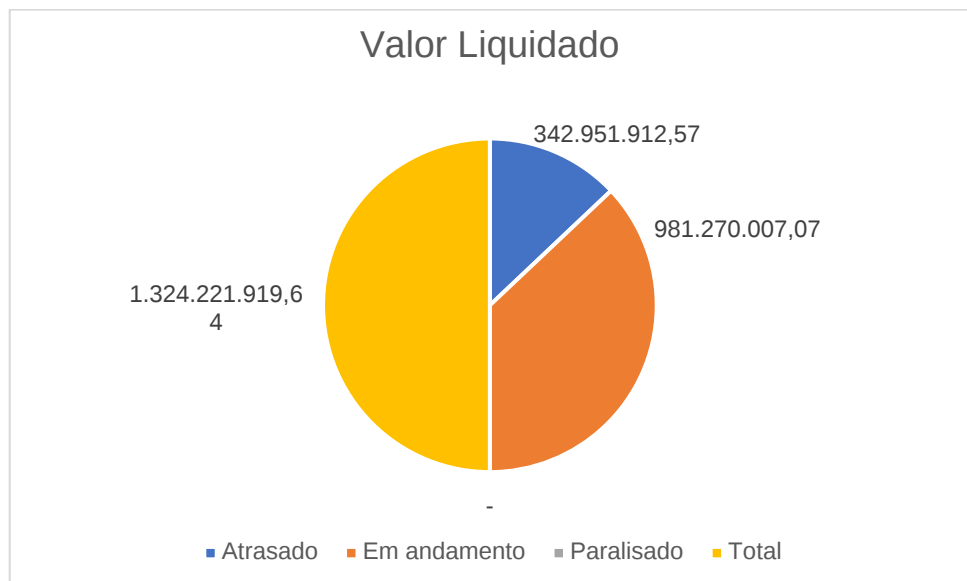

Situação	Valor Liquidado	Qtde Objetos de Execução
Atrasado	342.951.912,57	122
Em andamento	981.270.007,07	457
Paralisado	-	1
Total	1.324.221.919,64	580



2.2 Demonstrativo dos Projetos em Andamento

Segue no demonstrativo os projetos em andamento com previsão de conclusão superior a 01/01/2023. É possível que existam valores com a meta física com percentual próximo a ou igual a 100%, no entanto as situações continuam com o *status* “Em andamento, atrasado ou paralisado”, pois aguardam a finalização do pagamento, nota fiscal ou outro processo administrativo. Após todas as tratativas, o órgão altera o *status* para “Concluído”.

2.2.1 Projetos em Andamento do Orçamento Fiscal e Seguridade Social

Abaixo estão relacionados os projetos cadastrados e atualizados até 31/12/2022 que se encontram nas situações: em andamento, atrasado ou paralisado das unidades gestoras dos orçamentos fiscal e de seguridade social. Na coluna “Liquidado” estão somados os valores liquidados em 2022 e os valores pagos dos restos não processados referente a 2023.

Unidade Gestora	Subação	Objeto Execução	Produto	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Liquidado	IE Financeiro	Status	Atualizado	
160084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	013107	2022OE000030 Aquisição de 04 veículos para o Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial	093 Equipamento e material adquirido	2,00	2,00	100,00	295.350,00	75,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
160084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	014789	2021OE000009 Registra os gastos com recursos de Convênios em Geral	023 Convênio realizado	33,50	33,50	100,00	2.402.272,91	97,10	%	Em andamento	Março/2023
160084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	015028	2022OE000011 Contratação de Projetos de Engenharia e Arquitetura da 7ª DRP de Rio do Sul - Parcela PCI	195 Obra executada	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	011839	2022OE000001 Intervenções em obras, reformas e manutenção predial no CBMSC	322 Obra realizada	3,50	1,00	28,49	2.365.873,03	74,94	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	015382	2022OE000037 Aquisição de materiais e uniformes para Corpo de Bombeiros Militar de SC (Emenda 176/2020)	659 Projeto executado	0,50	0,10	20,86	57.000,00	33,98	%	Atrasado	Dezembro/2022
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	015386	2022OE000062 Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Garopaba	511 Equipamento fornecido	0,89	0,53	59,03	1.000.000,00	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
160091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública	015050	2022OE000064 Elaborar projetos de infraestrutura	248 Projeto elaborado	5,00	0,50	10,00	42.169,62	50,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2022OE000081 Realizar a construção do Quartel da PM de Indaial.	195 Obra executada	0,50	0,31	61,91	200.222,83	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023



160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2022OE000123	Construção do novo quartel da Polícia Militar em Praia Grande	195 Obra executada	0,50	0,12	23,56	566.541,15	99,98	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2022OE000124	Construção do novo quartel da Polícia Militar no município de Passo de Torres	195 Obra executada	0,50	0,14	27,40	419.917,33	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2022OE000133	Construção do novo destacamento padrão PMSC no município de São Martinho	195 Obra executada	0,50	0,01	2,87	93.240,63	44,53	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2022OE000161	Construção do novo grupamento padrão PMSC em Paineal	195 Obra executada	0,30	0,05	17,35	127.149,44	43,85	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2022OE000162	Construção do novo Quartel da PMSC em Balneário Gaivota	195 Obra executada	0,30	0,04	11,74	328.995,63	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2022OE000179	Construção do novo quartel da Polícia Militar em Arabutã	195 Obra executada	0,10	0,00	0,00	128.172,35	46,44	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2022OE000181	Construção do novo quartel da Polícia Militar em Rio das Antas.	195 Obra executada	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2022OE000183	Construção do Sistema de Radiocomunicação VHF padrão DMR TIER III	195 Obra executada	0,10	0,10	100,00	1.237.949,95	100,00	%	Em andamento	Janeiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011837	2021OE000112	Realizar a construção do quartel da Polícia Militar de Indaial	801 Área construída	292,83	179,74	61,38	541.229,18	51,91	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015091	2022OE000141	Fomentar ações do PROERD pela Polícia Militar de Santa Catarina	033 Criança/adolescente atendida	88.304,50	88.304,50	100,00	423.410,90	100,00	%	Em andamento	Março/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000084	Aquisição kit Programa Estadual de Potencialização da PM (Emenda 183/2020)	659 Projeto executado	0,80	0,64	80,03	12.841,00	35,15	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000085	Aquisição kit Programa Estadual de Potencialização da PM (Emenda 1185/2020)	659 Projeto executado	0,81	0,65	80,55	13.044,00	35,68	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000086	Aquisição kit Programa Estadual de Potencialização da PM Ilhota (Emenda 606/2020).	659 Projeto executado	0,80	0,64	80,03	11.527,00	31,51	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000087	Aquisição kit Programa Estadual de Potencialização da PM.Sta Rosa de Lima(Emenda 803/2020)	659 Projeto executado	0,78	0,61	78,48	18.689,24	51,19	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000089	Aquisição kit Programa Estadual de Potencialização da PM (Emenda 607/2020)	659 Projeto executado	0,78	0,61	78,24	23.668,00	64,74	%	Em andamento	Fevereiro/2023



160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000090 Aquisição kit Programa Estadual de Potencialização da PM (Emenda 50/2020)	659 Projeto executado	0,79	0,63	79,25	12.208,00	33,34	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000091 Aquisição kit Programa Estadual de Potencialização da PM (Emenda 77/2020)	659 Projeto executado	0,84	0,71	84,02	66.117,00	52,04	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000092 Aquisição kit Programa Estadual de Potencialização da PM (Emenda 1295/2020)	659 Projeto executado	0,70	0,46	65,87	11.300,00	49,07	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000093 Aquisição kit Programa Estadual de Potencialização da PM (Emenda 836/2020)	659 Projeto executado	0,85	0,72	84,96	11.169,00	63,75	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000131 Auxílio para PMSC aquisição de Kits programa potencialização (Emenda 662/2020)	659 Projeto executado	0,81	0,65	80,67	77.610,48	53,19	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000142 Aquisição de mobiliário para o 12º BPM de Balneário Camboriú (Emenda 355/2019)	659 Projeto executado	0,81	0,66	81,40	4.081,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000143 Aquisição de kits do programa Estadual de Reparelhamento da PM (Emenda 144/2020)	659 Projeto executado	0,78	0,60	77,53	17.739,00	48,67	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000144 Aquisição de kits do programa Estadual de Reparelhamento da PM (Emenda 447/2020)	659 Projeto executado	0,80	0,64	80,44	17.739,00	58,25	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000145 Aquisição de kits do programa Estadual de Reparelhamento da PM (Emenda 879/2020)	659 Projeto executado	0,94	0,88	93,73	16.425,00	86,01	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000146 Aquisição de kits para pelotão de Patrulhamento Tático de Criciúma (Emenda 1284/2020)	659 Projeto executado	0,89	0,79	89,16	14.454,00	34,92	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000148 REAPARELHAMENTO PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO GASPAS (EMENDA 365/2020)	659 Projeto executado	0,89	0,79	89,16	2.628,00	12,74	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000149 AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO - PM COMBATE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FLORIANÓPOLIS (EMENDA 1065/2020)	659 Projeto executado	0,87	0,76	87,03	1.314,00	88,06	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000150 PROJETO REDE CATARINA DE PROTEÇÃO À MULHER - MORRO DA FUMAÇA (EMENDA 593/2020)	659 Projeto executado	0,96	0,92	96,16	5.256,00	88,06	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000151 AQUISIÇÃO DE KIT PROGRAMA ESTADUAL DE REAPARELHAMENTO PM JOINVILLE (EMENDA 842/2020)	659 Projeto executado	0,81	0,65	80,60	13.140,00	63,62	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000152 REAPARELHAMENTO PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO PM JOINVILLE (EMENDA 237/2020)	659 Projeto executado	0,89	0,79	89,16	11.826,00	57,44	%	Em andamento	Fevereiro/2023



160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000153 AQUISIÇÃO DE KITS DA REDE CATARINA DE PROTEÇÃO À MULHER - BLUMENAU (EMENDA 334/2020)	659 Projeto executado	0,81	0,65	80,60	29.565,00	59,92	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000154 REAPARELHAMENTO PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO ITAJAI (EMENDA 168/2020)	659 Projeto executado	0,89	0,79	89,16	9.855,00	47,63	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000155 REAPARELHAMENTO PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO - CAMBORIÚ (EMENDA 171/2020)	659 Projeto executado	0,93	0,87	93,36	4.599,00	22,32	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000156 REAPARELHAMENTO PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ (EMENDA 175/2020)	659 Projeto executado	0,89	0,79	89,16	6.570,00	31,73	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000157 REAPARELHAMENTO PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO - NAVEGANTES (EMENDA 180/2020)	659 Projeto executado	0,89	0,79	89,16	7.884,00	38,28	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000158 REAPARELHAMENTO PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO - SÃO BENTO DO SUL (EMENDA 182/2020)	659 Projeto executado	0,89	0,79	89,16	5.256,00	25,46	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000159 AQUISIÇÃO DE KITS DA REDE CATARINA DE PROTEÇÃO À MULHER - CAPINZAL (EMENDA 649/2020)	659 Projeto executado	0,89	0,79	88,72	11.169,00	83,94	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	015382	2022OE000160 AQUISIÇÃO DE KIT PARA PELOTÃO TÁTICO - FLORIANÓPOLIS (EMENDA 777/2020)	659 Projeto executado	0,89	0,79	89,16	7.884,00	38,12	%	Em andamento	Fevereiro/2023
160099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	015028	2022OE000001 Elaboração dos Projetos da nova sede do Núcleo Regional de Polícia Científica em Videira	195 Obra executada	1,00	0,86	86,30	49.368,05	90,26	%	Atrasado	Janeiro/2023
160099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	015028	2022OE000008 Reforma e ampliação do Setor de Medicina Legal da Polícia Científica em Porto União	195 Obra executada	1,00	0,81	80,85	403.522,81	99,59	%	Atrasado	Janeiro/2023
160099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	015028	2022OE000009 Elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia da Polícia Científica em Chapecó	195 Obra executada	1,00	0,08	8,18	4.297,56	8,18	%	Atrasado	Janeiro/2023
160099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	015028	2022OE000010 Elaboração de Projetos da Edificação da Polícia Científica e Polícia Civil em Criciúma	195 Obra executada	0,57	0,09	16,47	12.275,59	31,04	%	Em andamento	Janeiro/2023
160099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	015028	2022OE000012 Contratação de Projetos de Engenharia e Arquitetura da SRFLN da Capital no Itacorubi	195 Obra executada	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Janeiro/2023
160099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	015028	2022OE000013 Elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia da Polícia Científica em Tubarão	195 Obra executada	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Janeiro/2023
260001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	015218	2022OE000001 Construção de Centro de Acolhimento em Guaramirim - Continuação OE 2020/1 - UG0260096	322 Obra realizada	0,78	0,61	78,18	756.373,45	91,80	%	Atrasado	Dezembro/2022



260001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	015218	2022OE000004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO COM PISCINA TÉRMICA	322 Obra realizada	0,71	0,50	70,73	1.061.027,93	70,74	%	Atrasado	Dezembro/2022
270001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	012987	2022OE000021	Consultoria para mapeamento do ecossistema decência, tecnologia, empreendedorismo e inovação	720 Plano de gestão	1,00	1,00	100,00	352.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	012987	2022OE000032	Limpeza da obra do Centro de Inovação de Brusque	720 Plano de gestão	4,00	4,00	100,00	107.460,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	015080	2022OE000041	Google Workspace	249 Projeto apoiado	0,50	0,25	50,00	248.184,40	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	015386	2022OE000014	Implantação do Parque Industrial no Município de Balneário Gaivota	511 Equipamento fornecido	1,00	1,00	100,00	1.461.143,13	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	015394	2022OE000030	Implantação de Área Industrial no município de Dionísio Cerqueira	511 Equipamento fornecido	1,00	1,00	100,00	3.840.072,00	38,40	%	Em andamento	Dezembro/2022
270032 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	015353	2022OE000004	Aquisição e Instalação do Sistema de Climatização do Centro de Eventos Bal. Camboriú CEBC	349 Centro de evento construído	1,00	0,85	84,58	0,00	0,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270032 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	015354	2022OE000008	Construção do Centro de Atendimento ao Turista de Dionísio Cerqueira	385 Centro construído	0,50	0,50	100,00	23.226,00	45,97	%	Em andamento	Dezembro/2022
270032 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	015356	2022OE000009	Construção do Trapiche na Praia do Embrulho no Município de Bombinhss	204 Projeto de infraestr apoiado	1,00	1,00	100,00	868.570,47	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270032 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	015356	2022OE000010	Construção do Caminho Turístico Vila Canto Grande no Município de Bombinhas	204 Projeto de infraestr apoiado	1,00	1,00	100,00	1.080.937,66	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270032 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	015356	2022OE000012	Apoio Financeiro aos Municípios Catarinenses para Implantação Infraestrutura Turística	204 Projeto de infraestr apoiado	1,00	1,00	100,00	29.124.816,96	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270032 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	015386	2022OE000026	Construção de Centro de Convenções no município de Blumenau.	511 Equipamento fornecido	0,69	0,69	100,00	7.600.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022



Turismo de Santa Catarina

270032 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	015386	2022OE000068 Revitalização do Mirante do Costão das Pedras Brancas e Negras em Barra Velha	511 Equipamento fornecido	1,00	1,00	100,00	250.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270032 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	015386	2022OE000069 Revitalização da Infraestrutura do PARQUE VILA GERMÂNICA - Blumenau	511 Equipamento fornecido	1,00	1,00	100,00	700.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270032 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	015386	2022OE000070 Revitalização do PARQUE ECOLÓGICO Cesino Bernardino em Camboriú	511 Equipamento fornecido	1,00	1,00	100,00	500.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270032 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	015386	2022OE000071 Obras de um Pórtico na entrada da cidade de Itá - SC 154 - Sentido Concórdia - em Itá	511 Equipamento fornecido	1,00	1,00	100,00	206.809,14	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270032 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	015386	2022OE000072 Construção de um Pavilhão para realização de eventos agropecuários em Nova Itaberaba	511 Equipamento fornecido	1,00	1,00	100,00	339.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270032 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	015386	2022OE000073 Construção rest. praça alimentação PARQUE DE EXPOSIÇÕES Rineu Gransotto São Miguel Oeste	511 Equipamento fornecido	1,00	1,00	100,00	455.555,05	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
270095 Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	011681	2022OE000013 Inventário Florístico	249 Projeto apoiado	0,17	0,17	100,00	622.600,19	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
410001 Casa Civil	012753	2022OE000004 Adquirir Equipamentos de Tecnologia da Informação para utilização na Casa Civil	800 Máquina e equip adquirido	366,00	349,97	95,62	470.494,70	49,01	%	Em andamento	Janeiro/2023
410006 Defesa Civil	014918	2022OE000001 Elaboração de projetos para construção de três barragens na bacia do rio Itajaí	195 Obra executada	0,50	0,00	0,05	237.197,44	20,50	%	Em andamento	Dezembro/2022
410006 Defesa Civil	014918	2022OE000002 Execução de obras para construção do canal extravasor na barragem Norte em José Boiteux	195 Obra executada	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
410006 Defesa Civil	014918	2022OE000003 Aquisição e instalação de um sistema de radar meteorológico banda x com dupla polarização	195 Obra executada	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
410092 Fundo Estadual de Defesa Civil	014686	2021OE000006 Elaboração do componente indígena e estudo ambiental na Barragem de José Boiteux	446 Ação realizada	0,09	0,00	4,64	63.742,84	100,00	%	Em andamento	Novembro/2022
440001 Secretaria de Estado da Agricultura,	015382	2022OE000004 Aquisição equipamentos destinados e maquinas agrícolas p/ Santa Catarina (Emenda 1259/20)	659 Projeto executado	0,62	0,38	62,00	166.400,00	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023



Pesca e
Desenvolvimento Rural

440001 Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural	015382	2022OE000005 Aquisição equipamentos destinados e maquinas agrícolas p/ Santa Catarina (Emenda 86/20)	659 Projeto executado	0,85	0,72	85,00	256.400,00	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
440001 Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural	015382	2022OE000006 Aquisição de equipamentos e maquinas agrícolas p/ Municípios Catarinense (Emenda 855/20)	659 Projeto executado	0,44	0,19	44,00	457.600,00	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
440001 Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural	015382	2022OE000014 Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas Município de SC (Emenda 658/2020)	659 Projeto executado	0,50	0,25	50,00	166.760,00	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2020OE000002 Reforma e ampliação - Projetos - das Unidades Escolares do Estado de Santa Catarina.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	180,00	142,20	79,00	3.222.577,08	30,54	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2020OE000073 Reforma da EEB José Matias Zimmermann, município de São José.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,99	98,94	0,00	0,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2020OE000088 Reforma e ampliação da EEB Maria Duarte Vasconcelos - Município de Sangão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Paralisado	Março/2022
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2020OE000216 Reforma e Ampliação da EEB Getúlio Vargas, município de Florianópolis.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,72	71,52	875.570,22	97,29	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2020OE000341 Reforma e ampliação da EEB Araranguá, município de Araranguá.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,47	46,72	792.052,54	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000003 Reforma e Ampliação da EEB Neusa Massolini , município de Xaxim	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,73	72,76	969.256,94	75,03	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000018 Reforma da EEB. Areias de Cima, minlípio de BIGUAÇÚ	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,98	98,10	372.271,82	91,15	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000019 Reforma da EEB Maria de Lourdes Scherer, município de Biguaçú.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,48	47,50	431.879,37	43,49	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000020 Reforma da EEB .Jornalista Jairo Calado, município de Florianópolis.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,61	60,61	994.647,06	65,15	%	Em andamento	Fevereiro/2023



450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000023 Realização serv .de Eng. p/ diagnóstico da estrutura física das Unidades Escolares	147 Escola construída, ampliada ou reformada	500,00	300,00	60,00	1.382.268,37	87,93 %	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000026 Reforma da EEB Rudolfo Luzina , município de Nova Erechim,	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,95	94,77	2.142.348,32	93,26 %	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000030 Reforma e Ampliação da EEB Walter Holthausen, município de Lauro Muller.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,61	61,11	1.890.775,23	87,67 %	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000032 Reforma da EEB Profª Eloisa Maria Prazeres de Faria, município de Biguaçu.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,78	77,62	594.399,33	69,93 %	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000099 Reforma e ampliação da EEB Walter Probst, município de Aurora.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,54	53,54	1.607.616,24	100,00 %	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000109 Reforma e Ampliação da EEB Idelfonso Linhares, município de Florianópolis.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,20	19,65	584.984,85	99,94 %	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000112 Reforma e Ampliação da EEB Alexandre Sergio Godinho, município de Biguaçu.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,72	71,51	1.149.027,31	99,96 %	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000114 Reforma geral na EEB Frei Caneca no município de Lebon Régis.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,76	76,24	1.187.182,22	76,25 %	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000123 Reforma das instalações elétricas da EEB Teresa Martins Brito - Capivari de Baixo	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,97	97,06	84.928,99	93,67 %	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000126 Reforma da EEB Sede Oldenburg - Palmitos	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,83	83,14	1.807.912,06	95,25 %	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000129 Reforma e Ampliação EEB Aderbal Ramos da Silva - Município Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,05	4,90	339.617,27	67,92 %	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000134 Construção de Quadra Poliesportiva - EEM Antônio Knabben - Município: Gravatal	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,54	53,83	1.174.015,01	97,96 %	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000135 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Prof. Tercilio Bastos - Município: Major Gercino	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,10	10,38	244.303,51	100,00 %	Atrasado	Fevereiro/2023



450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000136 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Laércio Caldeira de Andrada - Município São José	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,22	22,38	565.670,59	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000137 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Eng. Annes Gualberto - Município: Imbituba	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,13	13,22	261.688,84	47,71	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000138 Reforma e Ampliação da EEB Profª Tânia Mara Faria e Silva Locks - município Biguaçu	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,18	18,40	593.883,40	98,98	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000139 Reforma e Ampliação da EEB Conêgo Rodolfo Machado - município Biguaçu	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,29	28,51	816.568,88	97,86	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000140 Reforma e Ampliação da EEB Profª Neusa Ostetto Cardoso - município: Araranguá	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,31	31,27	2.262.961,91	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000141 Reforma da EEB Antônio Colonetti - município de Içara	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,69	69,02	1.398.523,72	98,55	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000144 Reforma e Ampliação da EEB Prof. Avelino Muller - Município Biguaçu	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,20	19,73	933.251,18	93,33	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000145 Reforma da EEB Irmã Edviges, município de Criciúma.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,38	38,48	619.212,50	99,87	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000147 Reforma e Ampliação EEB Aníbal Nunes Pires - Município: Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,13	12,83	614.613,27	98,04	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000148 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Potasio Joaquim Cunha - Município: Sombrio	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,24	23,81	548.442,95	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000156 Construção da quadra poliesportiva da EEB Profª Aurea Perpetua Gomes de Blumenau.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000157 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Marcolina Rodrigues da Silva - Município: Chapecó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,56	56,00	1.228.589,66	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000160 Reforma do Ginásio de Esportes da EEB Abel Esteves de Aguiar - município: Praia Grande	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,71	70,91	277.407,86	94,62	%	Em andamento	Fevereiro/2023



450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000172 Construção da quadra da EEB Santo Anjo da Guarda de Tubarão.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,22	21,75	783.906,09	99,93	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000174 Construção da quadra da EB Erwin Radtke de Blumenau.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,01	1,46	309.949,19	88,80	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000175 Construção da quadra da EEB Jurema Cavalazi de Florianópolis.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,12	12,20	419.876,82	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000177 Construção da quadra da EEB Marilda Lenia Araujo de Rancho Queimado.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,09	8,66	383.372,57	99,72	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000182 Contratação de empresa para a quadra EEB Catequista Joana Pendica , de Gravatal.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,05	5,03	214.802,35	54,80	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000184 Construção de Quadra poliesportiva na EEB Cora Batalha da Silveira de Lages	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,11	10,70	318.392,73	82,82	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000186 Construção de Quadra poliesportiva na EEF SÃO Cristóvão Cristóvão de Criciúma.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,17	17,21	695.852,75	98,16	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000187 Construção de Quadra poliesportiva na EEB Leopoldo Koprowsky de Benedito Novo	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,13	12,88	285.505,58	52,06	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000189 Construção de Quadra poliesportiva na EEB João Teixeira Nunes de Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,10	10,02	384.127,66	99,92	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000190 Revitalização das Unidades Escolares de Abrangência da CRE 09 - Videira	147 Escola construída, ampliada ou reformada	20,00	17,13	85,67	1.843.936,21	99,70	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000191 Revitalização das Unidades Escolares de Abrangência da CRE 33 - Seara	147 Escola construída, ampliada ou reformada	18,00	17,95	99,71	3.706.511,87	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000193 Revitalização das Unidades Escolares de Abrangência da CRE 18 Laguna	147 Escola construída, ampliada ou reformada	29,00	23,99	82,74	5.432.055,39	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000197 Revitalização das Unidades Escolares de Abrangência da CRE 03 - São Lourenço do Oeste	147 Escola construída, ampliada ou reformada	8,00	8,00	99,99	4.080.699,97	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023



450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000201 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 30- Dionísio Cerqueira	147 Escola construída, ampliada ou reformada	17,00	16,59	97,60	2.580.593,88	97,60	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000202 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 11 - Curitibanos	147 Escola construída, ampliada ou reformada	13,00	10,51	80,85	2.559.942,36	88,38	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000207 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 31- Itapiranga	147 Escola construída, ampliada ou reformada	14,00	10,89	77,81	2.347.371,57	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000209 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 14 - Ibirama	147 Escola construída, ampliada ou reformada	20,00	19,99	99,95	4.455.006,78	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000211 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 07 - Joaçaba	147 Escola construída, ampliada ou reformada	22,00	22,00	99,99	2.009.587,59	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000213 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 32 - Taió	147 Escola construída, ampliada ou reformada	15,00	14,32	95,45	2.096.833,96	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000214 Revitalização das Unidades Escolares de Abrangência da CRE 01 - São Miguel do Oeste	147 Escola construída, ampliada ou reformada	13,00	12,98	99,84	4.786.060,57	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000215 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 04 - Chapecó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	37,00	35,61	96,25	5.133.646,90	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000216 Revitalização das Unidades Escolares de Abrangência da CRE 06 - Concórdia	147 Escola construída, ampliada ou reformada	19,00	19,00	99,99	1.373.379,84	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000217 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 16 Brusque	147 Escola construída, ampliada ou reformada	27,00	22,75	84,25	3.198.626,78	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000218 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 25 - São Bento do sul	147 Escola construída, ampliada ou reformada	15,00	15,00	99,99	1.738.756,67	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000219 Revitalização das Unidades Escolares de Abrangência da CRE 35 - Braço do Norte	147 Escola construída, ampliada ou reformada	14,00	11,63	83,05	1.032.621,54	92,74	%	Atrasado	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000220 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 20 - Criciúma	147 Escola construída, ampliada ou reformada	55,00	29,87	54,31	5.765.265,49	97,38	%	Em andamento	Fevereiro/2023



450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000221 Revitalização das Unidades Escolares de Abrangência da CRE 22 - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	59,00	58,99	99,99	1.170.274,96	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000222 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 24 - Mafra	147 Escola construída, ampliada ou reformada	23,00	23,00	99,99	420.106,65	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2021OE000223 Revitalização das Unidades Escolares de Abrangência da CRE 17 - Itajaí	147 Escola construída, ampliada ou reformada	44,00	35,82	81,42	438.234,41	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000001 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 36 - Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	107,00	105,30	98,41	14.677.531,84	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000002 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 13 - Ituporanga	147 Escola construída, ampliada ou reformada	18,00	16,86	93,66	2.227.371,64	98,38	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000003 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 34 - Timbó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	24,00	24,00	99,99	5.498.203,76	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000004 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 10 - Caçador	147 Escola construída, ampliada ou reformada	18,00	15,65	86,92	1.842.604,33	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000005 Revitalização das Unidades Escolares Abrangência CRE 12 - Rio do Sul	147 Escola construída, ampliada ou reformada	16,00	16,00	99,99	530.073,03	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000011 Reforma e ampliação da EEB Alfredo Dalfovo - município Rio do Sul	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000015 Revitalização das Unidades Escolares de abrangência da CRE 19 - Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	16,00	14,16	88,47	5.363.082,75	99,53	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000016 Reforma do Ginásio de Esporte da EEB João Colode - Município de Turvo	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,66	82,40	553.967,11	82,41	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000017 Reforma e Ampliação da EEB Muquem - Município de Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,41	51,14	1.394.404,93	99,86	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000035 Reforma da estrutura metálica e cobertura da EEB Seara no município de Seara	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,92	91,99	621.616,21	92,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023



450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000036 Construção de Quadra Poliesportiva- EEB Encano do Norte - Indaial	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,12	15,35	320.444,13	58,43	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000038 Reforma da EEB Cacilda Guimarães - Vidal Ramos	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,17	20,75	769.850,16	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000040 Construção de Quadra Poliesportiva- EEB Iracy Tonello - Xanxerê	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,36	44,56	1.008.042,69	85,11	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000044 Construção de Quadra Poliesportiva- EEB Prof. Balduino Cardoso - Porto União	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,17	21,52	722.593,02	92,11	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000045 Reforma e Ampliação da EEB Profª Maria da Glória Silva - Içara	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,43	53,43	2.037.024,69	90,26	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000046 Reforma e Ampliação da EEB Prof. João Boos - Guabiruba	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,02	2,80	123.066,39	12,31	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000047 Construção de Quadra Poliesportiva- EEB Gov. Heriberto Hulse - Criciúma	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,11	14,28	384.432,66	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000048 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Profª. Palmira Morais de Miranda - Pescaria Brava	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	1,67	49.751,35	17,49	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000049 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Sen. Francisco Benjamin Gallotti - Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	0,80	47.028,76	26,16	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000050 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Gen. Osvaldo Pinto da Veiga - Capivari de Baixo	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,07	8,40	189.637,83	56,36	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000051 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Prof. Florentino Vetter - Indaial	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,15	18,92	571.505,10	72,85	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000052 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Aparicio Julio Farrapo - Xanxerê	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,20	25,24	532.784,69	72,81	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000053 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Rodolfo Feuser - São Martinho	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,14	17,06	373.221,58	41,43	%	Em andamento	Fevereiro/2023



450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000054	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Werner Knabben - Braço do Norte	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,02	1,96	46.380,47	31,24	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000055	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Dom Pio de Freitas - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,02	2,51	243.018,82	66,50	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000056	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Conselheiro Astrogildo Odon Aguiar - Barra Velha	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,08	10,60	335.064,77	91,68	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000057	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Zulma Becker - Santo Amaro da Imperatriz	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	0,78	158.658,88	98,33	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000058	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Galeazzo Paganelli - Vargem Bonita	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,04	4,84	266.035,98	76,35	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000059	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Mota Pires - Araranguá	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,20	24,60	732.074,81	93,32	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000061	Const. Quadra Poliesportiva - EEB Profª Francisca Martins de Oliveira Burigo Cocal do Sul	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,09	10,90	261.778,66	97,92	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000062	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Profª Valesca Carmen Resk Parizotto - Chapecó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,02	1,99	222.851,01	31,17	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000063	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB São Francisco - chapecó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,10	12,82	429.827,54	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000064	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Pedro Maciel - Chapecó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,07	8,72	365.199,54	99,93	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000066	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Alaide Tabalipa - Içara	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,05	6,05	146.829,42	27,64	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000067	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Prof. Noé Abati - Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,11	13,79	511.620,24	99,25	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000068	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Egidio Barauna - Lages	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,19	23,20	799.347,47	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023



450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000069	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Gov. Aderbal Ramos da Silva - Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,11	14,08	522.133,07	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000070	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Operária - Araranguá	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,15	19,00	381.261,43	69,52	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000071	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Martinho Ghizzo - Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,13	16,41	627.709,48	98,98	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000072	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Placido Olimpo de Oliveira - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,07	8,49	291.887,91	79,87	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000073	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Samuel Sandrini - Orleans	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,03	4,11	147.892,39	59,66	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000074	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Francisco de Paula Seara - Itajaí	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	1,38	287.762,74	78,74	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000075	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profª Clairinice Vieira Caldeira - São Francisco	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	0,99	222.270,92	60,82	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000076	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profº Rudolfo Meyer - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	1,87	349.396,69	95,60	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000077	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profº Gustavo Augusto Gonzaga- Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	1,20	40.314,94	8,66	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000078	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Marli Maria de Souza - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,03	3,13	166.433,33	35,76	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000079	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Alvino Tribes - Jaraguá do Sul	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,12	14,56	529.745,77	61,21	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000080	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Georg Keller - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,02	2,05	69.611,73	26,22	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000081	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profª Ursulina de Senna Castro Palhoça	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	0,94	51.024,48	19,71	%	Em andamento	Fevereiro/2023



450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000083	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Marechal Luz - Jaguaruna	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,04	5,20	212.586,67	58,17	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000084	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Carmen Seara Leite - Garuva	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,03	3,87	178.123,65	48,74	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000085	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Maria Amin Ghanem - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	1,23	42.100,99	9,04	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000086	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Venceslau Bueno - Palhoça	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	0,80	357.076,11	97,71	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000087	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Comendador Rocha - Laguna	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	1,29	197.446,23	54,03	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000088	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Antônio Morandini - Chapecó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,33	41,78	1.427.296,67	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000089	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Conego Nicolau Gesing - Braço do Norte	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,02	2,23	77.770,80	19,50	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000090	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Prof. Juvenal Cardoso Zanella - Timbó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,04	5,38	189.022,18	23,47	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000092	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Angelo Ize - Forquilha	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,13	16,64	650.735,10	82,95	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000093	Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profª Maria do Carmo de Souza - Palhoça	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,11	13,75	559.225,39	98,90	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000095	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Prof Silveira de Matos Santo Amaro da Imperatriz	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,07	8,67	364.851,92	99,83	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000097	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Profª Eloisa Maria Prazeres de Faria - Biguaçu	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	0,67	318.884,10	87,25	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000098	Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Idelfonso Linhares - Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	1,80	175.685,93	48,07	%	Em andamento	Fevereiro/2023



450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000100 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Nicolina Tancredo - Palhoça	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	0,80	59.937,70	16,40	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000102 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Imaculada Conceição - Jacinto Machado	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,17	21,08	545.757,50	93,38	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000103 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Cardeal Arcoverde - São Carlos	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,33	41,33	1.456.585,40	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000105 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Vicente Silveira - Palhoça	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000106 Reforma e Ampliação da EEF Santo Antônio - Biguaçu	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,12	14,87	194.418,95	77,77	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000119 Conclusão da Reforma e Ampliação EEB Dom Jaime Câmara - Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,23	29,29	700.087,90	58,34	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000122 Aquisição de Kit de escolas Modulares - Comunidades Indígenas	147 Escola construída, ampliada ou reformada	4,80	2,88	60,00	5.420.739,47	96,04	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000126 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EEB GREGORIO MANOEL DE BEM - LAGUNA	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,03	3,17	195.342,41	43,56	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000127 QUADRAS DE BECH TENIS - REGIONAIS DO VALE E NORTE	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,70	87,40	2.910.726,76	96,47	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000131 Reforma do muro de contenção - EEB José do Patrocínio - município: Siderópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,78	96,97	366.398,60	96,98	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000148 Reforma e Ampliação Cedup Abílio Paulo - Município: Criciúma	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,03	5,56	1.318.077,10	72,81	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000149 REFORMA E AMPLIAÇÃO EEB SÃO LUDGERO - MUNICÍPIO: SÃO LUDGERO	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,07	14,74	721.684,00	85,91	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000152 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EEB Profª Gertrudes Benta Costa - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	0,74	24.559,51	24,56	%	Em andamento	Fevereiro/2023



450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000153 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EEB Prof. João Rocha - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000154 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EEB Santa Catarina - São Francisco do Sul	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000155 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - CEDUP Diomicio Freitas - Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,01	1,02	35.152,09	35,15	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000156 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EEB Francisco Tolentino - São José	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000157 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EEB Profª Julieta Lentz Puerta - Joaçaba	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000159 REAJUSTE CONTRATUAL EEB FELIPE SCHMIDT - SÃO FRANCISCO DO SUL	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,05	5,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000165 Reforma do Ginásio da EEB Bulcão Viana - Município: Praia Grande	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,10	12,54	44.085,87	13,25	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000175 Reforço e recuperação das Estruturas da EEB Júlio da Costa Neves de Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	1,00	0,66	66,15	2.788.841,96	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000182 Reforma do Ginásio de Esportes Pedro Ivo - EEB Jacinto Machado - Município: Jacinto Machado	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,13	26,01	261.271,56	26,01	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000184 Subestação de Energia da EEB Dr. Otto Feuerschuetten - Município de Capivari de Baixo	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,74	91,96	102.079,10	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000185 Revitalização das Unidades Escolares de Abrangência da CRE 27 - Lages	147 Escola construída, ampliada ou reformada	10,50	8,55	81,47	4.435.234,81	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000205 Subestação de Energia da EEB Madre Terezinha Leoni - Município de Videira	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,74	92,79	85.236,94	92,79	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000206 Conclusão da Reforma e Ampliação da EEB Henrique Estefano Koerich - município: Palhoça	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,10	0,00	1,97	254.010,39	58,36	%	Em andamento	Fevereiro/2023



450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000208 Subestação de Energia da EEB Irene Stonga - Município de Chapecó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000209 Instalação de Padrão de Energia - EEB Leopoldo Jacobsen - Município Taió	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000213 Fornecimento, reparo e montagem de divisórias e persianas - CRE 36 - Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	32,10	19,26	60,00	47.608,49	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000214 Fornecimento, montagem de divisórias e persianas - CRE 17 Itajaí	147 Escola construída, ampliada ou reformada	13,20	1,87	14,17	593.083,13	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000215 Subestação de Energia da EEB Prof. Djalma Bento - Município de Rio Rufino	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,06	12,27	213.610,62	92,19	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2022OE000561 Substação de energia EEB Almirante Lamego - Laguna	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,80	0,77	96,87	496.649,63	96,87	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	011492	2022OE000142 Pagamento de Aditivos e Reajustes de obras nas unidades escolares - Ensino Profissional	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,30	60,00	165.552,94	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450001 Secretaria de Estado da Educação	015133	2021OE000203 Transferências Especiais para os Municípios	190 Município beneficiado	295,00	103,25	35,00	381.722.685,73	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005315	2022OE000007 Executar reforma em prédio em Lages/SC	195 Obra executada	0,90	0,06	7,18	1.198.012,88	84,24	%	Em andamento	Janeiro/2023
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005315	2022OE000025 Executar barracão de suinocultura em Lages/SC	195 Obra executada	1,00	0,26	26,39	104.670,73	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005315	2022OE000035 Construir Bloco Cirúrgico em Lages	195 Obra executada	0,19	0,02	12,57	2.849.097,33	92,12	%	Em andamento	Janeiro/2023
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005315	2022OE000052 Executar construção de laboratório em Lages/SC	195 Obra executada	0,75	0,13	16,67	61.684,11	63,97	%	Em andamento	Janeiro/2023
450022 Fundação Universidade do	005317	2020OE000018 Manutenção, reforma, aquisição de bens imóveis do Campus da UDESC-Joinville	195 Obra executada	1,00	0,99	98,70	537.826,86	64,19	%	Em andamento	Janeiro/2023



Estado de Santa Catarina

450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005317	2022OE000063 Adequar sistema preventivo de incêndio no Campus de Joinville	195 Obra executada	0,50	0,50	100,00	443.729,77	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005317	2022OE000065 Construir infraestrutura para elevadores e banheiros acessíveis no Campus de Joinville	195 Obra executada	0,80	0,80	100,00	187.527,74	70,02	%	Em andamento	Dezembro/2022
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	009111	2022OE000017 Executar prédios em Balneário Camboriu/ SC	195 Obra executada	0,29	0,01	4,79	1.347.840,30	69,10	%	Em andamento	Janeiro/2023
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	012753	2022OE000056 Adquirir 5(cinco) aparelhos de ar-condicionado	800 Máquina e equip adquirido	5,00	2,50	50,00	58.900,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
450092 Fundo Estadual de Educação- FEDUC	012842	2022OE000002 Aquisição de Equipamentos Unidades Escolares SC - FEDUC	195 Obra executada	0,80	0,59	73,81	5.622.332,00	73,81	%	Em andamento	Fevereiro/2023
470030 Fundação Escola de Governo - ENA	014282	2022OE000003 Contratação de consultores p/ serviços consultoria da travessia aquav. Itajaí - Navegantes	098 Estudo realizado	4,00	2,40	60,00	20.844,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
470030 Fundação Escola de Governo - ENA	014859	2021OE000012 Promover a mudança da sede do Arquivo Público	914 Unidade instalada	1,00	0,90	90,00	706.876,20	98,11	%	Em andamento	Dezembro/2022
480091 Fundo Estadual de Saúde	012191	2020OE000758 Ampliação e readequação do hospital Hans Schmidt - Joinville	195 Obra executada	1,00	0,95	94,93	1.788.390,97	53,06	%	Em andamento	Fevereiro/2023
480091 Fundo Estadual de Saúde	012574	2020OE000098 Ampliação do Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos de Lages 2ª etapa	195 Obra executada	1,00	0,96	96,02	38.191,13	1,72	%	Em andamento	Fevereiro/2023
480091 Fundo Estadual de Saúde	012575	2020OE000723 Readequações Finais na Obra do Hospital Regional do Oeste	195 Obra executada	1,00	0,99	99,00	168.675,67	99,92	%	Em andamento	Fevereiro/2023
480091 Fundo Estadual de Saúde	012576	2020OE000657 Ampliação do hospital Marieta konder Bornhausen	195 Obra executada	1,00	0,98	98,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
480091 Fundo Estadual de Saúde	012588	2020OE000106 Ampliação e readequação do Hospital São Paulo - Xanxerê	195 Obra executada	1,00	0,95	95,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2022OE000035 Revisar projetos dos Centros de Reabilitação de Chapecó e Joaçaba	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2022OE000036 Elaborar projeto estrutural para reforço no pavimento térreo do Anexo 1	195 Obra executada	1,00	0,40	40,00	9.000,00	24,66	%	Em andamento	Fevereiro/2023
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2022OE000070 Realizar serviços de manutenção predial das unidades da SES referente a ATA 335/2022	195 Obra executada	1,00	0,10	10,00	4.052,42	9,96	%	Em andamento	Fevereiro/2023



480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2022OE000112 Elaborar projeto preventivo contra incêndio para a Regional de Saúde Joinville	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2022OE000165 Elaborar projeto elétrico para Anexo I da SES	195 Obra executada	1,00	0,50	50,00	24.995,09	50,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
480091 Fundo Estadual de Saúde	014148	2022OE000176 Aquisição de equipamentos e mobiliário para o Hospital Marieta Konder Bornhausen	122 Hospital equipado	1,00	0,99	99,00	4.350.710,65	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015380	2022OE000402 Aquisição de um Caminhão Caçamba 6x2 - município de Anitápolis	249 Projeto apoiado	0,20	0,00	0,00	550.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015380	2022OE000403 Aquisição de equipamento (caminhão caçamba) para o Município de Angelina	249 Projeto apoiado	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015380	2022OE000404 Aquisição de equipamentos rodoviários para o município de Braço do Norte	249 Projeto apoiado	0,20	0,00	0,00	1.100.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015385	2022OE000532 Implantação do Centro de Inovação de Tubarão (continuação antigo OE 2020/02 - UG 520093)	249 Projeto apoiado	0,73	0,53	72,65	663.000,74	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015386	2022OE000164 Revitalização do Mercado Publico de Rio Negrinho	511 Equipamento fornecido	0,94	0,88	93,66	199.890,50	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015386	2022OE000165 Obras de Reforço Estrutural no Pavilhão do Imigrantes em Rio Negrinho	511 Equipamento fornecido	0,49	0,24	49,45	1.614.942,76	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015386	2022OE000212 Construção de Centro de Inovação e Salvamento Veicular e Saúde no Município de Chapecó	511 Equipamento fornecido	0,47	0,22	46,69	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015386	2022OE000278 Adequação do Barracão Industrial do Município de Santiago do Sul	511 Equipamento fornecido	0,05	0,00	0,00	84.897,81	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015386	2022OE000406 Construção, implantação subestação de energia e linha transmissão Município de Grão Pará	511 Equipamento fornecido	0,05	0,00	0,00	3.845.917,05	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015386	2022OE000533 Reconstrução do Atracadouro do Centro de Balneário Barra do Sul	511 Equipamento fornecido	0,45	0,00	0,00	500.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022



Social e Erradicação da Pobreza

520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015386	2022OE000539 Ampliação sistema de drenagem e rede de esgoto R. Nereu Ramos em Herval Do Oeste	511 Equipamento fornecido	0,38	0,00	0,00	600.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015386	2022OE000542 Revitalização e urbanização da Praça Central Augustinelli em Balneário Arroio Silva	511 Equipamento fornecido	0,23	0,00	0,00	900.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015386	2022OE000549 Instalação da Rede Elétrica Trifásica entre comunidade Vista Alta e Pinheirinho em Pricesa	511 Equipamento fornecido	0,50	0,00	0,00	250.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015386	2022OE000558 Aquisição de um imóvel - obra estruturante funcionamento da Unidade de Saúde em Capinzal	511 Equipamento fornecido	0,05	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015386	2022OE000559 Ampliação da rede elétrica no Município de Cordilheira Alta	511 Equipamento fornecido	0,05	0,00	0,00	100.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015386	2022OE000569 Implantação do Centro UP de Coworking e Inovação ETAPA 2 em Jaraguá do Sul	511 Equipamento fornecido	0,20	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000114 PLANO MIL - Macrodrenagem na Bacia do Rio Criciúma	322 Obra realizada	0,64	0,28	43,26	8.068.840,25	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000118 Pavimentação da Estrada Geral de acesso ao Bairro Limpa no município de Garopaba	322 Obra realizada	0,64	0,41	64,60	3.300.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000135 Pavimentação asfáltica da da Rodovia Adilfo Inácio B. Costa Macacuem Garopaba	322 Obra realizada	0,65	0,16	24,44	400.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000136 Pavimentação e infraestrutura d a rua Nicolau Manoel de Abreu B. Ambrosio Garopaba	322 Obra realizada	0,65	0,42	64,78	1.700.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000137 Pavimentação asfáltica da da Rodovia GRP 472 Rua Luiz Zanelato Garopaba	322 Obra realizada	0,68	0,46	67,52	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022



520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000152 Revitalização da 2ª Etapa na Praça da Liberdade no Município de São Lourenço do Oeste	322 Obra realizada	0,67	0,23	33,73	1.189.784,17	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000153 Drenagem, pavimentação e sinalização da Rua Fernando Cerutti no Município de Rio do Sul	322 Obra realizada	1,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000154 Requalificação da Travessa Dr. Norberto Bachmann, no Município de Joinville	322 Obra realizada	0,52	0,27	51,76	961.111,10	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000166 Pavimentação da Rua Nicolau Manoel da Silva em Tubarão	322 Obra realizada	0,60	0,36	60,09	2.232.012,55	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000183 Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização Rua Padre Carlos Guesser - Rio Farias	322 Obra realizada	0,45	0,08	17,91	1.654.824,66	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000184 Pavimentação e drenagem da Rua Teodoto Tonom no município de Tubarão	322 Obra realizada	0,60	0,38	62,50	1.518.454,18	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000190 Requalificação viária da Alameda Aliança no município de Rio do Sul	322 Obra realizada	0,67	0,47	70,52	3.147.252,07	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000191 Pavimentação e drenagem da Rua Tenente Luís Maus no município de Tubarão	322 Obra realizada	0,60	0,37	60,95	3.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000194 Pavimentação avenida Beira Mar Sul, bairro Paiquere no Município de Araranguá	322 Obra realizada	0,90	0,65	72,23	551.154,88	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000195 Pavimentação da ARA 230, (Valdemar Nestor Inácio) no município de Araranguá.	322 Obra realizada	0,67	0,46	68,02	1.586.468,98	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000196 Revitalização Infraestrutura Urbana com pavimentação rua Iracy Luchina Trecho 1 Araranguá	322 Obra realizada	0,49	0,24	48,65	600.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022



520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000197 Pavimentação Rua Prefeito Ruy Stocker de Souza no Município de Araranguá	322 Obra realizada	1,00	0,89	89,20	605.141,18	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000198 Revitalização da Avenida 25 de Julho Criação Rota Turística, no município de Forquilha	322 Obra realizada	0,33	0,00	0,00	4.478.525,57	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000199 Projeto de Macrodrenagem Rua Paulo Kuehnrich no Bairro Itoupava município de Blumenau	322 Obra realizada	0,74	0,35	46,76	3.509.887,12	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000200 Pavimentação asfáltica na Rua Walter Berner no Município de Blumenau	322 Obra realizada	0,42	0,18	42,47	2.308.851,71	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000201 Aquisição de uma escavadeira HIDRÁULICA para o município de São Bonifácio	322 Obra realizada	0,90	0,00	0,00	840.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000202 Implantação ligação Avenida das Torres com duplicação Rua José Martins município São José	322 Obra realizada	0,75	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000203 Infraestrutura com a Pavimentação asfáltica em CBUQ no município de Xaxim	322 Obra realizada	0,66	0,44	67,09	1.461.825,52	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000204 Infraestrutura com a Pavimentação asfáltica em CBUQ no município de Xaxim	322 Obra realizada	0,17	0,03	16,75	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000208 Pavimentação asfáltica e rede de abastecimento de água no Bairro de Fora em Palhoça	322 Obra realizada	0,47	0,33	70,37	5.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000209 Pavimentação de acesso industrial de Campo Novo no município de Mafra	322 Obra realizada	0,64	0,23	36,61	2.039.153,15	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000210 Implantação do sistema Binário no Bairro Jardim América no município de Mafra	322 Obra realizada	0,47	0,09	20,00	2.333.333,34	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022



520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000211 Implantação do sistema Binário no Bairro Vila Nova no município de Mafra	322 Obra realizada	0,50	0,14	28,30	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000213 Implanta do contorno viário sul no Município de Ituporanga - 1º Etapa	322 Obra realizada	0,47	0,21	44,14	2.558.891,83	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000216 Pavimentação de ligação entre os bairros Várzea e Taboleiro em Itapema	322 Obra realizada	0,61	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000217 Execução da Avenida das Torres - Palhoça	322 Obra realizada	0,47	0,30	62,83	3.666.666,67	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000218 Execução da Avenida das Terra Bela - Palhoça	322 Obra realizada	0,47	0,09	19,37	2.333.333,34	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000224 Implantação avenida de ligação dos Loteamentos Recanto da Natureza, Vista Alegre Lisboa	322 Obra realizada	0,47	0,09	19,99	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000225 Execução da Macrodrenagem da Bacia do Roçado no Município de São José	322 Obra realizada	0,48	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000226 Requalificação viárias Lauro Muller, Vitor Meireles, Padre Américo e macrodrenagem Budag	322 Obra realizada	0,47	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000227 Pavimentação da Avenida Antônio Ribeiro dos Santos no Bairro Várzea em Lages	322 Obra realizada	0,38	0,14	37,64	1.300.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000228 Implantação da Avenida ligação Loteamento Nova São Jose´ Portal Colina e Loteamento Lisboa	322 Obra realizada	0,73	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000229 Recuperação da Rodovia Genésio de Souza Goulart em Tubarão	322 Obra realizada	0,40	0,16	40,10	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022



520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000230 Pavimentação em diversas ruas no perímetro urbano de São Lourenço do Oeste	322 Obra realizada	0,48	0,11	22,07	1.770.765,37	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000236 Pavimentação asfáltica da rua Eurídes Francisco Tomazoni no município de Joinville	322 Obra realizada	0,66	0,22	32,59	2.033.978,10	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000237 Realização da pavimentação de vias públicas no município de Rio Negrinho	322 Obra realizada	0,62	0,14	22,62	800.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000238 Pavimentação de trecho da Rua Conselheiro Willy Hering em Rio do Sul	322 Obra realizada	0,48	0,23	48,46	1.210.782,17	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000240 Obras de pavimentação na Estrada Geral do Lajeado no município de Tubarão	322 Obra realizada	0,40	0,08	20,14	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000241 Pavimentação da Rua Iracy Luchina - Trecho 2 no Município de Araranguá	322 Obra realizada	0,48	0,23	47,60	735.351,33	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000248 Pavimentação asfáltica da Rua Boehmerwad no Município de Joinville	322 Obra realizada	0,64	0,19	28,99	1.556.994,94	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000251 Execução de Pavimentação e Drenagem da Estrada Geral de Sorocaba em Biguaçu	322 Obra realizada	0,40	0,08	20,18	1.156.402,19	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000252 Revitalização da Avenida Coronel João Fernandes no Birro Urussanguinha	322 Obra realizada	0,46	0,21	46,10	1.203.383,02	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000254 Apoio Financeiro para pavimentação de via publica no município de Lages	322 Obra realizada	0,50	0,12	24,96	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000255 Reperfilagem asfáltica das Linhas São Lourenço e São Valentino interior em Iporã do Oeste	322 Obra realizada	0,66	0,21	31,72	1.038.101,48	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção	015387	2022OE000256 Pavimentação, drenagem e urbanização da Rua Ágata em Bombinhas	322 Obra realizada	0,47	0,35	73,74	3.652.491,70	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022



Social e Erradicação da Pobreza

520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000257 Pavimentação, drenagem e urbanização da Rua Açucena em Bombinhas	322 Obra realizada	0,52	0,27	51,58	500.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000258 Pavimentação Rua Governador Jorge Lacerda - Trecho de ligação Intermunicipal Monte Castelo	322 Obra realizada	0,47	0,02	3,32	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000259 Revitalização Urbanística da Orla do Rio Caveiras no Bairro Saveiro em Biguaçu	322 Obra realizada	0,67	0,00	0,00	500.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000260 Pavimentação asfáltica na Rua Francisco Possamai e rua José Aldo em Cocal do Sul	322 Obra realizada	0,66	0,23	34,20	1.220.404,25	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000261 Readequação Elétrica da Rua Tancredo Neves no Município de Concórdia	322 Obra realizada	0,40	0,20	50,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000266 Obras de infraestrutura para implementação do Parque Linear Praia Quilombo - Penha	322 Obra realizada	0,47	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000267 Execução de Pavimentação e Drenagem da Ismar Pedro Bez em Biguaçu	322 Obra realizada	0,68	0,00	0,00	450.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000268 Pavimentação da rua Agenor Loli no Município de Orleans	322 Obra realizada	0,68	0,47	69,64	1.667.424,27	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000269 Pavimentação asfáltica da estrada Municipal de acesso São Miguel do Oeste	322 Obra realizada	0,67	0,01	1,59	800.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000270 Pavimentação asfáltica rua João Ernesto Ramos, bairro Centro Capivari de Baixo acesso Sul	322 Obra realizada	0,64	0,18	28,46	600.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000271 Pavimentação da ICR - 253 - ICR - 472 no município de Içara	322 Obra realizada	0,60	0,00	0,00	620.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022



520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000280 Pavimentação lajota de 2.000 metros na Rua Geral Comunidade Loeffelscheidt Águas Mornas	322 Obra realizada	0,30	0,00	0,00	300.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000281 Pavimentação da Rota do Turismo Rural - Etapa I no município de Içara	322 Obra realizada	0,23	0,00	0,00	900.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000282 Pavimentação da estrada Geral Rio América Baixo no município de Urussanga	322 Obra realizada	0,31	0,02	6,98	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000283 Execução de Macrodrenagem com recuperação e pavimentação rua Divinópolis em Blumenau	322 Obra realizada	0,37	0,00	0,00	800.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000286 Pavimentação asfáltica do trecho da Rua Otto Friedrich no município de Canoinhas	322 Obra realizada	0,41	0,20	48,11	1.931.560,66	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000287 Pavimentação de Estrada Municipal de acesso a Linha Parada, interior São Miguel do Oeste	322 Obra realizada	0,67	0,00	0,00	400.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000288 Implantação da pavimentação da Rua Paulo Zingel em Blumenau	322 Obra realizada	0,20	0,04	20,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000295 Aquisição de uma escavadeira hidráulica nova, zero horas para o município de Princesa	322 Obra realizada	1,00	1,00	100,00	750.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000297 Implantação de pavimentação da Rua Arnoldo Beck no Município de Blumenau	322 Obra realizada	0,50	0,13	26,01	700.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000298 Implantação pavimentação da Rua José Reuter - trecho final , Bairro Velha Central Blumenau	322 Obra realizada	0,40	0,08	21,07	1.844.357,78	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000299 Obras de infraestrutura para implementação da terceira Avenida no município de Penha	322 Obra realizada	0,47	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022



520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000300 Obras sobre revestimento Estrada de acesso da Comunidade Sta Terezinha em Herval do Oeste	322 Obra realizada	0,68	0,51	75,30	1.343.038,98	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000301 Pavimentação sobre revestimento da Estrada acesso Comunidade Boa Esperança Herval do Oeste	322 Obra realizada	0,49	0,24	48,73	1.026.363,03	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000302 Pavimentação asfáltica da Rua Clair Costenaro no município de Joaçaba	322 Obra realizada	0,48	0,11	22,22	2.166.666,68	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000303 Aquisição de uma motoniveladora para município de Urupema	322 Obra realizada	1,00	1,00	100,00	1.028.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000304 Deapropiação de áreas necessárias a Execução de obras Complexo Viário em Blumenau	322 Obra realizada	0,20	0,03	17,18	413.398,75	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000306 Pavimentação de Via Urbana no Município de Pomerode	322 Obra realizada	0,65	0,42	65,30	1.494.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000307 Execução de obras da ponte com acessos r. Santa Terezinha ao bairro Progresso em Blumenau	322 Obra realizada	0,47	0,09	20,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000309 Pavimentação asfáltica e/ou pedras poliédricas nos Distritos de Dionísio Cerqueira	322 Obra realizada	0,47	0,11	24,08	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000310 Pavimentação asfáltica 305 Sta Paulina, 441 São Paulo e 443 bairro Caixa D'Água Guarimir	322 Obra realizada	0,51	0,00	0,00	550.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000311 Pavimentação asfáltica da RM Linha Eyngno município de Forquilha	322 Obra realizada	0,67	0,22	33,33	500.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000312 Revitalização da Avenida Beira Mar 3 no município de Itapoá	322 Obra realizada	0,47	0,10	20,80	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022



520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000316 Revitalização de Passeios públicos da Avenida Manoel Gregório no município de Içara	322 Obra realizada	0,50	0,03	5,30	500.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000525 Obras de pavimentação asfáltica em CBUQ Estrada Vila Folle	322 Obra realizada	0,33	0,00	0,00	700.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000534 Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária de ruas em Balneário Piçarras	322 Obra realizada	0,21	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000535 Pavimentação da Rua João Bianchini - B. Bela Vista no Município de Braço do Norte	322 Obra realizada	0,23	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000536 Pavimentação das Rodovias JGS 481 - Gerhard Gumz e JGS Vandelin Município Jaraguá do Sul	322 Obra realizada	0,20	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000537 Pavimentação da Rua Renato Bonettie Rua Newton Marcelino no Município de Braço Norte	322 Obra realizada	0,22	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000538 Infraestrutura com Pavimentação asfáltica da Rua 508 Flor de Maracuno município Guaramirim	322 Obra realizada	0,27	0,00	0,00	550.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000540 Implantação pavimentação, pistas de rolamento, ciclofaixa, sinalização viária em Camboriú	322 Obra realizada	0,20	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000541 Pavimentação asfáltica R. Mezzari, Otilia Bressan e Lúcia Martins B. Sta Cruz Forquilha	322 Obra realizada	0,35	0,00	0,00	350.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000544 Requalificação viária da Rua Santa Catarina no Município de Joinville	322 Obra realizada	0,21	0,00	0,00	800.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000545 Pavimentação do Eixo de Ligação à BR 116, R. Germano Neudorf em Mafra	322 Obra realizada	0,20	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022



520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000546 Pavimentação asfáltica trecho estrada Rio Molha - Ribeirão Gustavo em Massaranduba	322 Obra realizada	0,20	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000547 Ampliação da Ponte Agricultor liga r. Stanislau Vick a estrada Bananal Guarimirim	322 Obra realizada	0,21	0,00	0,00	750.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000548 Pavimentação e drenagem da Avenida Baleia Franca B. Ibiraquera no município de Imbituba	322 Obra realizada	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000550 Pavimentação asfáltica da Estrada M. Comunidade L. Campo Sales Pérola São Miguel do Oeste	322 Obra realizada	0,26	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000551 Pavimentação asfáltica estrada rural em parte SEA 352 ligando SC 283 V. Canhada - Seara	322 Obra realizada	0,20	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000552 Obras implantação macrodrenagem e recomposição pavimento Avenida Wenscelau Brás em Tubarão	322 Obra realizada	0,20	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000555 Pavimentação da Estrada Campeche em Vidal Ramos	322 Obra realizada	0,25	0,00	0,00	800.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000556 Pavimentação com drenagem, calçadas, ciclovia iluminação Parque Municipal Sta Rosa do Sul	322 Obra realizada	0,20	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000565 Obras de infraestrutura , na área Industrial (Etapa II) em Urussanga	322 Obra realizada	0,42	0,00	0,00	700.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000566 Pavimentação previsão pistas de rolamento, sinalização viária drenagem pluvial Camboriú	322 Obra realizada	0,20	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000567 Macrodrenagem com recuperação do pavimento R. Araranguá, B. Garcia em Blumenau	322 Obra realizada	0,20	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022



520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2022OE000568 Implantação da pavimentação da Rua Paulo Zingel extensão 2.180,00 metros em Blumenau	322 Obra realizada	0,20	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015394	2022OE000263 Aquisição dois caminhões/caçamba basculante, escavadeira hidráulica para Município Corupá	511 Equipamento fornecido	1,00	0,42	42,00	1.999.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015394	2022OE000264 Aquisição de carreta semirreboque basculante com pneus e bomba hidráulica - Monte Castelo	511 Equipamento fornecido	1,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015394	2022OE000317 Aquisição de Motoniveladora para Município de Xaxim	511 Equipamento fornecido	1,00	1,00	100,00	1.119.000,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015394	2022OE000524 Aquisição de equipamentos e imobiliários para a Prefeitura Municipal de Grão Pará	511 Equipamento fornecido	0,90	0,00	0,00	199.871,85	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
520093 Fundo Pró-Emprego	012737	2020OE000001 Construção de Centro de Inovação no município de Blumenau.	249 Projeto apoiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado	Dezembro/2022
520093 Fundo Pró-Emprego	012737	2020OE000003 Construção do Centro de Inovação em Joaçaba	249 Projeto apoiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado	Dezembro/2022
520093 Fundo Pró-Emprego	012737	2020OE000004 Construção do Centro de Inovação de Chapecó	249 Projeto apoiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado	Dezembro/2022
520093 Fundo Pró-Emprego	012737	2020OE000005 Construção do Centro de Inovação em São Bento do Sul	249 Projeto apoiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado	Dezembro/2022
520093 Fundo Pró-Emprego	012737	2020OE000006 Construção Centro de Inovação de Itajaí	249 Projeto apoiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado	Dezembro/2022
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008577	2022OE000118 CONVÊNIO 2022TR001309 PM TAIÓ	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	3.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008577	2022OE000122 CONVÊNIO 2022TR000999 PM SÃO JOAQUIM	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	3.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000081 CONVÊNIO 2022TR000590 PM DE balneario rincão	191 Município atendido	0,70	0,49	70,00	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000086 CONVÊNIO 2022TR000971 PM DE WITMARSUM	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000087 CONVÊNIO 2022TR000906 PM DE BALNEARIO GAIVOTA	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	5.250.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000092 CONVÊNIO 2022TR000829 PM DE CUNHA PORÁ	191 Município atendido	0,60	0,36	60,00	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000098 CONVÊNIO 2022TR001124 PM BOM JESUS DO OESTE	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000100 CONVÊNIO 2022TR000954 PM MARAVILHA	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000107 CONVÊNIO 2022TR000903 PM PASSO DE TORRES	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	3.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000108 CONVÊNIO 2022TR001003 PM SÃO JOAQUIM	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000110 CONVÊNIO 2022TR000969 PM SIDEROPOLIS	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	999.967,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000111 CONVÊNIO 2022TR001296 PM JOINVILLE	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	4.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000114 CONVÊNIO 2022TR000828 PM PALHOÇA	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	7.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000116 CONVÊNIO 2022TR001143 PM DE LAGUNA	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000119 CONVÊNIO 2022TR001131 PM CANELINHA	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000121 CONVÊNIO 2022TR001140 PM URUBICI	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023



Infraestrutura e
Mobilidade

530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000123 CONVÊNIO 2022TR000999 PM BENEDITO NOVO	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	1.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000124 CONVÊNIO 2022TR000315 MIRIM DOCE	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	3.500.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2022OE000125 CONVÊNIO 2022TR000833 PM DE SÃO JOAQUIM	191 Município atendido	0,50	0,25	50,00	2.000.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	010209	2022OE000129 Assistência técnica à SIE na execução de serviços e estudos - contrato Novos Rumos	244 Programa gerenciado	0,30	0,04	13,72	1.031.371,07	98,52	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	010209	2022OE000285 Execução dos serviços e estudos técnicos infraestrutura de transportes do Progama BB2	244 Programa gerenciado	0,15	0,01	4,73	251.250,83	94,52	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	012932	2020OE000207 Execução + Supervisão obras Implan/Pavim. acesso Norte de Blumenau, Tr. BR-470 - SC-108	288 Rodovia pavimentada	15,00	2,84	18,91	8.501.762,05	77,50	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	012932	2022OE000089 Implant. viaduto no município de Blimenau, Tr BR-470 - Vila Itoupava	288 Rodovia pavimentada	0,35	0,11	32,00	2.623.846,69	75,86	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	012933	2020OE000021 Execução + superv. obras rest./dupl./melhor. BR-280, tr. entr. SC-413(Jville)-entr. SC-416	288 Rodovia pavimentada	9,49	8,72	91,90	30.423.479,22	87,03	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	012939	2022OE000090 CONVÊNIO 2022TR000970 PM DE CHAPECÓ	195 Obra executada	0,50	0,25	50,00	3.500.000,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014282	2022OE000078 Estudo Viab. Técnica, econ .e ambiental p/ inst. serviços transp. hidroviário Jville - SFS	098 Estudo realizado	0,90	0,77	85,65	653.752,68	97,18	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014296	2021OE000191 Supervisão + Obras na Rod. SC-370, Tr. Urubici - Grão Pará - Serra do corvo Branco.	288 Rodovia pavimentada	8,64	0,53	6,19	3.948.502,14	93,72	%	Em andamento	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014434	2022OE000292 Obras de exec. das pontes sobre os rios Capivari I, Capivari II e rio Sete na SC-435	354 Obra rodoviária executada	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014435	2020OE000010 Sup obras ptos críticos/passivos amb rod coord reg Sul,Litoral, Vale Itajaí,Norte,Planalto	196 Obra supervisionada	0,60	0,04	7,49	54.960,62	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014435	2020OE000011 Sup obras ptos críticos/passivos ambienatais rod coord reg Meio Oeste, Oeste Extremo Oeste	196 Obra supervisionada	0,90	0,00	0,55	39.995,84	99,02	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014435	2021OE000186 Supervisão das obras das rodovias SC-442, SC-443, SC-445 e contorno Viário de Criciúma	196 Obra supervisionada	2,80	1,87	66,67	515.898,12	97,52	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014435	2021OE000187 Supervisão das obras na rodovia SC-484, trecho Guatambu - Caxambu do Sul	196 Obra supervisionada	0,70	0,52	74,48	799.748,08	94,89	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014441	2020OE000220 Pavimentação da Rodovia SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos	288 Rodovia pavimentada	22,33	20,77	93,02	1.200.611,69	49,94	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014444	2021OE000207 Obras de Implant. pavim. da interseção no entronc. BR-116 com a SC-390 em Capão Alto	288 Rodovia pavimentada	0,90	0,87	96,21	4.838.507,16	89,88	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014445	2020OE000104 Programas Ambientais das obras da SC-290, trecho Divisa SC/RS - Praia Grande	288 Rodovia pavimentada	15,74	13,81	87,72	706.639,03	81,27	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014448	2020OE000033 Manutenção da ponte s/ o rio Irani na Rod. SC-155, tr. Xanxerê-Xavantina-Ent.SC-283(Seara)	354 Obra rodoviária executada	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014453	2021OE000214 Construção da nova sede da Coord. Reg. Norte no município de Joinville	195 Obra executada	0,80	0,51	64,29	1.349.341,43	84,49	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014456	2021OE000203 Aquisição de 20 veículos automotores tipo caminhonete do ano 2021/2022 para a SIE	337 Unidade adquirida	10,00	10,00	100,00	37.920,00	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2022



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014457	2022OE000134 Reforma do posto 21 da Polícia Militar Rodoviária - Bom Jardim da Serra / SC	195 Obra executada	0,70	0,10	14,66	249.607,04	25,60	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014459	2020OE000008 Tratam 2 pontos críticos e Mitig 23 pass ambientais rodov. - coord reg MOeste,Oeste,EOeste	354 Obra rodoviária executada	2,25	0,00	0,00	224.320,12	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014459	2020OE000009 Tratam 4 pontos críticos e Mitig 18 passivos ambientais rodov. - coord reg Vale do Itajaí	354 Obra rodoviária executada	1,76	0,00	0,00	659.996,93	63,05	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014465	2021OE000021 Execução Passarela no acesso a Ratonos (SC-401), Tr Entr. SC-402 - Entr. Ac. Sto A. Lisboa	289 Rodovia reabilitada	0,23	0,05	21,21	511.208,17	25,96	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014465	2022OE000120 Obras de implantação da interseção do Km 4,8 da SC-403 em Ingleses/ Florianópolis	289 Rodovia reabilitada	0,10	0,09	92,00	4.000.155,94	98,67	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014465	2022OE000295 Obras de readeq. interseção do Km17 da rod. SC-406, Tr. Entr. SC-403 e Av. cidade Córdoba	289 Rodovia reabilitada	0,10	0,00	0,00	33.994,68	3,27	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014471	2021OE000131 Supervisão e obras Rest. Aum. Capac. SC-283, Tr. Águas de Chapecó - São Carlos	289 Rodovia reabilitada	11,99	1,40	11,69	6.962.299,33	99,14	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014471	2021OE000208 Supervisão + obras de rest. aum. capac. da SC-283, trecho Chapecó - Entr. para Arvoredo	289 Rodovia reabilitada	7,73	0,70	9,04	5.123.590,31	96,44	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014471	2022OE000168 Sup. + Obras rest. e melhor. aum. capac. rod. SC-283, Tr Concórdia-Arabutã-Ct Concórdia	289 Rodovia reabilitada	1,99	0,01	0,38	401.733,14	44,15	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014472	2022OE000109 Obras de Rest. aum. capac. rod. SC-150 (entr. SC-467 p/ Zortéa - Entr. SC-390 - Piratuba	289 Rodovia reabilitada	7,54	0,24	3,15	2.927.661,30	94,46	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014474	2021OE000152 Obras de reabilitação na rodovia SC-114, trecho BR-116 - Itaiópolis	289 Rodovia reabilitada	12,10	4,60	38,03	8.524.784,20	93,03	%	Atrasado	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014483	2020OE000038 Recuperação das condições de trafeg. e ptos críticos SC-135, Tr. Matos Costa - Porto-União	289 Rodovia reabilitada	32,25	32,25	100,00	0,00	0,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014485	2022OE000308 Supervisão + obras de rest. rod. SC-160, tr. B. Jesus Oeste-Serra Alta-Modelo-Pinhalzinho	289 Rodovia reabilitada	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014490	2022OE000165 Supervisão + obras de reab. aum. capac. rod. SC-108 entre Criciúma-Urussanga-Cocal do Sul	289 Rodovia reabilitada	3,28	0,02	0,69	1.929.390,03	77,11	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014492	2020OE000026 Reabilitação / Aumento de Capacidade / Supervisão SC-486, trecho BR-101 - Brusque	289 Rodovia reabilitada	20,91	15,13	72,34	386.665,57	37,61	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014496	2022OE000140 Superv. + obras contenção no acesso à Imbuia, tr. Imbuia - Entr. SC-350 (p/ Ituporanga)	289 Rodovia reabilitada	1,00	0,30	30,19	4.846.303,65	57,50	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014496	2022OE000297 Supervisão + Obras de duplicação e Restauração aum. capac. da SC-445 em Içara	289 Rodovia reabilitada	0,25	0,00	0,00	208.493,26	15,06	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014496	2022OE000299 Supervisão + obras restauração SC-281 e SC-112, tr.s Atalanta-Agrolândia-Trombudo Central	289 Rodovia reabilitada	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014506	2021OE000011 Execução das obras, sinalização e serv. diversos da Rod SC-135, tr Rio das Antas - Videira	289 Rodovia reabilitada	16,23	10,38	63,93	19.752.850,97	90,54	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014506	2021OE000012 Supervisão de obras da rodovia SC-135, trecho Caçador - Rio das Antas - Videira	289 Rodovia reabilitada	32,95	32,24	97,86	1.359.234,58	89,34	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014506	2021OE000013 Execução das obras, sinalização e serv diversos da Rod. SC-135, tr Caçador - Rio das Antas	289 Rodovia reabilitada	16,60	15,60	93,97	18.017.393,83	99,79	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000043 Projeto Rodoviário para Obras Restauração da Rod. SC-350, trecho Entr. BR-153 - Caçador	282 Projeto de rodovia elaborado	28,50	1,41	4,96	361.853,34	99,17	%	Em andamento	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000048 Projeto para Pavimentação da Rodovia SC-350, Trecho Rio do Oeste - Taió.	282 Projeto de rodovia elaborado	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000050 Projeto Obras Rest. Aum. Capac. Rod. SC-350, Tr Aurora - Ituporanga - Entr. Acesso Imbuia	282 Projeto de rodovia elaborado	7,22	0,58	8,03	133.433,17	64,27	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000056 Proj. Obras Rest. Rod. SC-283, tr. Seg.1: Palmitos - entr.BR-158; Seg 2:entr.BR-158-Mondai	282 Projeto de rodovia elaborado	6,35	1,59	25,02	205.955,03	68,30	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000059 Projeto Eng. Rod. Obras de Rest. Aum. Capac. da Rod. SC-120, tr. Lebon Regis - Curitibanos	282 Projeto de rodovia elaborado	16,25	5,03	30,98	204.007,19	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000066 Projeto de obras de Restauração Rod. SC160, Tr. Entr. BR-282 em Pinhalzinho - São Carlos	282 Projeto de rodovia elaborado	7,64	1,06	13,93	241.705,54	93,26	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000068 Projeto Rest. Rod. SC350, tr. Entr. SC120 (p/Curitibanos) - Entr. BR-116 (p/Monte Castelo)	282 Projeto de rodovia elaborado	5,12	1,27	24,75	127.288,35	64,80	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000069 Projeto Rest. Aum. Capac. Rod. SC480, Tr. Entr. SC155(Bom Jesus) - Entr. BR-282(Xanxerê)	282 Projeto de rodovia elaborado	13,39	4,58	34,17	219.358,60	61,23	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000071 Proj. Obras Rest. Rod. 452, tr. Entr. Rod. SC-355 (p/ Fraiburgo) - M. Castelo - Brunópolis	282 Projeto de rodovia elaborado	3,96	0,62	15,68	60.301,54	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000072 Proj. Obras Rest. Aum. Capac. Rod. SC-155, Tr. A BR282-Xavantina, Tr. B Xavantina-Seara	282 Projeto de rodovia elaborado	7,06	2,26	32,02	477.040,64	99,22	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000073 Proj. Rest. Rod. SC-161, Tr. Campo Erê - Palma Sola - Divisa/PR (Flor da Srra) - BR-280	282 Projeto de rodovia elaborado	16,80	8,06	48,00	212.561,59	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000075 Proj. Obras Rest. Aum. Capac. SC-160, Tr Campo Erê(Entr.SC-305) - Entr. Bom Jesus do Oeste	282 Projeto de rodovia elaborado	8,56	1,97	23,03	352.333,28	98,54	%	Atrasado	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000098 Proj. Rest. Pavim. SC-469, Tr. Entr. SC-390 - Alto Bela Vista - Balsa Divisa SC/RS	282 Projeto de rodovia elaborado	8,06	2,64	32,81	207.069,99	78,09	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000118 Projeto melhoramento aum. capac. SC-401, Tr Sto A. Lisboa - Entr. SC404 (Lagoa Conceição)	282 Projeto de rodovia elaborado	3,02	0,92	30,47	107.233,52	36,08	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000119 Projeto de Restauração da rodovia SC-404, Tr. Morro da lagoa - Lagoa da Conceição	282 Projeto de rodovia elaborado	0,45	0,00	0,04	7.131,51	12,35	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000120 Proj. Duplicação Rest. via existente e implant ciclovia tr. Entr. SC-401-Itacorubi-L. Conc	282 Projeto de rodovia elaborado	1,00	0,13	12,75	70.924,88	61,62	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000122 Proj. duplicação e implant. ciclovia SC-406, Tr. Entr. SC-405 (Morro das pedras) - Armação	282 Projeto de rodovia elaborado	1,47	0,26	17,43	95.191,65	76,62	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000124 Proj. duplicação implan. ciclovia SC-405, Tr. Entr. SC-401 na Costeira - SC-406(Campeche)	282 Projeto de rodovia elaborado	3,26	0,70	21,46	99.797,92	75,42	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000125 Proj. rest. implan. ciclovia na SC-402, Tr. Entr. SC-401 (p/ Jurerê) - final jurisdição	282 Projeto de rodovia elaborado	2,66	1,11	41,55	51.582,93	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000134 Proj. rest. aum. capac. acesso a Princesa, Tr. Entr. BR-163 (S. José Cedro) - Princesa	282 Projeto de rodovia elaborado	1,03	0,27	26,24	63.947,00	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000137 Proj. obras rest. SC-390, tr. Pé da Serra do Rio do Rastro - Contorno Viário Lauro Muller	282 Projeto de rodovia elaborado	6,05	3,11	51,46	131.650,60	90,86	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000138 Proj. obras rest. aum. capac. Rod. SC-155. tr. Entr. SC-283 (Seara) - Entr. SC-154 (Itá)	282 Projeto de rodovia elaborado	2,04	0,53	26,12	0,00	0,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000139 Proj. duplicação Rod. planejada acesso ao Porto de Imbituba, Tr BR-101 - Porto de Imbituba	282 Projeto de rodovia elaborado	0,47	0,02	4,28	106.898,02	99,34	%	Atrasado	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000140 Proj. rest. SC-110, Tr Ituporanga - Petrolândia e Seg. pavim, tr Petrolândia - BR-282	282 Projeto de rodovia elaborado	6,92	3,49	50,44	120.724,49	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000147 Projeto de Implant. e Pavim. da Rodovia SC-110, Tr: Petrolândia - Entr. BR-282	282 Projeto de rodovia elaborado	14,76	2,97	20,15	166.495,30	62,56	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000148 Projeto e Rest. e Melhoramentos SC-477, Tr: Benedito Novo - Indaial (Entr. BR-470)	282 Projeto de rodovia elaborado	4,13	0,64	15,56	70.537,50	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000149 Projeto de Restauração da Rodovia SC-114, Tr. Entr. BR-470 - Otacílio Costa	282 Projeto de rodovia elaborado	5,35	2,50	46,78	122.098,50	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000174 Projeto de duplicação e aumento de capacidade das rodovias SC-416 e SC-417	282 Projeto de rodovia elaborado	7,06	2,85	40,40	524.388,45	87,11	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2021OE000175 Revisão do projeto de implant. e pavim. da SC-435, trecho São Bonifácio - São Martinho	282 Projeto de rodovia elaborado	10,65	7,90	74,18	675.689,59	92,01	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000008 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Ipuauçu na região Oeste/SC Lote 06	282 Projeto de rodovia elaborado	1,90	1,29	68,06	95.328,02	85,08	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000009 Proj. rest. melhoramentos travessia urbana de Jaguaruna na região Sul/SC - Lote 13	282 Projeto de rodovia elaborado	1,35	0,14	10,46	23.583,68	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000010 Proj. rest. melhoramentos travessia urbana de Morro da Fumaça na região Sul/SC - Lote 13	282 Projeto de rodovia elaborado	10,00	6,82	68,21	313.577,12	87,09	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000012 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Pescaria Brava na região Sul/SC Lote 18	282 Projeto de rodovia elaborado	4,14	2,78	67,15	106.342,67	67,15	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000013 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Bom Jesus na região Oeste/SC Lote 04	282 Projeto de rodovia elaborado	1,21	1,08	89,42	61.795,48	89,42	%	Atrasado	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000014 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Abelardo Luz na região Oeste/SC Lote 03	282 Projeto de rodovia elaborado	3,49	2,93	84,01	130.652,89	97,14 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000016 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Imbituba na região Sul/SC Lote 16	282 Projeto de rodovia elaborado	1,52	1,01	66,52	76.978,08	66,53 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000017 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Chapecó na região Oeste/SC Lote 02	282 Projeto de rodovia elaborado	1,30	0,21	15,85	32.900,88	100,00 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000018 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Turvo e Timbé do S. região Sul/SC Lote 15	282 Projeto de rodovia elaborado	4,10	2,13	51,93	155.284,10	58,50 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000019 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Criciúma região Sul/SC Lote 10	282 Projeto de rodovia elaborado	5,33	2,89	54,22	110.386,19	100,00 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000020 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Forquilha região Sul/SC Lote 12	282 Projeto de rodovia elaborado	2,87	0,87	30,35	73.873,59	100,00 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000021 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de São Domingos região Oeste/SC Lote 09	282 Projeto de rodovia elaborado	1,39	0,80	57,34	86.658,71	100,00 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000022 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Chapecó região Oeste/SC Lote 02	282 Projeto de rodovia elaborado	3,85	3,45	89,55	187.677,39	87,32 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000023 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Irani região Oeste/SC Lote 08	282 Projeto de rodovia elaborado	2,98	2,53	85,01	117.308,59	85,02 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000024 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Urussanga região Sul/SC Lote 17	282 Projeto de rodovia elaborado	0,95	0,33	34,32	53.872,50	47,97 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000025 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Braço do Norte região Sul/SC Lote 11	282 Projeto de rodovia elaborado	1,67	0,61	36,57	53.032,62	45,72 %	Atrasado	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000154 Exec. Proj. de obra de arte especial para duplicação da Rod. SC-418, Tr BR-101 - KM 12,2	282 Projeto de rodovia elaborado	0,90	0,44	48,58	187.760,24	99,86 %	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000156 Projeto de implant. pavim. rod. SC-479, tr. Entr. Sc-155 em Abelardo Luz - SC-480 (Ipuçu)	282 Projeto de rodovia elaborado	7,13	1,30	18,18	136.904,99	99,95 %	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000159 Projeto de Rest. Aum. Capac. da rodovia SC-163 com implant. contorno Viário Iporã do Oeste	282 Projeto de rodovia elaborado	3,05	0,48	15,81	285.123,30	74,06 %	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000160 Projeto de obras de implant. pavim. novo traçado na SC-370, transposição Serra Corvo B.	282 Projeto de rodovia elaborado	2,00	0,16	8,20	976.635,84	91,99 %	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000170 Projeto de obras de implantação e pavimentação do contorno de Pinhalzinho	282 Projeto de rodovia elaborado	5,25	2,35	44,85	125.816,81	89,71 %	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000171 Proj. obras restauração aum. capacidade da Rod. SC-154, Tr. Ipumirim até entronc. SC-283	282 Projeto de rodovia elaborado	14,29	4,49	31,44	124.790,41	55,46 %	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000172 Projeto de OAEs rod. SC-402 no viaduto de ac. ao Bal Daniela e pts KMs 1,942 e 0,265 Fpols	282 Projeto de rodovia elaborado	0,40	0,03	7,54	106.681,76	58,36 %	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000173 Projeto obras de implantação e pavimentação do contorno de Monte Carlo	282 Projeto de rodovia elaborado	2,68	0,25	9,31	44.426,17	22,21 %	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000174 proj. obras de pavim. e implantação da Rod. SC-408, Tr. Leoberto Leal - Alfredo Wagner	282 Projeto de rodovia elaborado	11,60	0,99	8,50	60.355,38	30,18 %	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000175 Projeto Geotécnico parte integrante do Projeto rodoviário do contorno de Curitibanos	282 Projeto de rodovia elaborado	2,87	2,51	87,55	89.766,58	87,56 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000176 Proj. eng. implantação de 2 áreas de escape na Rod. SC-464, Tr. SC-465 - Salto veloso	282 Projeto de rodovia elaborado	0,30	0,06	18,99	26.486,17	89,47 %	Em andamento	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000177 Proj Rest. Aum. Capac. Rod. SC-421, Tr. Entr. SC-110 em Pomerode com a BR-470 em Blumenau	282 Projeto de rodovia elaborado	3,93	0,21	5,45	214.192,55	60,71	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000286 Projeto para obras de impl. pavim. SC-465, tr. Salto Veloso - Treze Tílias incl e contorno	282 Projeto de rodovia elaborado	9,90	0,39	3,90	24.041,93	39,66	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000287 Estudos e Projetos inters. SC-350 (Lebon Régis) - Lote 03 - Região M. Oeste e Planalto	282 Projeto de rodovia elaborado	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000288 Proj. implant. duplic. rest. rod. SC-415, Tr. Entr. ac. Bal. Capri - Entr. BR-280 (p/ SFS)	282 Projeto de rodovia elaborado	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000289 Estudos geotécnicos p/ projeto de contenção SC-350 entre Ituporanga e Alfredo Wagner	282 Projeto de rodovia elaborado	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2022OE000290 Estudos geotécnicos p/ projeto de implant. passarela de pedestres na SC-403	282 Projeto de rodovia elaborado	2,87	0,00	0,00	8.501,50	14,21	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014513	2021OE000087 Estudo Conformidade Ambiental (ECA e (EAS) trecho: SC-283 que corta a GLEBA I da FLONA	098 Estudo realizado	0,17	0,00	0,00	21.378,60	17,51	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014513	2021OE000104 Proj. contenção escorregamento na SC-110, Km 401, Tr. Urubici - Entr. SC-390	098 Estudo realizado	0,90	0,44	48,58	227.570,97	96,96	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014513	2021OE000171 Gerenciamento, exec. prog. ambientais relativas as obras da SC-370 (Serra Corvo Branco)	098 Estudo realizado	0,60	0,30	50,15	739.067,50	96,67	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014513	2021OE000182 Projeto contenção de talude rod. SC-340, Tr. entr. acesso Dona Emma - Presidente Getúlio	098 Estudo realizado	0,30	0,06	19,02	7.125,05	15,90	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014513	2021OE000183 Proj. contenção na SC-486, tr. D. Joaquim - Botuverá (Seg 1), SC-412, tr. Ilhota - Gaspar	098 Estudo realizado	0,55	0,42	75,53	67.599,90	95,02	%	Atrasado	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014513	2021OE000202 Supervisão, Gerenciamento e Exec. programas ambientais obras do acesso Norte de Blumenau	098 Estudo realizado	0,25	0,06	25,53	646.534,56	91,55	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014513	2022OE000066 Prog. monitoramento de fauna e levantamento de áreas críticas atrop. na malha rod. de SC	098 Estudo realizado	0,70	0,21	29,97	258.649,37	93,25	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014516	2021OE000054 Projeto de obras de transposição do canal de acesso a lagoa de Sto Antônio - Laguna/SC	098 Estudo realizado	0,42	0,22	52,45	1.558.473,51	88,65	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014516	2022OE000056 Execução de batimetria na região das pontes entre o continente e a ilha de SC em Fpolis	098 Estudo realizado	0,36	0,11	31,67	190.750,00	100,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014516	2022OE000163 Proj. de OAE e contenções p/ pavim. e implant. SC-108, tr. BR-470 - Serra da Vila Itoupava	098 Estudo realizado	0,70	0,17	24,92	437.532,78	76,79	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014516	2022OE000282 Estudo de viabilidade (EVTEA) para implantação epavim. do corredor rod. do vale do Itajaí	098 Estudo realizado	0,30	0,00	0,00	1.500,00	0,67	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014517	2021OE000085 Proj. reab. SC-108, T. Gaspar-Brusque, Pavim. SC-465, T. Macieira-Arroio T. e SC-492,T S.M	282 Projeto de rodovia elaborado	16,15	15,82	97,95	0,00	0,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014517	2021OE000111 Proj. Pavim. SC-110/446, Tr. P. Nereu-Dist. Salseiro, Cont. O. Rio do Sul e Leste Ituporan	282 Projeto de rodovia elaborado	35,50	23,28	65,57	0,00	0,00	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014749	2021OE000198 Supervisão + Obras da Rodovia SC-484, trecho Guatambu - Caxambu do Sul.	288 Rodovia pavimentada	2,89	1,29	44,51	11.041.720,84	94,68	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014749	2022OE000158 Supervisão + Obras na rod. SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS (Serra do Faxinal)	288 Rodovia pavimentada	4,69	0,04	0,90	2.827.225,16	94,06	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014749	2022OE000161 Supervisão + obras de pavimentação da rodovia SC-281, trecho Ituporanga - Atalanta	288 Rodovia pavimentada	3,86	0,13	3,27	2.187.216,25	84,74	%	Em andamento	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014749	2022OE000300 Supervisão + Obras de implant. e pavim. da rod. Mosenhor Quinto Davide Baldessar	288 Rodovia pavimentada	0,57	0,00	0,00	164.597,86	21,71	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014749	2022OE000302 Supervisão + obras de implant. e pavim. da rod. SC-462, Tr. Matos Costa - Entr. BR-153	288 Rodovia pavimentada	0,80	0,00	0,00	140.523,93	98,29	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014749	2022OE000303 Supervisão + obras de Implant. e pavim. da SC-436, tr. São Martinho - Inters. SC-437	288 Rodovia pavimentada	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014749	2022OE000304 Supervisão + Obras de implant. pavim. da Rod. SC-108, trecho Anitápolis - Sta Rosa de Lima	288 Rodovia pavimentada	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014774	2022OE000088 Obras Rest. Aum. Capac. SC-155, Tr: entronc. BR-280 até a ponte sobre o rio Chapecó	289 Rodovia reabilitada	13,76	11,79	85,67	15.137.970,98	94,98	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014777	2021OE000153 Supervisão + obra recuperação do pavim. acesso Mirim Doce, Tr. Entr. BR-470 - Mirim Doce	289 Rodovia reabilitada	7,70	6,93	90,00	12.365.092,80	95,88	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015033	2021OE000058 Supervisão e obras de duplicação do acesso industrial no município de Joinville	195 Obra executada	1,00	0,75	75,11	10.219.099,83	88,52	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015033	2022OE000043 Pavimentação da Rodovia SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos	195 Obra executada	1,00	0,93	93,02	13.065.282,26	93,62	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015046	2022OE000152 Supervisão + obras na rodovia SC-456, trecho Abdon Batista - Vargem	288 Rodovia pavimentada	0,04	0,00	2,41	3.179.760,53	82,45	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015047	2021OE000018 Obras + Supervisão da Rodovia SC-108, Tr. Entronc. BR-101 até a rua Ten. Antônio João	289 Rodovia reabilitada	5,70	4,28	75,11	6.377.615,26	93,75	%	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015047	2022OE000314 Superv. + Obras implant. do elevado do eixo industrial da rua Dona Francisca em Joinville	289 Rodovia reabilitada	0,25	0,00	0,00	107.579,30	89,65	%	Em andamento	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015065	2022OE000306 Supervisão + obras de rest. aum. capac. SC-108, tr. Major Gercino - Angelina	288 Rodovia pavimentada	2,60	0,00	0,00	100.837,90	8,07	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015101	2022OE000309 Supervisão + Obras de implant. pavim. da rod. SC-156, tr. Divisa SC/PR até São Domingos	288 Rodovia pavimentada	2,35	0,00	0,00	406.914,23	81,05	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015102	2022OE000312 Supervisão + Obras de implant. pavim. rod. SC-154, Tr. Faxinal dos Guedes - Ipumirim	288 Rodovia pavimentada	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015103	2021OE000190 Obras + Superv. da rod. SC-350, trecho Abelardo Luz - passos Maia, Lotes 01 e 02	288 Rodovia pavimentada	25,86	0,93	3,60	4.868.174,90	71,94	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015105	2022OE000128 Supervisão + obras de implant. pavim. rod. SC-281, Tr. S. Pedro de Alcântara - Angelina	288 Rodovia pavimentada	4,56	0,06	1,22	1.867.529,11	87,86	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015106	2022OE000130 Supervisão + obras da rodovia SC-492, trecho São M. da Boa Vista - Romelândia	288 Rodovia pavimentada	3,01	0,12	3,95	2.646.314,61	97,11	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015109	2022OE000162 Superv. + Obras restaur. rod. SC-340, Tr. Entr. BR-280 (p/ P. União) - Dist. Sta Cruz Timbó	289 Rodovia reabilitada	6,27	0,69	10,99	3.036.149,87	93,05	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015116	2021OE000216 Superv. + Obras de Rest. da rod. SC-110, trecho Pé da Serra (p/ Jaraguá do Sul) - Pomerode	289 Rodovia reabilitada	5,50	0,86	15,60	7.172.963,23	84,25	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015124	2021OE000092 Supervisão e obras de implantação e pavim. Rod. SC-451, Tr. Frei Rogerio - Fraiburgo	288 Rodovia pavimentada	12,31	0,44	3,56	1.142.496,57	100,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015136	2022OE000131 Supervisão + obras de pavim. da SC-414, tr. Luiz Alves - Entr. SC-108 (p/ Massaranduba)	288 Rodovia pavimentada	4,48	0,15	3,31	2.593.085,73	87,39	%	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015138	2022OE000311 Superv. + Obras de reabilit. aum. capac. rod. SC-108, trecho Guarimirim - Massaranduba	289 Rodovia reabilitada	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Fevereiro/2023



530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015142	2021OE000210 Supervisão + Obras implant. pavim. SC-108, tr. Jacinto machado - Praia Grande	195 Obra executada	0,50	0,05	10,13	9.596.201,78	80,20 %	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015149	2021OE000193 Supervisão + Obra de restauração da SC-443 (Acesso Sangão), trecho BR-101 - Sangão	195 Obra executada	1,00	0,86	86,31	5.675.845,19	77,71 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015152	2022OE000135 Obras de Implantação e Pavimentação do Anel Viário de Criciúma	195 Obra executada	0,60	0,02	3,82	933.194,64	65,08 %	Em andamento	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015164	2022OE000157 Supervisão + Obras de implant. pavim.	288 Rodovia pavimentada	7,20	0,73	10,14	1.759.933,12	96,34 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015171	2021OE000192 Apoio a obra federal em SC, BR-470, trecho Navegantes - Indaial - Vale do Itajaí	917 Aporte realizado	0,80	0,56	70,00	175.253.942,01	98,68 %	Atrasado	Fevereiro/2023
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015194	2022OE000310 Supervisão + Obras de implant. pavim da rod SC-370, tr. Urubici - Rio Rufino	288 Rodovia pavimentada	2,90	0,00	0,04	1.147.168,79	84,10 %	Em andamento	Fevereiro/2023
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2020OE000007 Bem Público - Construção do Presídio Feminino em Joinville	933 Unidade construída	1,00	0,89	89,22	1.886.488,73	100,00 %	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2021OE000001 Construção Unidade de Saúde Penitenciária de Chapecó	933 Unidade construída	1,00	0,72	71,87	61.562,28	28,98 %	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2021OE000030 Implantação e pavimentação de acesso a UPA de Brusque	933 Unidade construída	1,00	0,76	75,60	742.126,41	65,24 %	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2021OE000038 Ampliação da Penitenciária de São Cristóvão do Sul (Unidade II)	933 Unidade construída	1,00	0,92	91,79	40.554,96	23,47 %	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2021OE000039 Construção de 09 (nove) galpões no Complexo Penitenciário de Chapecó	933 Unidade construída	9,00	8,98	99,81	4.031.007,32	99,78 %	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2021OE000041 Construção de 03 (TRÊS) galpões no Complexo Penitenciário de Canhanduba Itajaí	933 Unidade construída	3,00	2,56	85,48	1.448.301,77	85,29 %	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2022OE000003 Ampliação e Reforma no Presídio Regional de Joinville	933 Unidade construída	98,00	96,48	98,45	10.308.288,85	98,41 %	Em andamento	Dezembro/2022



540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2022OE000004	Construção Muralha Penitenciária de São Cristóvão do Sul	933 Unidade construída	1,00	0,05	5,10	41.850,03	4,13	%	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2022OE000005	Ampliação de ambientes na ala de segurança máxima da Penitenciária de São Cristóvão do Sul	933 Unidade construída	1,00	0,71	70,75	1.119.121,98	70,76	%	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2022OE000012	Unidade Prisional Semi-Aberto na cidade de Tubarão	933 Unidade construída	0,20	0,02	12,34	1.908.625,95	99,99	%	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2022OE000013	ETE Presídio de Tubarão	933 Unidade construída	1,00	0,35	35,00	43.083,25	35,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2022OE000015	Terraplanagem para construção de unidade prisional no Complexo Penitenciário de Chapecó	933 Unidade construída	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2022OE000016	Construção de galpões de compostagem no Complexo Penitenciário de Chapecó e São Cristóvão	933 Unidade construída	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2022OE000017	Construção muralha CASEP de Concórdia	933 Unidade construída	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2022OE000018	Construção Muralha CASE de Chapecó	933 Unidade construída	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	012536	2022OE000021	Construção do acesso para Complexo de Segurança de Biguaçu	801 Área construída	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Em andamento	Janeiro/2023
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	012548	2022OE000019	Construção da Penitenciária Industrial de São Bento do Sul	801 Área construída	1.750,00	1.416,63	80,95	9.419.940,59	91,08	%	Em andamento	Janeiro/2023
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	014886	2021OE000004	Elaboração de projetos para construção de Presídio no município de Biguaçu	801 Área construída	1,00	0,66	65,57	152.407,62	55,41	%	Em andamento	Dezembro/2022
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	014886	2021OE000020	Elaboração de projetos para construção do semiaberto de Criciúma e Blumenau	801 Área construída	2,00	0,47	23,45	95.149,70	24,98	%	Atrasado	Fevereiro/2023
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	015394	2022OE000007	Implantação do sistema de esgotamento sanitário p/ atender penitenciária de São Bento Sul	511 Equipamento fornecido	1,00	0,50	50,00	499.531,21	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2022
								1.324.221.919,17				



2.2.2 Projetos em Andamento do Orçamento de Investimento

Abaixo estão relacionados os projetos cadastrados e atualizados até 31/12/2022 ou mais que se encontram nas situações: em andamento, atrasado ou paralisado das unidades gestoras dos orçamentos de investimento. A coluna “Real. Financeiro” representa o valor financeiro realizado no objeto de execução que a própria unidade gestora informou no SIGEF.

Unidade Gestora	Subaçã o	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico		Real. Financeiro	Status	Atualizado
410021 CELESC Geração S.A.	014182	2022OE000010 Integralização de capital em SPEs	878 Aporte de capital em SPEs	unidade	100,00	100,00	100,00	%	3.712.300,00	Em andamento	Dezembro/2022
410021 CELESC Geração S.A.	014184	2022OE000001 Construção de UHE/PCH/CGH	400 Usina construída	MW	100,00	0,00	0,00	%	4.682.819,66	Em andamento	Dezembro/2022
410021 CELESC Geração S.A.	014186	2022OE000004 Melhorias de UHE/PCH/CGH	209 Usina melhorada	unidade	100,00	200,00	200,00	%	6.067.897,94	Em andamento	Dezembro/2022
410021 CELESC Geração S.A.	014189	2022OE000007 Aquisição de veículos	343 Veículo adquirido	unidade	100,00	200,00	200,00	%	513.200,00	Em andamento	Dezembro/2022
410021 CELESC Geração S.A.	014191	2022OE000008 Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação	376 Software contratado	unidade	100,00	300,00	300,00	%	116.428,60	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	000526	2022OE000002 Construção subestação alta tensão	315 Subestação construída	unidade	100,00	50,00	50,00	%	75.782.285,78	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	000583	2022OE000004 Ampliação subestação alta tensão	314 Subestação ampliada	unidade	100,00	50,00	50,00	%	5.999.915,27	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	000599	2022OE000005 Construção de linha de transmissão de alta tensão	158 Linha construída	km	100,00	54,36	54,36	%	215.573.008,45	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	000744	2022OE000006 Ampliação rede distribuição elétrica	268 Rede de distribuição urbana ampliada	unidade	100,00	104,85	104,85	%	298.140.805,19	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	000812	2022OE000009 Melhoria rede distribuição elétrica	269 Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	100,00	72,31	72,31	%	35.675.098,25	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	000922	2022OE000010 Construção de alimentadores	011 Alimentador de distribuição construído	km	100,00	65,99	65,99	%	28.383.613,88	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	000923	2022OE000026 Equipamentos especiais rede e acessórios	093 Equipamento e material adquirido	unidade	100,00	100,00	100,00	%	20.413.684,15	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	000941	2022OE000011 Aquisição de veículos	343 Veículo adquirido	unidade	100,00	165,00	165,00	%	33.050.834,69	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	000949	2022OE000012 Pesquisa e desenvolvimento	244 Programa gerenciado	unidade	100,00	220,00	220,00	%	8.980.458,93	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	000952	2022OE000021 Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação	092 Equipamento adquirido	unidade	100,00	56,51	56,51	%	13.979.594,04	Em andamento	Dezembro/2022



410022 CELESC Distribuição S.A.	000953	2022OE000022 Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação	376 Software contratado	unidade	100,00	140,00	140,00	%	46.319.119,02	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	001573	2022OE000013 Implantação de sistema de telecomunicações de dados e de rádio	312 Sistema implantado	unidade	100,00	101,92	101,92	%	1.619.604,76	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	011576	2022OE000014 Implantação de sistema de telecomunicações de dados e de rádio	861 Sistema de rádio instalado	unidade	100,00	100,00	100,00	%	2.836.786,68	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	014196	2022OE000020 Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos - Distribuição	092 Equipamento adquirido	unidade	100,00	769,09	769,09	%	6.105.272,34	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	014197	2021OE000021 Aquisição de mobiliário, conforto e ferramental	092 Equipamento adquirido	unidade	25,00	25,00	100,00	%	1.222.548,94	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	014199	2022OE000027 Aquisição de mobiliário - Administração Central	337 Unidade adquirida	unidade	100,00	100,00	100,00	%	4.192.394,70	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	014786	2022OE000018 Apropriação da mão de obra	284 Rede de distribuição ampliada	%	100,00	40,72	40,72	%	63.409.442,56	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	014798	2022OE000019 Projeto de Combate de Perdas	269 Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	100,00	124,49	124,49	%	2.717.102,04	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	015077	2022OE000025 Projeto telemedicação grupo b - rede inteligente	244 Programa gerenciado	unidade	100,00	245,94	245,94	%	6.269.248,91	Em andamento	Dezembro/2022
410022 CELESC Distribuição S.A.	015078	2022OE000023 Licenciamento ambiental	337 Unidade adquirida	unidade	100,00	54,55	54,55	%	468.693,58	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	002008	2021OE000004 Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos - região SUL de SC	195 Obra executada	unidade	66,66	50,00	75,01	%	2.658.367,57	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	002008	2021OE000005 Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos - região NORTE de SC	195 Obra executada	unidade	66,66	50,00	75,01	%	4.432.194,14	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	002008	2021OE000006 Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos- região OESTE de SC	195 Obra executada	unidade	66,66	50,00	75,01	%	2.293.620,43	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	002008	2021OE000007 Ampl. e renovação do parque de hidrometria e equiptos diversos - região METROPOLITANA de SC	195 Obra executada	unidade	66,66	50,00	75,01	%	4.113.596,32	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	002008	2021OE000008 Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos da GCO	195 Obra executada	unidade	66,66	50,00	75,01	%	83.816.463,72	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	009592	2020OE000075 Aquisição de veículos	950 Programa implantado	unidade	75,00	50,00	66,67	%	28.615.615,02	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	009596	2020OE000068 Aquisição de equipamentos de laboratório	950 Programa implantado	unidade	75,00	50,00	66,67	%	1.432.401,92	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	010554	2021OE000013 Implantação do SIA Chapecó, Xanxerê, Xaxim e Cordilheira Alta	195 Obra executada	unidade	23,00	23,00	100,00	%	130.236.056,54	Em andamento	Dezembro/2022



410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013025	2020OE000069 Adequação de infraestruturas vinculadas à MATRIZ da CASAN em SC	950 Programa implantado	unidade	75,00	50,00	66,67	%	1.353.402,71	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013025	2020OE000070 Adequação de infraestruturas vinculadas à região SUL da CASAN em SC	950 Programa implantado	unidade	75,00	50,00	66,67	%	234.232,53	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013025	2020OE000071 Adequação de infraestruturas vinculadas à região NORTE/VALE da CASAN em SC	950 Programa implantado	unidade	75,00	50,00	66,67	%	209.312,04	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013025	2020OE000072 Adequação de infraestruturas vinculadas à região OESTE da CASAN em SC	950 Programa implantado	unidade	75,00	50,00	66,67	%	607.438,95	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013025	2020OE000073 Adequação de infraestruturas vinculadas à região METROPOLITANA da CASAN em SC	950 Programa implantado	unidade	75,00	50,00	66,67	%	262.853,21	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013028	2021OE000009 Desenvolvimento do controle e gestão através da elaboração de estudos e projetos	950 Programa implantado	unidade	66,66	50,00	75,01	%	7.496.850,13	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013033	2020OE000074 Aquisição de softwares e equipamentos de informática	950 Programa implantado	unidade	75,00	50,00	66,67	%	3.019.968,98	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013057	2020OE000025 Melhorias Operacionais do SAA São José - Reservatórios e Rede de Distribuição	195 Obra executada	unidade	95,00	95,00	100,00	%	647.634,34	Atrasado	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013057	2020OE000036 Exp., melh e ampl. das redes de distribuição e boosters de água-região SUL da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	7.850.945,19	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013057	2020OE000037 Exp., melh e ampl. das redes de dist. e boosters de água-região NORTE/VALE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	14.323.803,60	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013057	2020OE000038 Exp., melh e ampl. das redes de distribui. e boosters de água-região OESTE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	1.515.165,37	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013057	2020OE000039 Exp.,melh e ampl.das redes de dist. e boosters de água-região METROPOLITANA da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	40.324.908,92	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013058	2020OE000060 Exp., melh e ampl. das redes de esgotamento sanitário- Região SUL da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	11.483.712,94	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013058	2020OE000061 Exp., melh e ampl. das redes de esgotamento sanitário- Região NORTE/VALE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	1.914.563,82	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013058	2020OE000062 Exp., melh e ampl. das redes de esgotamento sanitário - Região OESTE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	1.806.586,84	Em andamento	Dezembro/2022



410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013058	2020OE000063 Exp., melh e ampl. das redes de esgotamento sanitário- Região METROPOLITANA da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	12.541.481,70	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014724	2020OE000003 Perfuração de poços para captação de água da região SUL da CASAN de SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	482.070,38	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014724	2020OE000028 Perfuração de poços para captação de água da região NORTE/VALE da CASAN de SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	2.196.964,60	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014724	2020OE000029 Perfuração de poços para captação de água da região OESTE da CASAN de SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	7.360.566,39	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014724	2020OE000030 Perfuração de poços para captação de água da região METROPOLITANA da CASAN de SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	761.447,60	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014724	2021OE000001 Perfuração de poços para captação de água - Obras DO	195 Obra executada	unidade	66,66	50,00	75,01	%	1.987.400,00	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014725	2020OE000026 Ampl Sistema de Captação e Adução Água Bruta no Rio Cubatão do SIA Grande Fpolis	195 Obra executada	unidade	98,00	98,00	100,00	%	598.343,15	Atrasado	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014725	2020OE000031 Expansão, melhorias e ampliação das captações de água - região SUL da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	2.155.638,82	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014725	2020OE000032 Expansão, melhorias e ampliação das captações de água - região NORTE/ VALE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	10.290,10	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014725	2020OE000033 Expansão, melhorias e ampliação das captações de água - região OESTE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	2.493.128,17	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014725	2020OE000034 Expansão, melhorias e ampliação das captações de água- região METROPOLITANA da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	340.887,36	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014726	2020OE000040 Expansão, melhorias e ampliação da reservação de água - região SUL da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	6.870.517,24	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014726	2020OE000041 Expansão, melhorias e ampliação da reservação de água - região NORTE/VALE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	61.997.077,73	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014726	2020OE000042 Expansão, melhorias e ampliação da reservação de água - região OESTE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	33.846.854,09	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014726	2020OE000043 Expansão, melhorias e ampliação da reservação de água- região METROPOLITANA da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	7.208.051,69	Em andamento	Dezembro/2022



410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014726	2021OE000002	Expansão, melhoria e ampliação de reservação de água - Obras DO	195 Obra executada	unidade	66,66	50,00	75,01	%	15.350,01	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2020OE000044	Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de água - Região SUL da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	440.316,00	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2020OE000045	Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de água - Região NORTE/VALE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	10.168.396,07	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2020OE000046	Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de água - Região OESTE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	10.556.796,29	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2020OE000047	Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de água- Região METROPOLITANA da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	27.636.046,87	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2022OE000002	Ampliação da Estação de Tratamento de Água do município de Braço do Norte/SC	195 Obra executada	unidade	0,05	0,00	0,00	%	0,00	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2022OE000003	Ampliação da Estação de Tratamento de Água no município de Biguaçu / SC	195 Obra executada	unidade	50,00	50,00	100,00	%	5.980.731,66	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2022OE000005	Implantação da nova ETA do município de Rio do Sul / SC	195 Obra executada	unidade	50,00	50,00	100,00	%	122.238,21	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2022OE000010	Expansão, Melhoria e Ampliação das Estações de Tratamento de Água - Obras DO	195 Obra executada	unidade	66,66	50,00	75,01	%	834.311,10	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014728	2020OE000048	Exp., melh e ampl. das adutoras de água bruta e ERAB - Região SUL da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	1.923.514,29	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014728	2020OE000049	Exp., melh e ampl. das adutoras de água bruta e ERAB - Região NORTE/VALE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	79.416,26	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014728	2020OE000050	Exp., melh e ampl. das adutoras de água bruta e ERAB - Região OESTE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	16.671.606,14	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014728	2020OE000051	Exp., melh e ampl. das adutoras de água bruta e ERAB - Região METROPOLITANA da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	0,00	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014728	2021OE000011	Ampliação do sistema de Adução de Água Bruta do SIA Grande Criciúma	195 Obra executada	unidade	98,00	98,00	100,00	%	5.439.350,36	Atrasado	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014728	2022OE000019	Ampliação Adutora Água Bruta de São Miguel do Oeste trecho Rio das Flores/ Cambui	195 Obra executada	unidade	1,00	1,00	100,00	%	9.591.313,10	Em andamento	Dezembro/2022



410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014729	2020OE000052 Exp., melh e ampl. das adut. de água tratada e ERAT's- Região SUL da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	1.568.568,74	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014729	2020OE000053 Exp., melh e ampl. das adut. de água tratada e ERAT's- Região NORTE/VALE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	228.969,99	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014729	2020OE000054 Exp., melh e ampl. das adut. de água tratada e ERAT's- Região OESTE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	0,00	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014729	2020OE000055 Exp., melh e ampl. das adut. de água tratada e ERAT's- Região METROPOLITANA da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	0,00	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014729	2022OE000001 Implantação de Adutora de Água Tratada São José e Biguaçu	195 Obra executada	unidade	32,00	32,00	100,00	%	5.650.698,52	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014729	2022OE000020 Implantação Adutora Água tratada no SAA Barra Velha Bairro Itajuba AAT 300/ 400mm	195 Obra executada	unidade	7,00	7,00	100,00	%	0,00	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014730	2020OE000057 Exp., melh e ampl. das estações elevatórias de esgoto -Região NORTE/VALE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	2.815.082,39	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014730	2020OE000058 Exp., melh e ampl. das estações elevatórias de esgoto- Região OESTE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	120.891,07	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014730	2020OE000059 Exp., melh e ampl. das estações elevatórias de esgoto -Região METROPOLITANA da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	297.471,60	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014731	2020OE000064 Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de esgoto - Região SUL da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	1.158.196,38	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014731	2020OE000065 Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de esgoto - Região NORTE/VALE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	95.078,10	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014731	2020OE000066 Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de esgoto - Região OESTE da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	210.000,00	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014731	2020OE000067 Exp., melh e ampl. das estações de tratam de esgoto- Região METROPOLITANA da CASAN em SC	195 Obra executada	unidade	75,00	50,00	66,67	%	5.015.363,94	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014731	2022OE000009 Implantação da Nova ETE Potecas no município de São José/ SC	195 Obra executada	unidade	3,00	3,00	100,00	%	816.484,24	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2020OE000007 Implantação do SES Balneário Barra do Sul	195 Obra executada	unidade	77,00	77,00	100,00	%	19.133.176,86	Em andamento	Dezembro/2022



410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2020OE000008 Implantação do SES Balneário Piçarras	195 Obra executada	unidade	96,00	96,00	100,00	%	0,00	Atrasado	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2020OE000011 Ampliação do SES Criciúma (Próspera)	195 Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	5.478.664,57	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2020OE000012 Ampliação do SES Criciúma (São Luiz)	195 Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	571.934,81	Atrasado	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2020OE000014 Ampliação do SES Florianópolis (Campeche)	195 Obra executada	unidade	60,00	39,94	66,57	%	0,00	Paralisado	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2020OE000015 Ampliação do SES Florianópolis (Ingleses e Santinho)	195 Obra executada	unidade	75,00	75,00	100,00	%	18.568.673,75	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2020OE000016 Ampl. SES Fpolis (Saco Gde, Mte Verde, João Paulo e Conexão Sto Antonio, Sambaqui e Cacupé)	195 Obra executada	unidade	26,00	26,00	100,00	%	32.454.937,04	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2020OE000020 Implantação do SES Ipira/ Piratuba	195 Obra executada	unidade	89,00	89,62	100,70	%	0,00	Atrasado	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2020OE000023 Implantação do SES Rio do Sul	195 Obra executada	unidade	62,00	62,00	100,00	%	5.043.611,51	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2020OE000024 Ampliação do SES Santo Amaro da Imperatriz	195 Obra executada	unidade	46,00	46,00	100,00	%	1.607.198,69	Atrasado	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2020OE000077 Readequação do SES Itá	195 Obra executada	unidade	100,00	64,00	64,00	%	1.376.639,19	Atrasado	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2021OE000010 Superv e Fiscaliz de obras JICA p/ ampliação de SES nos municípios litorâneos	195 Obra executada	unidade	64,00	64,00	100,00	%	5.251.206,39	Atrasado	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2021OE000012 Ampliação do SES Florianópolis (Ampliação da ETE Insular e Bacias D e F)	195 Obra executada	unidade	49,00	50,00	102,04	%	86.882.416,63	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2022OE000004 Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Xanxerê / SC	195 Obra executada	unidade	16,00	16,00	100,00	%	2.026.492,41	Atrasado	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2022OE000007 Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Mafra/ SC	195 Obra executada	unidade	35,00	35,00	100,00	%	10.106.086,16	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2022OE000008 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Urupema / SC	195 Obra executada	unidade	92,00	92,00	100,00	%	1.300.883,63	Em andamento	Dezembro/2022



410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2022OE000012 Melhorias e Ampliação ETE São Joaquim - Fase 2	195 Obra executada	unidade	5,00	5,00	100,00	%	246.931,66	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2022OE000013 Ampliação SES Catanduvas - Loteamento Pinheiros	195 Obra executada	unidade	35,00	35,00	100,00	%	0,00	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2022OE000014 Ampliação SES Piçarras - Bacias 5 e 6	195 Obra executada	unidade	3,00	3,00	100,00	%	0,00	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2022OE000015 Implantação SES São Lourenço do Oeste	195 Obra executada	unidade	4,00	4,00	100,00	%	0,00	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2022OE000016 Implantação SES Urubici - Av. Adolfo Konder	195 Obra executada	unidade	1,00	1,00	100,00	%	0,00	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2022OE000017 Implantação SES Xaxim - Complementação	195 Obra executada	unidade	8,00	8,00	100,00	%	497.754,87	Em andamento	Dezembro/2022
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2022OE000018 Ampliação SES Chapecó - Jd. América e Vila Rica	195 Obra executada	unidade	1,00	0,00	0,00	%	0,00	Em andamento	Dezembro/2022
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	012822	2022OE000015 Reforma e adequação externa do prédio administrativo - Porto de Imbituba	277 Edificação construída ou reformada	unidade	50,00	12,81	25,62	%	61.884,38	Em andamento	Dezembro/2022
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	012824	2022OE000010 Remoção e instalação de cercamento de segurança para o Porto de Imbituba	277 Edificação construída ou reformada	unidade	60,00	28,00	46,67	%	223.802,85	Em andamento	Dezembro/2022
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	012824	2022OE000011 Fornecimento e montagem de porta-paletes e estantes para almoxarifado central	277 Edificação construída ou reformada	unidade	70,00	65,70	93,86	%	149.478,40	Em andamento	Dezembro/2022
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	012825	2022OE000003 Aquisição de periféricos de TI	818 Sistema de informática	unidade	50,00	7,00	14,00	%	8.610,00	Em andamento	Dezembro/2022
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	012825	2022OE000004 Aquisição de periféricos de TI	818 Sistema de informática	unidade	50,00	71,00	142,00	%	70.159,00	Em andamento	Dezembro/2022
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	012825	2022OE000012 Aquisição de computadores, notebooks e tablets para o Porto de Imbituba	818 Sistema de informática	unidade	80,00	30,00	37,50	%	4.319,49	Em andamento	Dezembro/2022
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	012825	2022OE000013 Aquisição de periféricos de TI para o Porto de Imbituba	818 Sistema de informática	unidade	80,00	68,00	85,00	%	15.535,00	Em andamento	Dezembro/2022
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	012828	2020OE000011 Remodelação da rede interna de alta tensão e iluminação das vias	414 Rede elétrica adequada	m	85,00	99,15	116,65	%	569.640,89	Em andamento	Dezembro/2022
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	012828	2021OE000011 Aquisição de nobreaks e bancos de baterias	414 Rede elétrica adequada	m	30,00	23,28	77,60	%	37.170,00	Atrasado	Dezembro/2022
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	014733	2022OE000016 Realização de levant. Geofísico, geotécnico e elab. projeto aprofundamento berços 1 e 3	195 Obra executada	unidade	70,00	66,68	95,26	%	453.384,21	Em andamento	Dezembro/2022
410027 SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A.	014255	2022OE000013 Pavimentar a área operacional da SCPAR Porto de São Francisco do Sul	900 Infraestrutura melhorada	m2	60,00	68,03	113,38	%	1.213.012,50	Em andamento	Dezembro/2022



410027 SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A.	014255	2022OE000018	Pavimentar pátios e vias internas do TGSFS	900 Infraestrutura melhorada	m2	47,00	47,00	100,00	%	1.503.245,22	Em andamento	Dezembro/2022
410027 SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A.	014258	2022OE000016	Elaborar EVTEA de arrendamento do TGSFS	098 Estudo realizado	unidade	60,00	60,00	100,00	%	81.000,00	Em andamento	Dezembro/2022
410027 SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A.	014261	2022OE000004	Aquisição de sistemas de CFTV	052 Sistema mantido	unidade	50,00	32,84	65,68	%	857.654,67	Em andamento	Dezembro/2022
410029 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	014172	2020OE000005	Criar excelência no atendimento	052 Sistema mantido	unidade	75,00	100,00	133,33	%	1.219.764,55	Em andamento	Dezembro/2022
470026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.	014936	2022OE000001	Adquirir infraestrutura para o Data Center	922 Modernização e expansão executada	% de execução	100,00	2,99	2,99	%	113.573,75	Em andamento	Dezembro/2022
470026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.	014939	2022OE000002	Instalar conexões para clientes	893 Unidade implantada	unidade	100,00	77,58	77,58	%	1.318.764,54	Em andamento	Dezembro/2022
470026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.	015203	2022OE000003	Adquirir infraestrutura para a Rede de Governo	922 Modernização e expansão executada	% de execução	100,00	28,36	28,36	%	875.622,22	Em andamento	Dezembro/2022
470026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.	015205	2022OE000004	Adquirir instalações e infraestrutura interna para o CIASC	927 Instalação e infraestrutura executada	% de execução	100,00	164,10	164,10	%	984.601,07	Em andamento	Dezembro/2022

Total de 134 projetos em andamento do Orçamento de Investimento com o valor total realizado em 2022 de R\$ 1.685.476.594,85

O presente relatório informou o valor de **R\$ 636.513.268,07** na conservação do patrimônio público no ano de 2022 e o total gasto em subações de projetos em situação Em Andamento, Paralisado ou Atrasado do orçamento de fiscal e de seguridade social no valor de **R\$ 1.324.221.919,17** e no orçamento de investimentos no valor de **R\$ 1.685.476.594,85**.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **RE348M8D**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MAYANA DOS ANJOS DAMIANI** (CPF: 029.XXX.549-XX) em 04/04/2023 às 15:36:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:48:23 e válido até 13/07/2118 - 14:48:23.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **SANDRO LUIZ BARBOSA** (CPF: 839.XXX.091-XX) em 04/04/2023 às 15:49:32
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:06:40 e válido até 13/07/2118 - 15:06:40.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **JORGINHO DOS SANTOS MELLO** (CPF: 250.XXX.199-XX) em 14/04/2023 às 18:48:18
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/04/2023 - 11:54:30 e válido até 14/04/2123 - 11:54:30.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **CLEVERSON SIEWERT** (CPF: 017.XXX.629-XX) em 14/04/2023 às 18:54:48
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 18:34:16 e válido até 02/01/2123 - 18:34:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMDQ0NTRfNDQ1OF8yMDIzX1JFMzQ4TTHe> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00004454/2023** e o código **RE348M8D** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
