Capa do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0020/2026
Nº O.S. : 0126
Situaçao : O.S. totalizada à medição
Data do pedido : 10/06/2026
Descrição do pedido : Revitalização

Tipo do Pedido

Descrição
conservação civil

Situações do Pedido

Data	Descrição	Situaçao	Responsável
25/08/2026	**Pedido totalizado na medição 14.**	**O.S. totalizada à medição**	**Murilo Alves Del Prato**
25/08/2026	APROVADO	O.S. concluída	Murilo Alves Del Prato
25/08/2026	APROVADO	O.S. em execução	Murilo Alves Del Prato
25/08/2026	APROVADO	O.S. em análise INFRA/ COORD	Murilo Alves Del Prato
25/08/2026	APROVADO	O.S. em elaboração	Murilo Alves Del Prato
10/06/2026	PARA APROVAÇÃO	Pedido aprovado COORD	Murilo Alves Del Prato
10/06/2026	PARA APROVAÇÃO	Pedido em análise COORD	Murilo Alves Del Prato
10/06/2026	Iniciando o pedido	Pedido iniciado	Murilo Alves Del Prato

Fotos do Pedido de Manutenção

Pedido

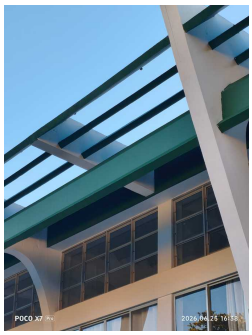
Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0020/2026
Nº O.S. : 0126
Situaçao : O.S. totalizada à medição

Fotos


FOTO 1 - 10/06/2026


FOTO 2 - 10/06/2026


FOTO 3 - 10/06/2026


FOTO 1 - 25/08/2026



FOTO 2 - 25/08/2026


FOTO 3 - 25/08/2026

Ordem de Serviço do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0020/2026
Nº O.S. : 0126
Situaçao : O.S. totalizada à medição

Serviços do Pedido

Ata : PR-00218/2026/SED - MANUTENÇÃO PRÉDIOS GRANDE FLORIANÓPOLIS
Lote : 1 - REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA CRE 18 FPOLIS LOTE 03

Grupo	Código	Descrição	Unid.	Vl Unit	Qtde. O.S.	Qtde. Exec.
9051	CPU124821	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	M2	14,440	**3.964,250**	3.964,250
9051	CPU124836	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, SEMI BRILHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	7,940	**4.806,850**	4.806,850
9051	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	1,290	**431,250**	431,250
9051	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	18,510	**3.638,420**	3.638,420
9051	CPU125013	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 20 cm, brilhante ou acetinado acentado em paredes a meia altura.	M2	76,770	**4.123,200**	4.123,200
9051	CPU125017	RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE FACHADA COM ARGAMASSA ACIII, ESPESSURA ATÉ 3 MM	M2	18,710	**1.976,049**	1.976,049
9051	CPU17184	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM ATÉ 3,0 MM DE ABERTURA, EM FACHADAS E DEMAIS SUPERFÍCIES - ÁREA EXTERNA	M2	3,490	**1.251,450**	1.251,450
9051	CPU17187	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM MAIS DE 3,0 MM DE ABERTURA, EM FACHADAS E DEMAIS SUPERFÍCIES - ÁREA EXTERNA	M2	2,430	**4.783,840**	4.783,840

Totais dos Valores

Valor O.S. : 532.815,83
Valor executado : 532.815,83

Capa do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0023/2026
Nº O.S. : 0107
Situaçao : O.S. totalizada à medição
Data do pedido : 20/06/2026
Descrição do pedido : Revitalização

Tipo do Pedido

Descrição
conservação civil

Situações do Pedido

Data	Descrição	Situaçao	Responsável
23/06/2026	**Pedido totalizado na medição 9.**	**O.S. totalizada à medição**	**Murilo Alves Del Prato**
23/06/2026	Serviços executados	O.S. concluída	Murilo Alves Del Prato
22/06/2026	aPROVADO	O.S. em execução	Murilo Alves Del Prato
22/06/2026	aPROVADO	O.S. em análise INFRA/ COORD	Murilo Alves Del Prato
22/06/2026	Elaboração da O.S. iniciada	O.S. em elaboração	Murilo Alves Del Prato
20/06/2026	Aprovado!	Pedido aprovado COORD	Murilo Alves Del Prato
20/06/2026	Aprovado!	Pedido em análise COORD	Murilo Alves Del Prato
20/06/2026	Iniciando o pedido	Pedido iniciado	Murilo Alves Del Prato

Fotos do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0023/2026
Nº O.S. : 0107
Situaçao : O.S. totalizada à medição

Fotos


Foto 1 - 20/06/2026


Foto 2 - 20/06/2026


Foto 3 - 20/06/2026

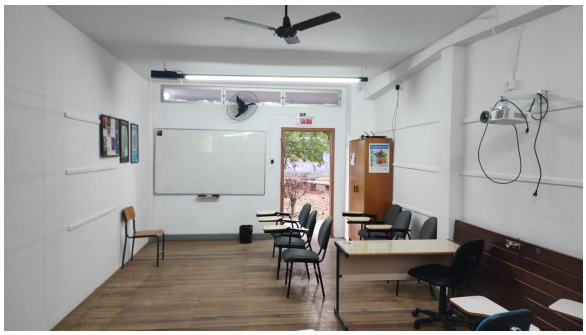

Foto 1 - 23/06/2026


Foto 2 - 23/06/2026


Foto 3 - 23/06/2026

Ordem de Serviço do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0023/2026
Nº O.S. : 0107
Situaçao : O.S. totalizada à medição

Serviços do Pedido

Ata : PR-00218/2026/SED - MANUTENÇÃO PRÉDIOS GRANDE FLORIANÓPOLIS
Lote : 1 - REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA CRE 18 FPOLIS LOTE 03

Grupo	Código	Descrição	Unid.	Vl Unit	Qtde. O.S.	Qtde. Exec.
9051	CPU124821	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	M2	14,440	**3.512,000**	3.512,000
9051	CPU124836	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, SEMI BRILHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	7,940	**3.412,280**	3.412,280
9051	MAT17183	Corante para tinta 4719/ORSE	TB	2,480	**411,000**	411,000
9051	CPU125017	RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE FACHADA COM ARGAMASSA ACIII, ESPESSURA ATÉ 3 MM	M2	18,710	**12.200,000**	12.200,000
9051	CPU17184	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM ATÉ 3,0 MM DE ABERTURA, EM FACHADAS E DEMAIS SUPERFÍCIES - ÁREA EXTERNA	M2	3,490	**2.450,000**	2.450,000
9051	CPU17187	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM MAIS DE 3,0 MM DE ABERTURA, EM FACHADAS E DEMAIS SUPERFÍCIES - ÁREA EXTERNA	M2	2,430	**2.684,000**	2.684,000
9051	CPU124856	PINTURA COM TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM SOBRE SUPERFICIES EM MADEIRA OU METAL. UTILIZADO EM PORTAS, FORROS DE MADEIRA, BEIRAIS DE MADEIRA E PAREDES DE MADEIRA. 2 DEMÃOS	M2	9,830	**2.780,000**	2.780,000
9051	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	18,510	**1.350,000**	1.350,000
9051	CPU125173	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE NANOROCHA E HIDROFUGANTES VISANDO IMPERMEABILIZAÇÃO E RESISTÊNCIA À PICHAÇÃO.	M2	54,590	**2.380,000**	2.380,000

Totais dos Valores

Valor O.S. : 504.400,78
Valor executado : 504.400,78

Capa do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0022/2026
Nº O.S. : 0106
Situaçao : O.S. totalizada à medição
Data do pedido : 20/06/2026
Descrição do pedido : Revitalização

Tipo do Pedido

Descrição
conservação civil

Situações do Pedido

Data	Descrição	Situaçao	Responsável
23/06/2026	**Pedido totalizado na medição 9.**	**O.S. totalizada à medição**	**Murilo Alves Del Prato**
23/06/2026	Serviços executados	O.S. concluída	Murilo Alves Del Prato
22/06/2026	APROVADO	O.S. em execução	Murilo Alves Del Prato
22/06/2026	APROVADO	O.S. em análise INFRA/ COORD	Murilo Alves Del Prato
22/06/2026	Elaboração da O.S. iniciada	O.S. em elaboração	Murilo Alves Del Prato
22/06/2026	Aprovado	Pedido aprovado COORD	Murilo Alves Del Prato
22/06/2026	Aprovado	Pedido em análise COORD	Murilo Alves Del Prato
20/06/2026	Iniciando o pedido	Pedido iniciado	Murilo Alves Del Prato

Fotos do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0022/2026
Nº O.S. : 0106
Situaçao : O.S. totalizada à medição

Fotos


Foto 1 - 20/06/2026


Foto 2 - 20/06/2026


Foto 3 - 20/06/2026



Foto 1 - 23/06/2026


Foto 2 - 23/06/2026


Foto 3 - 23/06/2026

Ordem de Serviço do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0022/2026
Nº O.S. : 0106
Situaçao : O.S. totalizada à medição

Serviços do Pedido

Ata : PR-00218/2026/SED - MANUTENÇÃO PRÉDIOS GRANDE FLORIANÓPOLIS
Lote : 1 - REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA CRE 18 FPOLIS LOTE 03

Grupo	Código	Descrição	Unid.	Vl Unit	Qtde. O.S.	Qtde. Exec.
9051	CPU124821	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	M2	14,440	**1.328,480**	1.328,480
9051	CPU124836	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, SEMI BRILHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	7,940	**2.035,180**	2.035,180
9051	MAT17183	Corante para tinta 4719/ORSE	TB	2,480	**196,000**	196,000
9051	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	18,510	**2.211,000**	2.211,000
9051	CPU125017	RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE FACHADA COM ARGAMASSA ACIII, ESPESSURA ATÉ 3 MM	M2	18,710	**2.198,310**	2.198,310
9051	CPU17184	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM ATÉ 3,0 MM DE ABERTURA, EM FACHADAS E DEMAIS SUPERFÍCIES - ÁREA EXTERNA	M2	3,490	**421,110**	421,110
9051	CPU17187	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM MAIS DE 3,0 MM DE ABERTURA, EM FACHADAS E DEMAIS SUPERFÍCIES - ÁREA EXTERNA	M2	2,430	**194,120**	194,120
9051	CPU124856	PINTURA COM TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM SOBRE SUPERFICIES EM MADEIRA OU METAL. UTILIZADO EM PORTAS, FORROS DE MADEIRA, BEIRAIS DE MADEIRA E PAREDES DE MADEIRA. 2 DEMÃOS	M2	9,830	**405,000**	405,000

Totais dos Valores

Valor O.S. : 123.807,17
Valor executado : 123.807,17

Capa do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0021/2026
Nº O.S. : 0105
Situaçao : O.S. totalizada à medição
Data do pedido : 20/06/2026
Descrição do pedido : revitalização

Tipo do Pedido

Descrição
conservação civil

Situações do Pedido

Data	Descrição	Situaçao	Responsável
23/06/2026	**Pedido totalizado na medição 9.**	**O.S. totalizada à medição**	**Murilo Alves Del Prato**
23/06/2026	Serviços executados.	O.S. concluída	Murilo Alves Del Prato
22/06/2026	APROVADO!	O.S. em execução	Murilo Alves Del Prato
22/06/2026	APROVADO!	O.S. em análise INFRA/ COORD	Murilo Alves Del Prato
22/06/2026	Elaboração da O.S. iniciada	O.S. em elaboração	Murilo Alves Del Prato
20/06/2026	Aprovado!	Pedido aprovado COORD	Murilo Alves Del Prato
20/06/2026	Aprovado!	Pedido em análise COORD	Murilo Alves Del Prato
20/06/2026	Iniciando o pedido	Pedido iniciado	Murilo Alves Del Prato

Fotos do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0021/2026
Nº O.S. : 0105
Situaçao : O.S. totalizada à medição

Fotos


Foto 1 - 20/06/2026


Foto 2 - 20/06/2026


Foto 3 - 20/06/2026


Foto 1 - 23/06/2026


Foto 2 - 23/06/2026


Foto 3 - 23/06/2026

Ordem de Serviço do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0021/2026
Nº O.S. : 0105
Situaçao : O.S. totalizada à medição

Serviços do Pedido

Ata : PR-00218/2026/SED - MANUTENÇÃO PRÉDIOS GRANDE FLORIANÓPOLIS
Lote : 1 - REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA CRE 18 FPOLIS LOTE 03

Grupo	Código	Descrição	Unid.	Vl Unit	Qtde. O.S.	Qtde. Exec.
9051	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	7,220	**2.000,000**	2.000,000
9051	CPU124839	PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM FACHADAS, DUAS DEMÃOS.	M2	7,960	**5.229,010**	5.229,010
9051	CPU125017	RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE FACHADA COM ARGAMASSA ACIII, ESPESSURA ATÉ 3 MM	M2	18,710	**2.000,000**	2.000,000
9051	CPU17184	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM ATÉ 3,0 MM DE ABERTURA, EM FACHADAS E DEMAIS SUPERFÍCIES - ÁREA EXTERNA	M2	3,490	**415,000**	415,000
9051	CPU17187	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM MAIS DE 3,0 MM DE ABERTURA, EM FACHADAS E DEMAIS SUPERFÍCIES - ÁREA EXTERNA	M2	2,430	**329,000**	329,000
9051	CPU125022	ANDAIME CADEIRINHA (MONTAGEM E DESMONTAGEM)	UN	48,220	**2,000**	2,000
9051	CPU124821	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	M2	14,440	**3.530,000**	3.530,000
9051	CPU124836	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, SEMI BRILHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	7,940	**3.400,000**	3.400,000
9051	CPU124856	PINTURA COM TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM SOBRE SUPERFICIES EM MADEIRA OU METAL. UTILIZADO EM PORTAS, FORROS DE MADEIRA, BEIRAIS DE MADEIRA E PAREDES DE MADEIRA. 2 DEMÃOS	M2	9,830	**2.340,000**	2.340,000

Totais dos Valores

Valor O.S. : 196.798,57
Valor executado : 196.798,57

Capa do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0002/2026
Nº O.S. : 0001
Situaçao : O.S. totalizada à medição
Data do pedido : 13/02/2026
Descrição do pedido : Pintura e revitalização da unidade escolar

Tipo do Pedido

Descrição
conservação civil

Situações do Pedido

Data	Descrição	Situaçao	Responsável
25/03/2026	**Pedido totalizado na medição 4.**	**O.S. totalizada à medição**	**Murilo Alves Del Prato**
25/03/2026	Serviços executados	O.S. concluída	Murilo Alves Del Prato
25/03/2026	Aprovado	O.S. em execução	Murilo Alves Del Prato
25/03/2026	Aprovado	O.S. em análise INFRA/ COORD	Murilo Alves Del Prato
25/03/2026	O.S em adequação	O.S em adequação	Murilo Alves Del Prato
13/02/2026	Aprovado!	O.S. em execução	Murilo Alves Del Prato
13/02/2026	Aprovado!	O.S. em análise INFRA/ COORD	Murilo Alves Del Prato
13/02/2026	O.S. em elaboração	O.S. em elaboração	Murilo Alves Del Prato
13/02/2026	Para levantamentos	Pedido aprovado COORD	Murilo Alves Del Prato
13/02/2026	Para levantamentos	Pedido em análise COORD	Murilo Alves Del Prato
13/02/2026	Iniciando o pedido	Pedido iniciado	Murilo Alves Del Prato

Fotos do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0002/2026
Nº O.S. : 0001
Situaçao : O.S. totalizada à medição

Fotos


Fachada - 13/02/2026

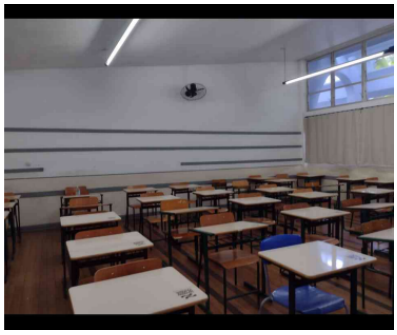
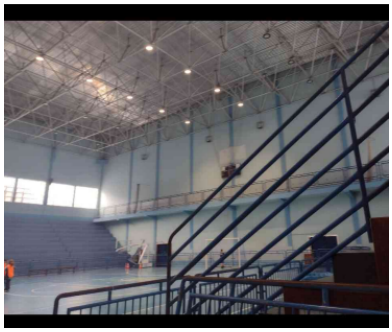
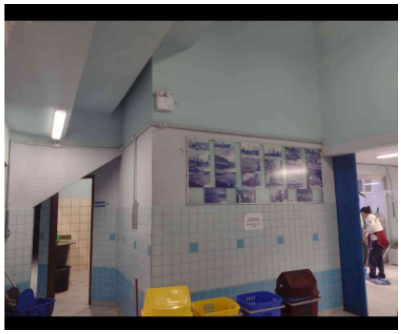

foto 1 - 25/03/2026


foto 2 - 25/03/2026


foto 3 - 25/03/2026


foto 4 - 25/03/2026


foto 5 - 25/03/2026

Ordem de Serviço do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0002/2026
Nº O.S. : 0001
Situaçao : O.S. totalizada à medição

Serviços do Pedido

Ata : PR-00218/2026/SED - MANUTENÇÃO PRÉDIOS GRANDE FLORIANÓPOLIS
Lote : 1 - REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA CRE 18 FPOLIS LOTE 03

Grupo	Código	Descrição	Unid.	Vl Unit	Qtde. O.S.	Qtde. Exec.
9051	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,190	**8.683,000**	8.683,000
9051	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	1,290	**49,140**	49,140
9051	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	6,190	**683,000**	683,000
9051	CPU124821	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	M2	14,440	**1.123,000**	1.123,000
9051	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2,210	**8.844,700**	8.844,700
9051	CPU124836	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, SEMI BRILHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	7,940	**8.844,700**	8.844,700
9051	CPU124856	PINTURA COM TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM SOBRE SUPERFICIES EM MADEIRA OU METAL. UTILIZADO EM PORTAS, FORROS DE MADEIRA, BEIRAIS DE MADEIRA E PAREDES DE MADEIRA. 2 DEMÃOS	M2	9,830	**49,140**	49,140
9051	CPU124851	PINTURA COM TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM SOBRE SUPERFICIES EM MADEIRA OU METAL UTILIZANDO ROLO OU PINCEL EM PEQUENAS SUPERFICIES COMO JANELAS, ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA E GRADES METÁLICAS, CORRIMÕES E GUARDA CORPOS. EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M2	30,810	**460,000**	460,000
9051	CPU124839	PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM FACHADAS, DUAS DEMÃOS.	M2	7,960	**542,920**	542,920
9051	MAT17183	Corante para tinta 4719/ORSE	TB	2,480	**613,000**	613,000
9051	CPU125017	RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE FACHADA COM ARGAMASSA ACIII, ESPESSURA ATÉ 3 MM	M2	18,710	**8.345,000**	8.345,000
9051	CPU17184	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM ATÉ 3,0 MM DE ABERTURA, EM FACHADAS E DEMAIS SUPERFÍCIES - ÁREA EXTERNA	M2	3,490	**2.000,000**	2.000,000
9051	CPU17187	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM MAIS DE 3,0 MM DE ABERTURA, EM FACHADAS E DEMAIS SUPERFÍCIES - ÁREA EXTERNA	M2	2,430	**350,000**	350,000
9051	CPU17203	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,0 ATÉ 1,5 M, ALTURA 3,0 M, CONFORME NR 18 E 35 - INCLUSO SAPATAS OU RODÍZIOS. EXCLUSIVE PLATAFORMA DE TRABALHO E MONTAGEM/DESMONTAGEM.	MES	69,560	**1,000**	1,000
9051	CPU17209	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, ALTURA 3,0 M, CONFORME NR 18 E NR 35, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA DE TRABALHO COM GUARDA-CORPO. EXCLUSIVE LOCAÇÃO DE ANDAIME.	UNID	393,120	**1,000**	1,000
9051	CPU125022	ANDAIME CADEIRINHA (MONTAGEM E DESMONTAGEM)	UN	48,220	**1,000**	1,000
9051	CPU125021	Aluguel de cadeirinha p/ fachada.	MES	155,870	**1,000**	1,000

Totais dos Valores

Valor O.S. : 305.743,48
Valor executado : 305.743,48

Capa do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0011/2026
Nº O.S. : 0012
Situaçao : O.S. totalizada à medição
Data do pedido : 28/04/2026
Descrição do pedido : Pintura externa do Instituto.

Tipo do Pedido

Descrição
conservação civil

Situações do Pedido

Data	Descrição	Situaçao	Responsável
29/04/2026	**Pedido totalizado na medição 6.**	**O.S. totalizada à medição**	**Murilo Alves Del Prato**
29/04/2026	Aprovado!	O.S. concluída	Murilo Alves Del Prato
28/04/2026	APROVADO!	O.S. em execução	Murilo Alves Del Prato
28/04/2026	APROVADO!	O.S. em análise INFRA/ COORD	Murilo Alves Del Prato
28/04/2026	Elaboração da O.S. iniciada	O.S. em elaboração	Murilo Alves Del Prato
28/04/2026	APROVADO!	Pedido aprovado COORD	Murilo Alves Del Prato
28/04/2026	APROVADO!	Pedido em análise COORD	Murilo Alves Del Prato
28/04/2026	Iniciando o pedido	Pedido iniciado	Murilo Alves Del Prato

Fotos do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0011/2026
Nº O.S. : 0012
Situaçao : O.S. totalizada à medição

Fotos


FOTO 1 - 28/04/2026


FOTO 2 - 28/04/2026


FOTO 3 - 28/04/2026


FOTO 4 - 29/04/2026

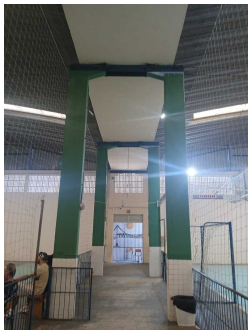

FOTO 5 - 29/04/2026


FOTO 6 - 29/04/2026

Ordem de Serviço do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Florianópolis
Bem público : INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Em processo de Tombamento)
Nº pedido : 0011/2026
Nº O.S. : 0012
Situaçao : O.S. totalizada à medição

Serviços do Pedido

Ata : PR-00218/2026/SED - MANUTENÇÃO PRÉDIOS GRANDE FLORIANÓPOLIS
Lote : 1 - REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA CRE 18 FPOLIS LOTE 03

Grupo	Código	Descrição	Unid.	Vl Unit	Qtde. O.S.	Qtde. Exec.
9051	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,190	**7.200,000**	7.200,000
9051	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	1,290	**95,000**	95,000
9051	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	6,190	**453,000**	453,000
9051	CPU124821	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	M2	14,440	**193,000**	193,000
9051	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	13,170	**826,000**	826,000
9051	CPU124836	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, SEMI BRILHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	7,940	**5.320,000**	5.320,000
9051	CPU124856	PINTURA COM TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM SOBRE SUPERFICIES EM MADEIRA OU METAL. UTILIZADO EM PORTAS, FORROS DE MADEIRA, BEIRAIS DE MADEIRA E PAREDES DE MADEIRA. 2 DEMÃOS	M2	9,830	**723,000**	723,000
9051	CPU124851	PINTURA COM TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM SOBRE SUPERFICIES EM MADEIRA OU METAL UTILIZANDO ROLO OU PINCEL EM PEQUENAS SUPERFICIES COMO JANELAS, ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA E GRADES METÁLICAS, CORRIMÕES E GUARDA CORPOS. EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M2	30,810	**723,000**	723,000
9051	CPU124839	PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM FACHADAS, DUAS DEMÃOS.	M2	7,960	**1.345,000**	1.345,000
9051	CPU125017	RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE FACHADA COM ARGAMASSA ACIII, ESPESSURA ATÉ 3 MM	M2	18,710	**1.865,000**	1.865,000
9051	CPU17184	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM ATÉ 3,0 MM DE ABERTURA, EM FACHADAS E DEMAIS SUPERFÍCIES - ÁREA EXTERNA	M2	3,490	**400,000**	400,000
9051	CPU17187	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, COM MAIS DE 3,0 MM DE ABERTURA, EM FACHADAS E DEMAIS SUPERFÍCIES - ÁREA EXTERNA	M2	2,430	**180,000**	180,000
9051	CPU17203	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,0 ATÉ 1,5 M, ALTURA 3,0 M, CONFORME NR 18 E 35 - INCLUSO SAPATAS OU RODÍZIOS. EXCLUSIVE PLATAFORMA DE TRABALHO E MONTAGEM/DESMONTAGEM.	MES	69,560	**3,000**	3,000
9051	CPU17209	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, ALTURA 3,0 M, CONFORME NR 18 E NR 35, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA DE TRABALHO COM GUARDA-CORPO. EXCLUSIVE LOCAÇÃO DE ANDAIME.	UNID	393,120	**3,000**	3,000
9051	CPU125022	ANDAIME CADEIRINHA (MONTAGEM E DESMONTAGEM)	UN	48,220	**1,000**	1,000
9051	CPU125021	Aluguel de cadeirinha p/ fachada.	MES	155,870	**1,000**	1,000
9051	CPU124846	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REFERENTE AO SERVIÇO SINAPI 88489	M2	7,050	**4.230,000**	4.230,000

Totais dos Valores

Valor O.S. : 175.630,86
Valor executado : 175.630,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

INFORMAÇÃO Nº 481/2026 SED/DINE Florianópolis, 23 de outubro 2026.

REFERÊNCIA: Processo SCC 15393/2026, o qual encaminha PIC 0217/2026, do Deputado Padre Pedro Baldissera, que solicita informações referentes à pintura do IEE, localizadas no município de Florianópolis.

Senhora Secretária,

Em resposta à PIC nº 0217/2026, de autoria do Deputado Padre Pedro Baldissera, que solicita informações referentes à pintura do Instituto Estadual de Educação (IEE), localizado no município de Florianópolis, informamos o que segue**:**

1. Qual é o número do processo administrativo relativo à obra de revitalização do Instituto Estadual de Educação?

Resposta: O processo administrativo correspondente é o SEA nº 23384/2025.

2. Qual é o número do contrato, a data de sua assinatura, a identificação da empresa contratada, seu CNPJ e o valor total contratado?

Resposta: A contratação está vinculada ao Contrato nº PR-00218/2026/SED, decorrente da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 610/2025, tendo como empresa contratada Hrodebert, inscrita no CNPJ nº 04.242.408/0001-20.

O contrato foi assinado pela Secretária de Estado da Educação e pela empresa em 19 de janeiro de 2026.

Os valores das Ordens de Serviço (OS) referentes às intervenções no Instituto Estadual de Educação são os seguintes: OS R$ 305.743,48; OS R$ 175.630,85; OS R$ 196.798,57; OS R$ 123.807,17; OS R$ 504.400,78; OS R$ 532.815,83.

3. O valor anunciado de aproximadamente R$ 5.000.000,00 corresponde ao valor inicial do contrato, ao valor da ordem de serviço ou ao montante global previsto para a intervenção? Informar a composição detalhada desse valor.

Pág. 01 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00015393/2026 e o código 8865ZQIG.

Resposta: O valor da Ata de Registro de Preços é destinado ao atendimento das demandas das unidades escolares contempladas no respectivo lote, não sendo exclusivo do Instituto Estadual de Educação. Os recursos são utilizados conforme as necessidades identificadas, mediante a formalização de contratos e posterior lançamento de Ordem de Serviço com valores parciais vinculados à referida ata.

Foram formalizados os seguintes contratos:

- **Primeiro contrato:** R$ 4.000.000,00, assinado pela empresa em 3 de fevereiro de 2026 e pela Secretária de Estado da Educação em 4 de fevereiro de 2026;
- **Segundo contrato:** R$ 1.500.000,00, assinado pela empresa em 20 de maio de 2026 e pela Secretária de Estado da Educação em 25 de maio de 2026;
- **Terceiro contrato:** R$ 3.000.000,00, assinado pela empresa em 26 de agosto de 2026 e pela Secretária de Estado da Educação em 27 de agosto de 2026.

Os contratos mencionados abrangem intervenções em diversas unidades escolares, conforme a demanda e Ordem de Serviços gerados, incluindo:

- EEB Padre Anchieta;
- EEB Ildefonso Linhares;
- EEB Leonor de Barros;
- EEB Intendente José Fernandes;
- EEB Rosa Torres de Miranda;
- EEB do Muquém;
- EEB Simão José Hess;
- EEB Hilda Teodoro Vieira;
- EEM Jacó Anderle;
- EEB Jurema Cavalazzi;
- Instituto Estadual de Educação;
- EEM Vereador Oscar Manoel – Escola Jovem.

Dessa forma, os valores globais dos contratos vinculados à Ata de Registro de Preços não correspondem exclusivamente aos serviços executados no Instituto Estadual de Educação, cuja execução é discriminada nas respectivas Ordens de Serviço.

4. Qual foi a modalidade de licitação utilizada ou, em caso de contratação direta, qual foi o fundamento legal que a justificou?

Pág. 02 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00015393/2026 e o código 8865ZQIG.

Resposta: A contratação decorre de Ata de Registro de Preços, oriunda de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, conforme o processo SEA nº 23384/2025.

5. Houve aditivos contratuais de prazo ou de valor? Em caso positivo, informar os respectivos valores, as justificativas, as datas e os objetos de cada aditivo.

Resposta: A Ata de Registro de Preços possui aditivo de valor formalizado no processo SED nº 144351/2026, no qual constam as justificativas, os valores, os prazos e as demais informações pertinentes.

6. Qual é a fonte dos recursos utilizados na obra, incluindo a classificação orçamentária, o programa e a ação orçamentária correspondentes?

Resposta: Os recursos utilizados estão vinculados às seguintes classificações orçamentárias: **Fontes de recursos:** 1500100000 e 2500100000; **Classificação orçamentária:** 339039; **Ação orçamentária:** 12482.

7 a 11. Quais critérios técnicos, arquitetônicos e estéticos fundamentaram a escolha das cores? Existem estudos sobre a pintura original do Instituto Estadual de Educação, pareceres técnicos e documentos que justifiquem a definição das cores, dos materiais e dos acabamentos adotados na revitalização?

Resposta: A documentação pertinente aos itens 7 a 11 encontra-se no processo SED nº 199522/2025, referente à consulta sobre a viabilidade de alteração das cores da fachada do Instituto Estadual de Educação para branco, verde e vermelho.

O processo contempla os estudos realizados e inclui o Parecer Técnico nº 6950346 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-SC), bem como o parecer referente à solicitação de viabilidade.

A adoção das cores está relacionada ao Decreto Estadual nº 1.016, de 11 de junho de 2025. Os documentos e as manifestações técnicas constantes no referido processo subsidiam os esclarecimentos relativos aos critérios adotados para a intervenção.

12. Quais documentos integram o processo de contratação da obra, incluindo edital ou justificativa da contratação direta, pareceres, contrato administrativo, aditivos, estudos técnicos, termo de referência e projetos básico e executivo?

Pág. 03 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00015393/2026 e o código 8865ZQIG.

Resposta: O edital, o termo de homologação, o termo de referência e os contratos formalizados encontram-se no processo licitatório SEA nº 23384/2025.

13. Quais documentos registram o planejamento e a execução da obra, incluindo planilha orçamentária detalhada, cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs), relatórios de fiscalização, medições e registros fotográficos?

Resposta: Os registros das medições realizadas pelo fiscal da obra estão vinculados às respectivas Ordens de Serviço, disponíveis no Sistema SICOP, no âmbito do Contrato nº PR-00218/2026/SED.

Até o momento, foram registradas seis Ordens de Serviço com medições, identificadas pelos números 1, 12, 126, 107, 106 e 105, cujos documentos encontram-se em anexo.

14. Quais documentos comprovam a execução financeira e o recebimento da obra, incluindo notas fiscais, ordens de pagamento, notificações, relatórios de não conformidade e termos de recebimento provisório ou definitivo?

Resposta: Considerando que a obra de pintura se encontra em execução, os referidos documentos ainda não estão disponíveis.

Em face do exposto, solicitamos a Secretária de Estado da Educação que encaminhe o Ofício a Senhora Michelline Moes Moreira, Gerente de Acompanhamento de Pedidos de Informação, manifestando o parecer da Diretoria de Infraestrutura Escolar.

À sua consideração,

(*assinado digitalmente*)
Christian Fernandes
Diretor de Infraestrutura
DINE

(*assinado digitalmente*)
Suzana M. P. da Silva
Assessoria
DINE

Pág. 04 de 04 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00015393/2026 e o código 8865ZQIG.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **8865ZQIG**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SUZANA MAGALI PEREIRA DA SILVA (CPF: 000.XXX.859-XX) em 29/10/2026 às 17:16:21
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:10:24 e válido até 13/07/2118 - 15:10:24.
(Assinatura do sistema)

CHRISTIAN FERNANDES (CPF: 016.XXX.059-XX) em 04/11/2026 às 18:20:49
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2019 - 17:32:04 e válido até 15/03/2119 - 17:32:04.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE1MzkzXzE1Mzk4XzIwMjZfODg2NVpRSUc= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SCC 00015393/2026** e o código **8865ZQIG** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício/Gabs nº 2125/2026 Florianópolis, 04 de novembro de 2026.

Referência: Processo SCC 15393/2026

Senhora Gerente,

Em resposta ao Ofício nº 1649/SCC-DIAL-GEAPI, que solicita a manifestação desta Secretaria de Estado da Educação (SED) acerca do Pedido de Informação 0217/2026, subscrito pelo Deputado Padre Pedro Baldissera, por meio da qual solicita informações sobre a obra de revitalização do Instituto Estadual de Educação (IEE), encaminhamos a INFORMAÇÃO Nº 481/2026 SED/DINE, da Diretoria de Infraestrutura Escolar, contendo o parecer da área técnica.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Luciane Bisognin Ceretta
Secretária de Estado da Educação

À Senhora
MICHELLINE MOES MOREIRA
Gerente de Acompanhamento de Pedidos de Informações
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis – SC

JZB/Redação/GABS

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00015393/2026 e o código K213TJ8Q.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **K213TJ8Q**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCIANE BISOGNIN CERETTA (CPF: 490.XXX.110-XX) em 05/11/2026 às 12:14:53
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/08/2022 - 17:13:56 e válido até 04/08/2122 - 17:13:56.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE1MzkzXzE1Mzk4XzIwMjZfSzIxM1RKOFE= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SCC 00015393/2026** e o código **K213TJ8Q** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Ofício nº 1704/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 5 de novembro de 2026.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação nº 0217/2026, de autoria do Deputado Padre Pedro Baldissera, encaminho Ofício nº 2125/2026, da Secretaria de Estado da Educação, que remete documentos contendo informações acerca da obra de revitalização do Instituto Estadual de Educação.

Respeitosamente,

Henrique de Freitas Junqueira
Secretário de Estado da Casa Civil, designado*

Excelentíssimo Senhor Deputado
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

*Ato nº 413/2026 – DOE 22707

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00015393/2026 e o código R063OSH8.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **R063OSH8**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE DE FREITAS JUNQUEIRA (CPF: 002.XXX.090-XX) em 05/11/2026 às 16:35:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/08/2025 - 15:12:04 e válido até 14/08/2125 - 15:12:04.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE1MzkzXzE1Mzk4XzIwMjZfUjA2M09TSDg= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SCC 00015393/2026** e o código **R063OSH8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
