

INFORMAÇÃO Nº 14/2023/SIE/CRNOR

Itaiópolis, 08 de maio de 2023

Em atenção ao Processo SCC-00005821/2021 Vol.: 1, onde solicita-se manifestação acerca da execução dos serviços junto a Rodovia: SC-114, trecho: Entroncamento BR-116 – Itaiópolis, objeto do Contrato: CT.062/2021, a cargo da empresa Construtora Fortunato Ltda, informa-se o que segue:

ATRASO DO CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA:

A)- Atualmente os serviços referente a pavimentação asfáltica do citado trecho, encontram-se com o Cronograma Físico – Financeiro em atraso, devido a fatores que expomos a seguir;

A1)- Primeiramente devemos observar a falta de informações precisas no que se refere ao Relatório de Projeto da obra, este foi executado em Abril/2014, denominado de Relatório da Avaliação do Pavimento, - Intervenções, e a obra iniciou em Junho/2021, havendo a necessidade de ser revisto tal projeto, em virtude do pavimento já apresentar maiores deficiências do que as previstas em projeto;

A2)- Como observado em processos anteriores, há uma morosidade na entrega do agregado mineral por parte da empresa mineradora, Pedreira Britapar Ltda, localizada no município de Papanduva/SC, assim como para execução da capa asfáltica (Asfalto Borracha Tipo AB-8 – Ecoflex B) onde o Pó de Pedra, na proporção de 56,0% da mistura asfáltica é proveniente da Mineradora LZK, município de Santa Cecília/SC, com uma distância de transporte para a usina de asfalto, na ordem de 97,00 km aproximadamente;

A3)- Informa-se também como motivo de atraso substancial da obra, as condições climáticas nos meses de outubro a dezembro 2022 e janeiro e fevereiro 2023, onde as precipitações pluviométricas foram acima do normal, ocasionando inúmeras paralisações dos serviços tanto de terraplenagem como de pavimentação;

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

B)- No que se refere a qualidade dos serviços, em determinados locais verificou-se a necessidade de execução de remendos profundos, assim como drenos transversais para atendimento ao suporte do atual tráfego oriundo de empresas madeireiras da região;

B1)- A empresa construtora está ciente de tais fatos, e vem medindo esforços para atendimento a qualidade e segurança do usuário da rodovia; realizando ensaios mensalmente através da Viga Benkelmann, no intuito de observar as deformações admissíveis do pavimento;

B2) – Como exemplo podemos citar o segmento entre os km 10+800 ao km 10+980, onde a capa asfáltica (e= 0,04 m - primeira camada), apresentou inúmeras imperfeições, até mesmo a ruptura do pavimento, no entanto, em tal segmento vinha sendo despejado águas servidas (esgoto) de casas adjacentes a pista de rolamento, saturando por completo o subleito e conseqüentemente vindo a deteriorar o pavimento em locais pontuais;

Como solução, houve contato com a Prefeitura Municipal de Itaiópolis, onde foi exposto o fato, e esta prontamente executou em parceria com a empresa construtora uma canalização longitudinal, diâmetro 0,40 m, sob o acostamento da rodovia, no intuito de condução adequada de tal esgoto. No entanto, é de conhecimento que o pavimento (sub-base, base de brita graduada e capa asfáltica) necessita de remoção parcial para sua perfeita aceitação por parte da SIE/Fiscalização;

IMAGENS:

C1) – Anexo, Ordem de Serviço Nº 011/2023 datada de 10/março/2023 expedida pela fiscalização, alertando para equacionamento de tais imperfeições.

Anexo, algumas imagens do trecho onde foi observado tais imperfeições/fadiga do pavimento, que serão sim equacionadas o mais breve possível pela construtora, a qual tem responsabilidade pela qualidade da obra num todo.

Respeitosamente,

Rodney Heyse

Engº Fisca – Contrato CT.062/2021

SIE/CRNOR



Assinaturas do documento



Código para verificação: **SOL0Y877**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **RODNEY HEYSE** (CPF: 162.XXX.579-XX) em 08/05/2023 às 16:43:16
Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/11/2019 - 16:18:04 e válido até 27/11/2119 - 16:18:04.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA1ODIxXzU4MjVfMjAyM19TT0wwWTg3Nw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00005821/2023** e o código **SOL0Y877** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2023

Pela presente fica a empresa Construtora Fortunato Ltda, CNPJ/MF 82.607.623/0001-91, detentora do Contrato: CT.062/2021, a executar reparos no pavimento da Rodovia: SC-114, trecho: Entroncamento BR-116 – Itaiópolis, entre o km +5+120 ao km 3+123, lado direito, onde a capa asfáltica apresenta rupturas significativas;

Assim como, entre o Km 10+790 ao km 10+990, lados E/D, devido a fadiga precoce da 1ª camada de CAUQ, proveniente da ação de águas de esgoto, oriundas de residências adjacentes a rodovia, com isso saturando o sub-leito.

Itaiópolis, 10 de março de 2023


Engº Rodney Heise

Fiscal Contrato: CT. 062/2021


RECEBI EM 13/03/2023

NOME:


Construtora Fortunato Ltda.

FUNÇÃO:


Thales Kurten

Engenheiro Civil

CREA 250369221-4

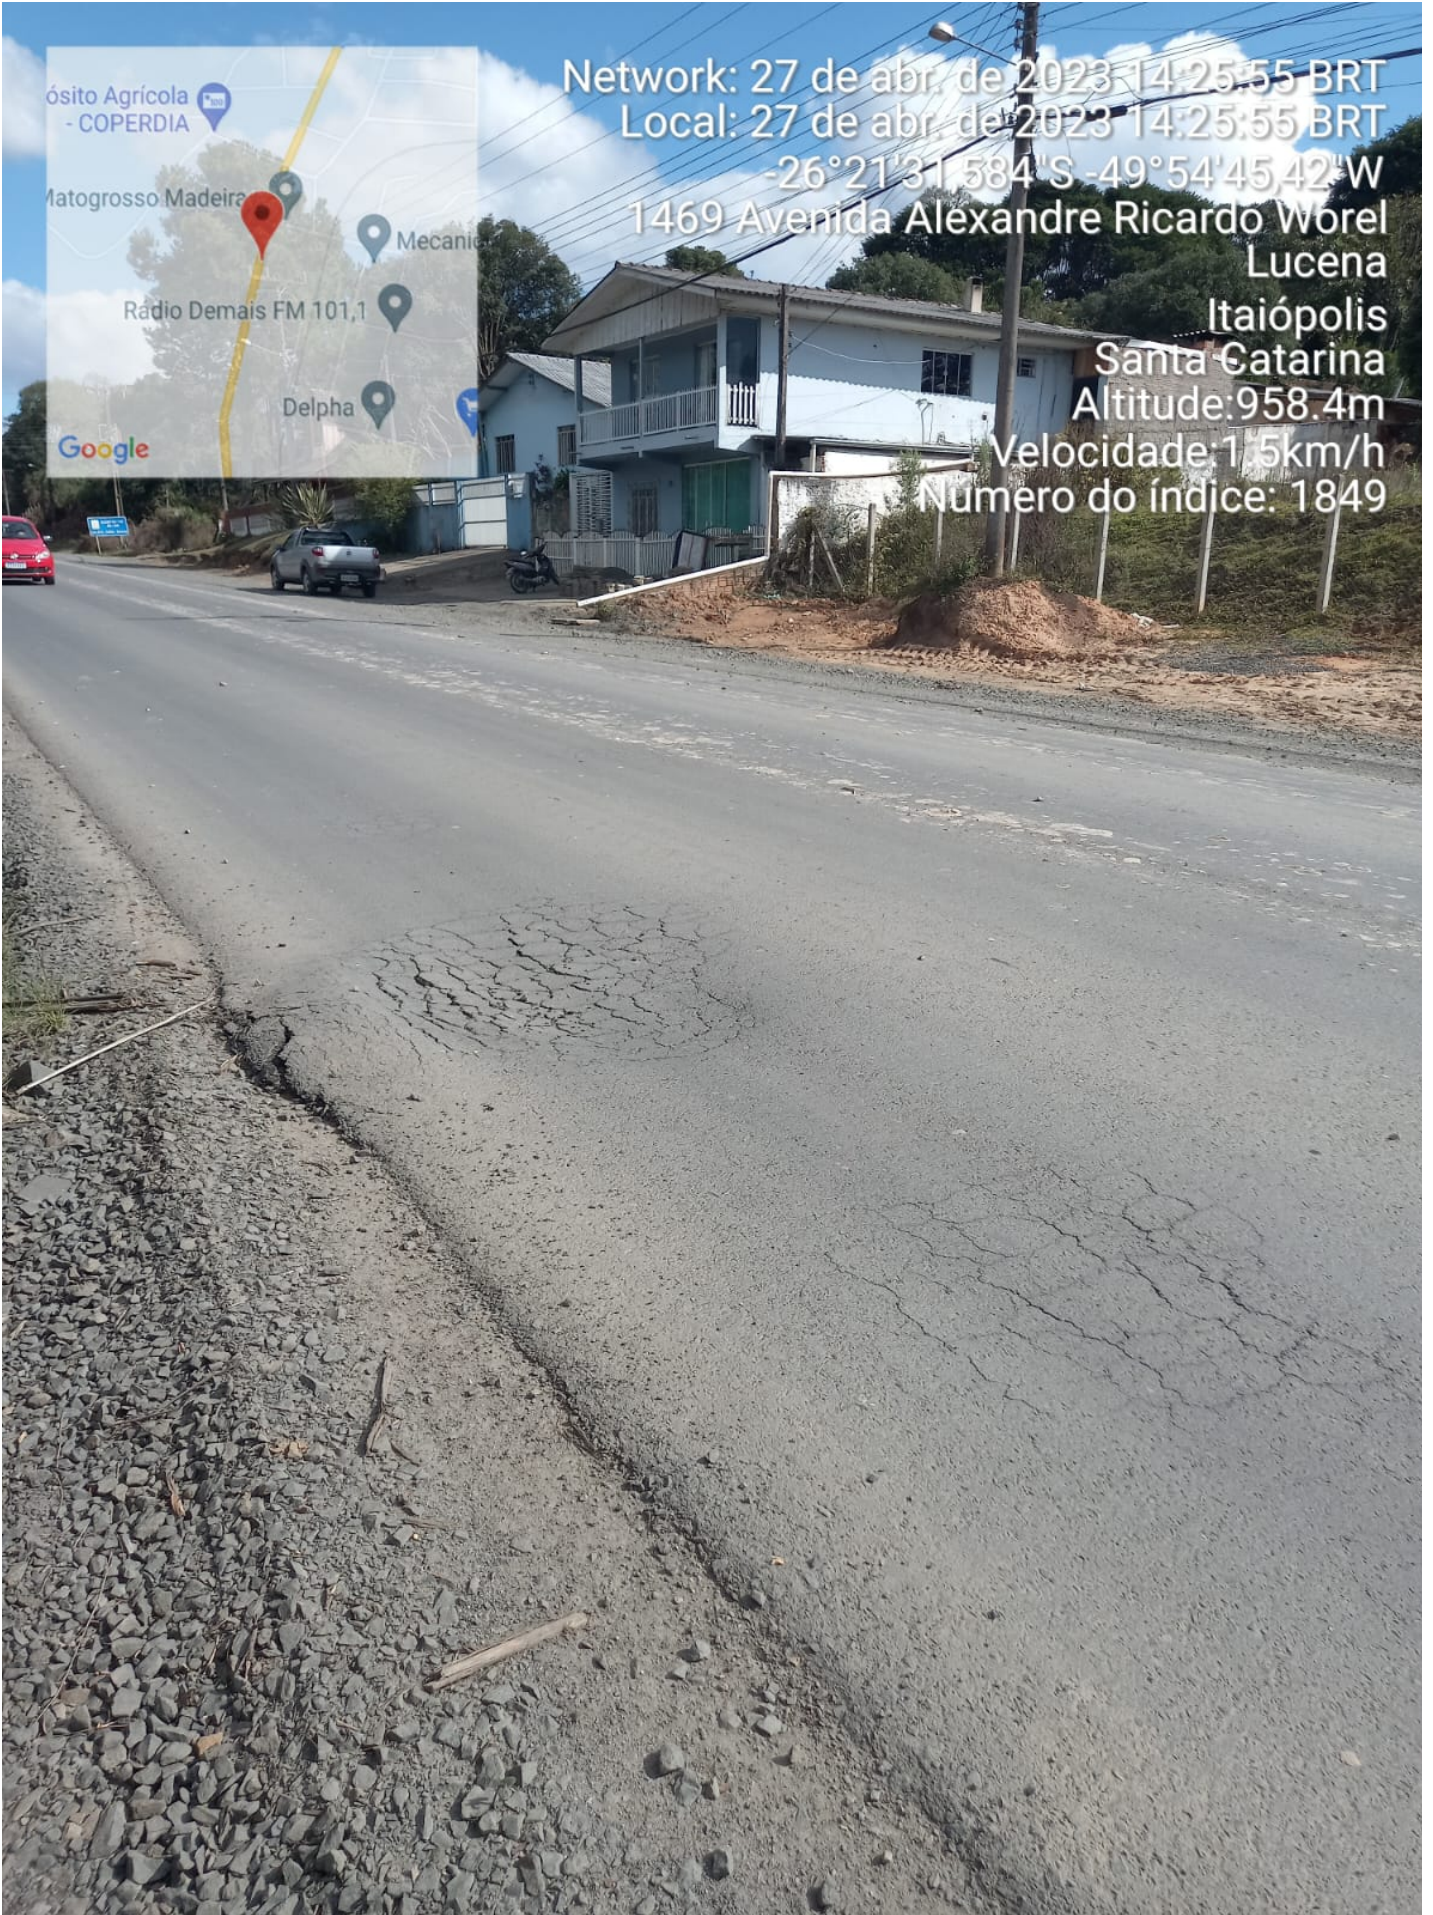



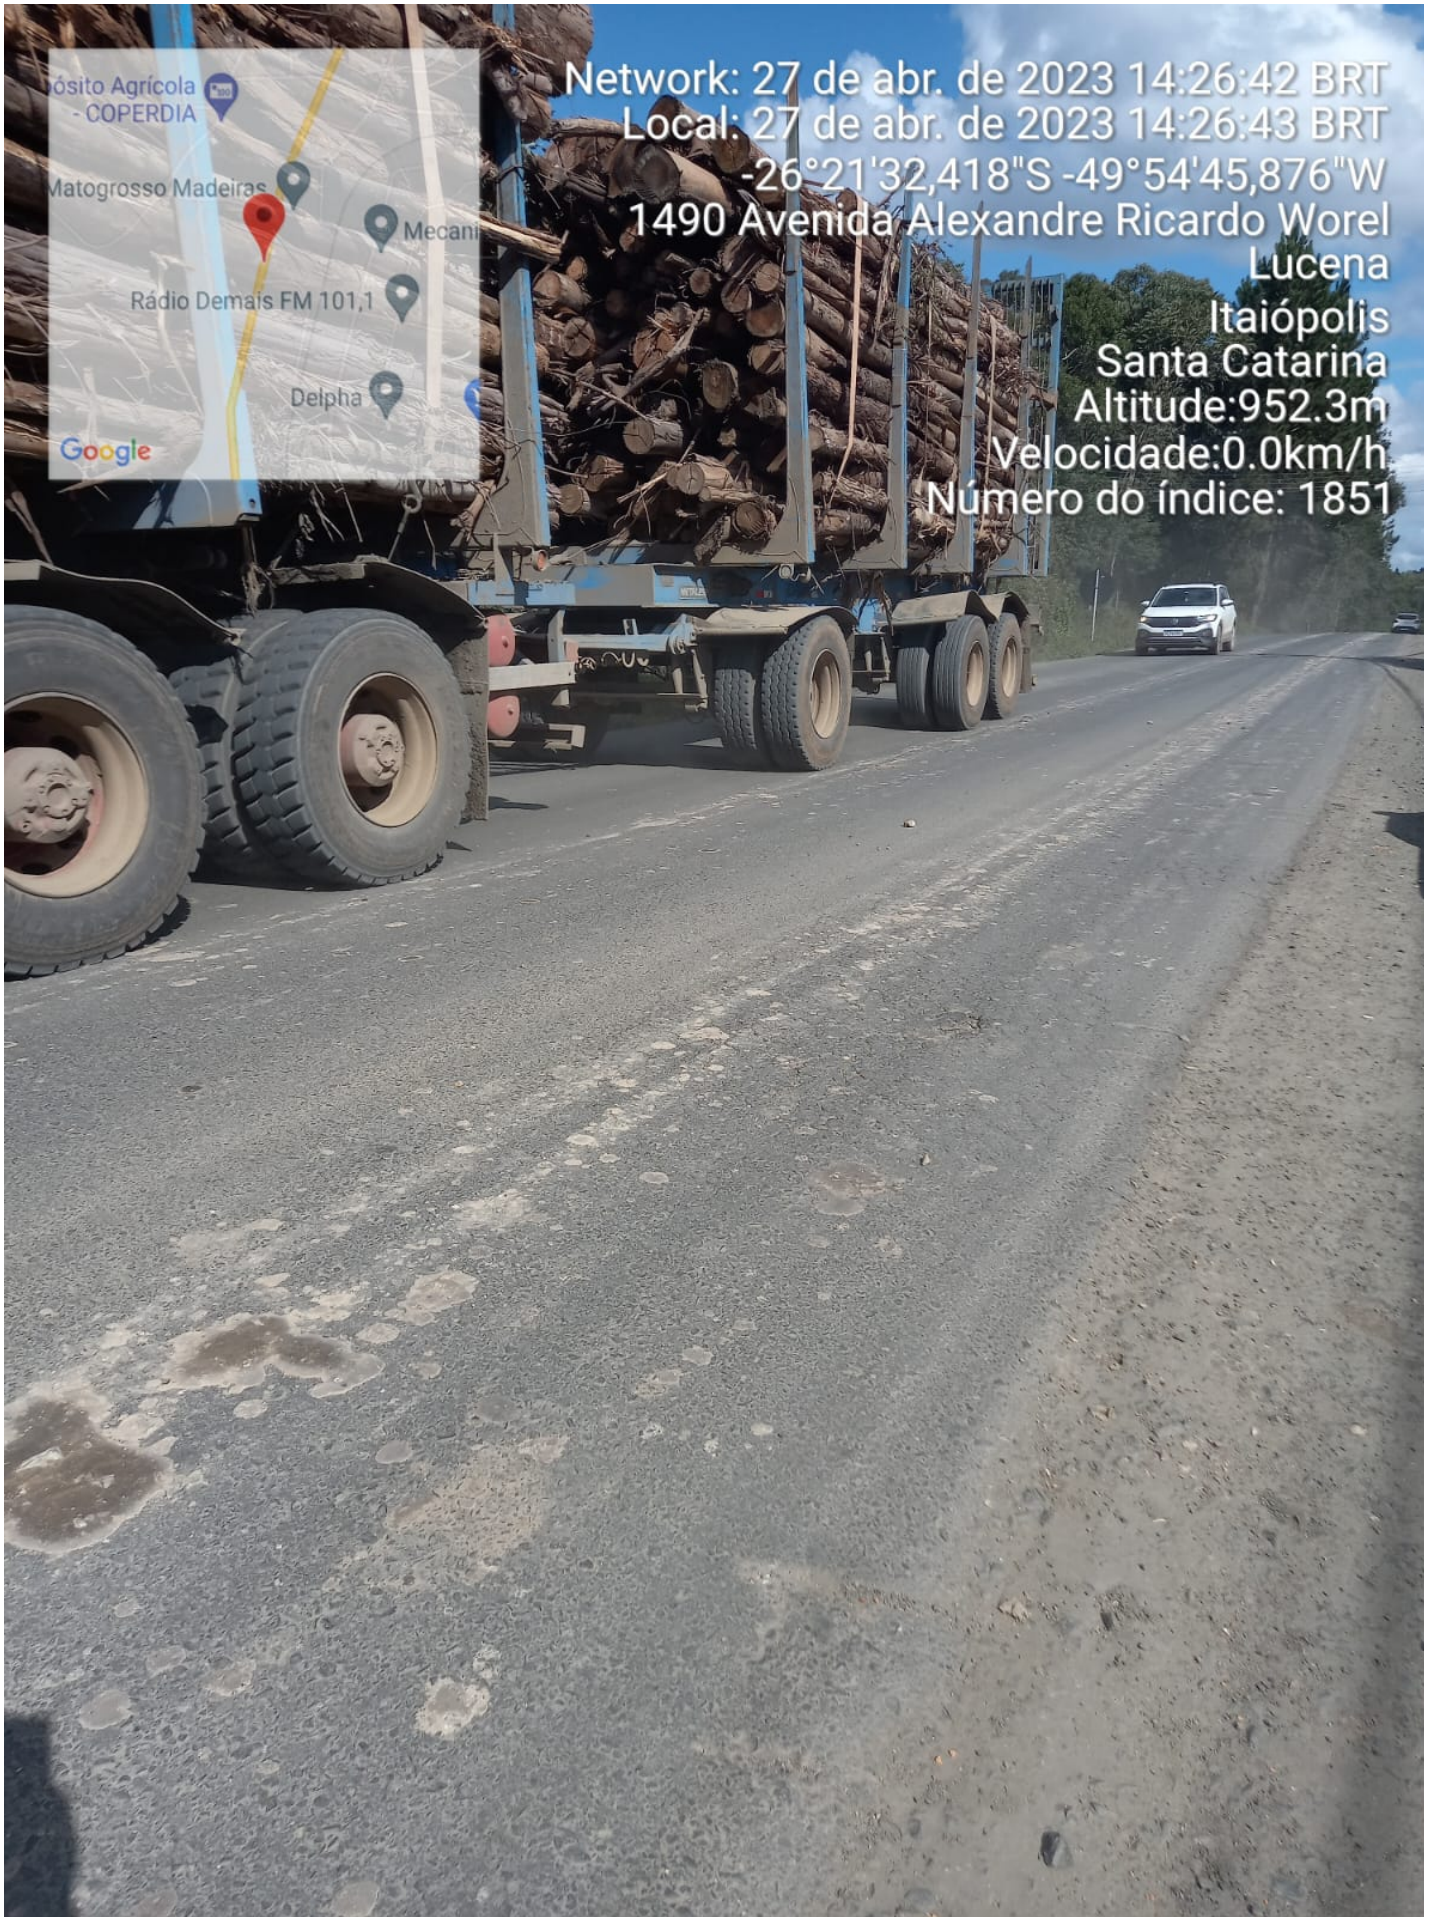



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 0540/2023

Processo SCC 5821/2023

Florianópolis, 09 de maio de 2023.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 0871/SCC-DIAL-GEAPI, nos autos do Processo Digital SCC 5821/2023, contendo cópia da Indicação nº 0359/2023, a qual sugere revitalização da Rodovia Estadual SC-114, Município de Itaiópolis, em conformidade com o Ofício nº GP/DL/0588/2023, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos manifestação da Coordenadoria Regional de Infraestrutura Norte (págs. 10 e 11), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER

Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor

MARCELO MENDES

Diretor de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis – SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **V09K83MB**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 09/05/2023 às 13:13:20

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA1ODIxXzU4MjVfMjAyM19WMDILODNNQg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00005821/2023** e o código **V09K83MB** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 1241/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 9 de maio de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta à Indicação nº 0359/2023, de autoria do Deputado Sargento Lima, encaminho o Ofício nº 0540/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete a Informação nº 14/2023/SIE/CRNOR, da Coordenadoria Regional Norte, contendo informações a respeito da revitalização da Rodovia SC-114, Município de Itaiópolis.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **O8485PLF**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 09/05/2023 às 17:11:42

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA1ODIxXzU4MjVfMjAyM19PODQ4NVBMRg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00005821/2023** e o código **O8485PLF** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
